

Fernando de la Mora, 6 Agosto de 2025.-

Señora:

**Sra. Dalila Noemí Zarza Paredes - Coordinadora General**

**Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP).**

Asunción, Paraguay

**Ref:** CONTRATO N° 08/2024 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" – LOTE N° 2 – ID N° 444.094 -- PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL ALCANCE AMPLIADO. –

**Asunto:** Entrega de nota de solicitud de prórroga

Según el ID 444094

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, que según clausula en la cual le hacemos entrega de las siguientes documentaciones:

- Nota de solicitud de prórroga por lluvia
- Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC) del mes
- Registro fotográfico de lluvias en obra

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

  
 Wilson Leguizamón  
 Socio Gerente  
 MW INGENIERIA S.A.

  
 Marco Leguizamón  
 Socio Gerente  
 MW INGENIERIA S.A.

<b>U.E.P.P. MEC</b>			
Exp. N°: <b>6156</b>			
Recibido por: <b>Jose L</b>			
DIA	MES	AÑO	HORA
<b>06</b>	<b>08</b>	<b>2025</b>	<b>14:07</b>

**COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
 UEPP - MEC**

FECHA: \_\_\_\_\_

DERIVADO A:

SUP. Y CERTIF.

ADMINISTRACIÓN

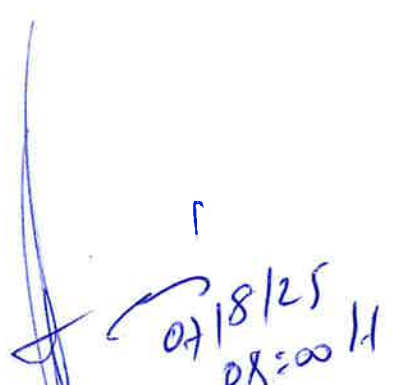
MONITOREO

PROMIE

PROY. Y DISEÑOS

TAPE

OBSERVACIONES:

  
 07/08/25  
 08:00 H

Asunción, 6 de Agosto de 2025

Señor:

ARQ. FRANCISCO SCHROEDER  
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP – MEC

Presente

**REFERENCIA:** LPN N° 02/2024 “Construcción, de espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual ID N° 444.094

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. respetuosamente, con objeto de presentar el cálculo de afectación por día de lluvia, copia de **Registro de Precipitaciones** diarias emitido por la DINAC del mes de Junio año 2025, correspondiente al Lote N°2.

**Lote2 - Departamentos de CORDILLERA - CAAZAPA.**

Se presentan las planillas de precipitaciones pluviales de la DINAC del mes de Julio de 2025, fotos de días de lluvia en la zona de obra, libro de obra con los días de lluvia del mes de Julio del 2025.

Por lo expuesto solicitamos la prórroga correspondiente al contra de referencia según planilla siguiente:

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA				
LOTE	DEPARTAMENTOS	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIAS	CANTIDAD DE DIAS POR INCIDENCIAS	CANTIDAD TOTAL
LOTE N°2	CORDILLERA	7	4	11
LOTE N°2	CAAZAPA	5	4	9

CORRIMIENTO DE PLAZO COORDILLERA		
Lote de obra adjudicada	Empresa Adjudicada	Orden de Servicio N° 2
lote N°2 CORDILLERA	MW Ingeniería S.A.	03/04/2025 120 DIAS
Corrimiento de plazo de ejecución de la obra		12/09/2025

  
Wilson Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

  
Marco Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

  
Arq. Tamia Obelar Nuñez  
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

CORRIMIENTO DE PLAZO CAAZAPÁ		
Lote de obra adjudicada	Empresa Adjudicada	Orden de Servicio N° 2
lote N°2 CAAZAPÁ	MW Ingeniería S.A.	03/04/2024 120 DIAS
Corrimiento de plazo de ejecución de la obra		08/09/2025

Solicitamos 11 días de prórroga del mes de Julio del 2025 para las instituciones educativas del departamento de Cordillera y 9 días de prórroga del mes de Julio del 2025 para las instituciones educativas del departamento de Caazapá.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Marco Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.




Wilson Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

Representante Legal



Arq. Tania Obelar Nuñez  
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

**CALCULO DE PRORROGA DE REGISTRISTRO DE PRESIPITACIONES DEL MES DE JULIO**

DIA	LLUVIAS EN LIBRO	REGISTRO DINAC CORDILLERA	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA	REGISTRO DINAC CAAZAPA	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA	SOLICITADO
<b>CUADRO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR PRORROGA POR LLUVIA</b>						
DIA DE LLUVIA APARTIR DE 0,1mm			1 dia			
consecuencias						
< 8mm			sin		consecuencia	
< 9mm a 30mm			1 dia			
< 31mm a 50mm			2 dias			
< 51mm en adelante			3 dias			
<b>LIBRO DE OBRA Y PLANILLA DINAC</b>						
1	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
2	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
3	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
4	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
5	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
6	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
7	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
8	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
9	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
10	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
11	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
12	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
13	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
14	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
15	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
16	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	5,8	1	8,5	1	SOLICITADO
17	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,2	1	0,0	Incidencia	SOLICITADO
18	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
19	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
20	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
21	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
22	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0		0,0	0	SOLICITADO
23	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	5,6	1	22,2	1	SOLICITADO
24	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	58,4	1	8,8	1	SOLICITADO
25	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0	Incidencia	0,0	Incidencia	SOLICITADO
26	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	5,8	1	5,0	1	SOLICITADO
27	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	23,8	1	29,2	1	SOLICITADO
28	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,2	1	0,0	Incidencia	SOLICITADO
29	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0	Incidencia	0,0	Incidencia	SOLICITADO
30	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0	Incidencia	0,0	0	SOLICITADO
31	LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA	0,0	Incidencia	0,0	0	SOLICITADO
			7,0		5,0	
TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE LLUVIA			7,0		5,0	
TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE INCIDENCIA			4		4	
TOTAL			11		9	



Wilson Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

Marco Leguizamón  
Socio Gerente  
MW INGENIERIA S.A.

Arq. Tania Obelar Nuñez  
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664
