Readecuación de la plaza Curupayty, Urbanización San Miguel, Mi Barrio Mi Pasión - ID N° 472472

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

DEPARATAMENTO DE OBRAS

Inicio del proyecto: vie, 2025-10-10

Semana para mostrar: 1

ITEMS	DETALLE	PROGRESO	INICIO	FIN	DÍAS
1	Preparación de la Obra, Cartel de obra, 1,50x2,5 m	100%	9-10-25	9-10-25	1
2	LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO	100%	10-10-25	13-10-25	4
3	PODA DE ARBOLES	100%	10-10-25	11-10-25	1
4	TALA DE ARBOLES	100%	12-10-25	14-10-25	2
5	REPLANTEO Y MARCACIÓN	100%	14-10-25	16-10-25	3
6	VALLADO DE PROTECCIÓN H:1M, CON ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS 3" Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM INCLUYE PINTURA	100%	15-10-25	17-10-25	3
7	PINTURTA Y MARCACIÓN PARAN CANCHAS DEPORTIVAS PARA ALTO TRÁNSITO.) SECTOR CANCHA MULTIUSO)	100%	17-10-25	29-10-25	13
8	BASURERO METÁLICO TIPO METAL PLEGABLE	100%	8-11-25	10-11-25	3
9	PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE 1X2M, DE MARCO DE CAÑO GALVANIZADO Y HOJA DE MALLA ELECTRO SOLDADA. INCLUYE PINTURA,	100%	20-10-25	20-10-25	1
10	PUERTA METÁLICA DE DOS HOJA DE 1X2M, DE MARCO DE CAÑO GALVANIZADO Y HOJA DE MALLA ELECTRO SOLDADA. INCLUYE PINTURA,	100%	20-10-25	20-10-25	1
11	VALLADO DE PROTECCIÓN H: VARIABLE SEGÚN PLANO, CON ESTRUCTURA DE TUBOS DE 3" Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM. INCLUYE PINTURA	100%	20-10-25	24-10-25	5
12	PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EL PARQUE INFANTIL	100%	21-10-25	25-10-25	5
13	CORDONES LATERALES DE CONTENCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	100%	23-10-25	2-11-25	11
14	ARENERO PARA JUEGO DE NIÑOS	100%	8-11-25	10-11-25	3
15	SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE BANCOS TIPO MADERA DE PVC	100%	18-11-25	22-11-25	5
16	SERVICIO DE PROVISIÓN DE MONTAJE DE JUEGOS DE PARQUE DE PVC	100%	10-11-25	13-11-25	4
17	REFLECTOR DE 200W PARA ILUMINACIÓN DE PLAZA	100%	10-11-25	12-11-25	3
18	PINTURA SINTÉTICA PARA GRADERIAS	100%	15-10-25	19-10-25	5
19	REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA(SECTOR CANTINA)	100%	15-10-25	16-10-25	2
20	CIMIENTO DE PBC. INCLUYE EXCAVACIÓN	100%	17-10-25	1-11-25	16
21	MUROS DE NIVELACIÓN: DE 0,30 M CON LADRILLO COMÚN	100%	1-11-25	6-11-25	6
22	AISLACIÓN HORIZONTAL 0,30 CON ASFALTO	100%	6-11-25	8-11-25	3
23	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN CON LADRILLO HUECO DE 0,15	100%	6-11-25	21-11-25	16

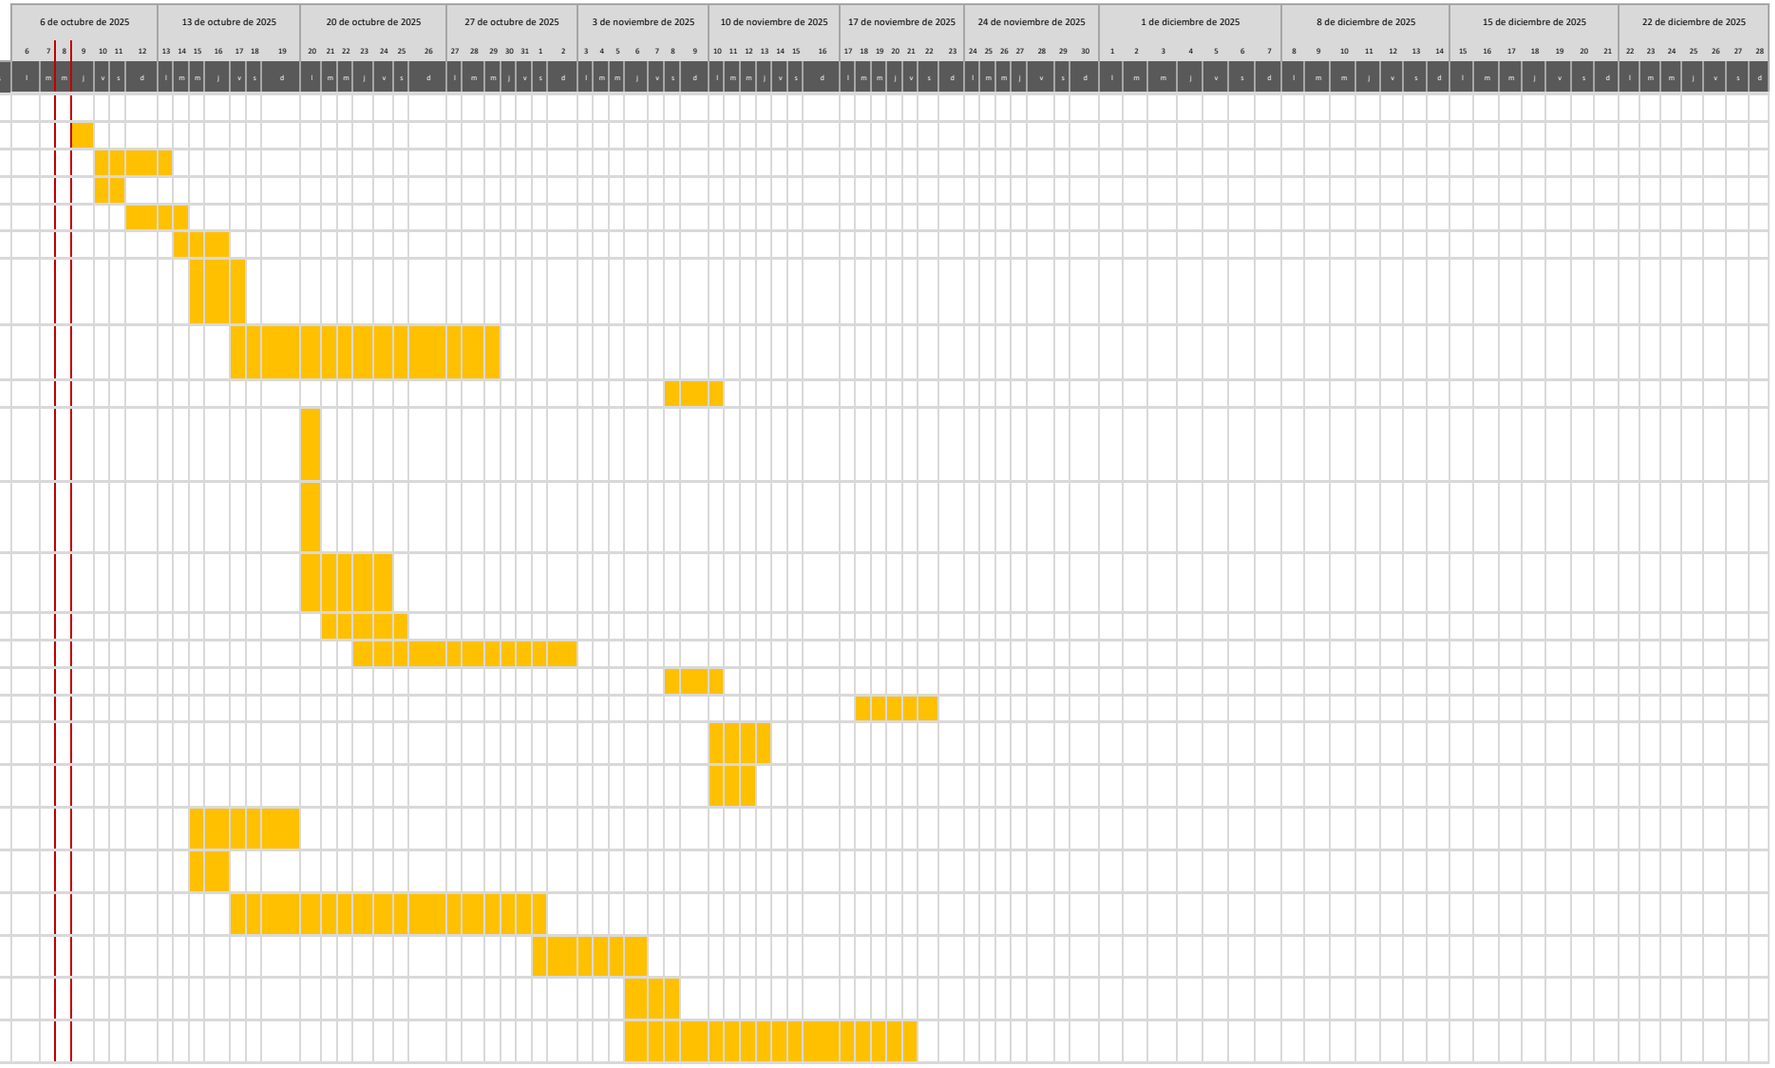

DEPARATAMENTO DE OBRAS

Semana para mostrar: 1
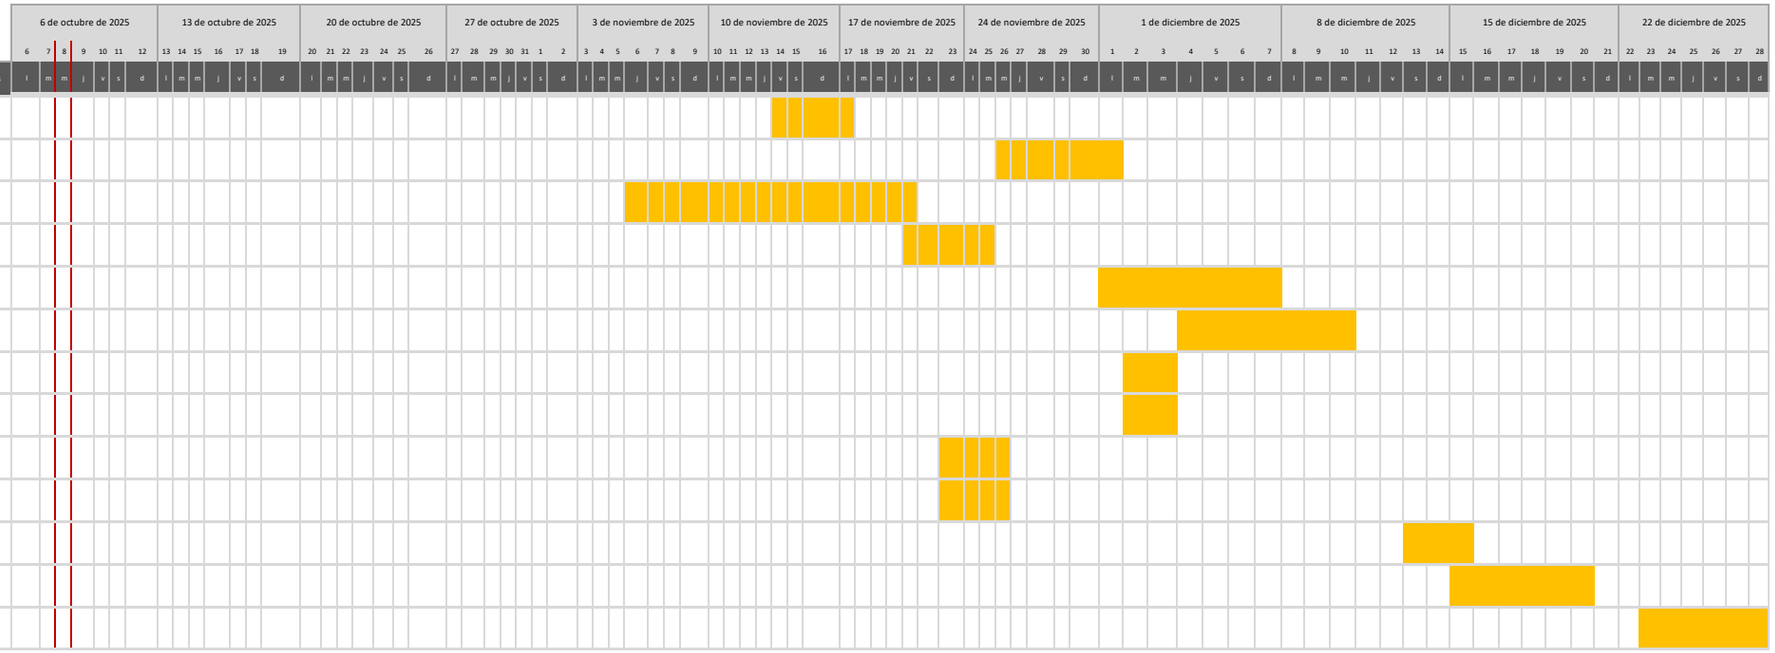
ITEMS	DETALLE	PROGRESO	INICIO	FIN	DÍAS
24	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2ø8 POR HILADA (2 HILADAS)	100%	14-11-25	17-11-25	4
25	REVOQUE DE PAREDES Y COLUMNAS A DOS CARAS	100%	26-11-25	1-12-25	6
26	COLUMNAS DE HORMIGÓN DE 0,15X0,15 M	100%	6-11-25	21-11-25	16
27	ENCADENADO SUPERIOR DE HORMIGÓN 13X30 CM	100%	21-11-25	25-11-25	5
28	TECHIO INCLUYE PERFIL TIPO C DE 100MM Y CHAPA TRAPEZOIDAL N°26 SALIENTE DE 1M	100%	1-12-25	7-12-25	7
29	PINTURA PARED INTERIOR/EXTERIOR A DOS MANOS	100%	4-12-25	10-12-25	7
30	PUERTA METÁLICA DE 0,9X2,1 M, INCLUYE PINTURA, MARCO Y HERRAJES	100%	2-12-25	3-12-25	2
31	VENTANA BASCULANTE DE CHAPA DE 1,80X2,10. INCLUYE PINTURA, MARCO Y HERRAJES	100%	2-12-25	3-12-25	2
32	PISO CERÁMICO DE 45X45 CM	100%	23-11-25	26-11-25	4
33	ZOCALO CERÁMICO DE 10CM DE ALTURA	100%	23-11-25	26-11-25	4
34	MESADA DE SERVICIO DE HORMIGON Y REVESTIMIENTO DE CARÁMICA 1,80X0,50 M	100%	13-12-25	15-12-25	3
35	INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	100%	15-12-25	20-12-25	6
36	LIMPIEZA DE OBRA	100%	23-12-25	28-12-25	6
