Anexo Nº 6 - Curvas de Avance Físico-Financiero Reprogramadas.

Jorge Reyes Lara

Consorcio ALC

Obra: Lote No.5 - San Jose Obrero - Ruta No.10

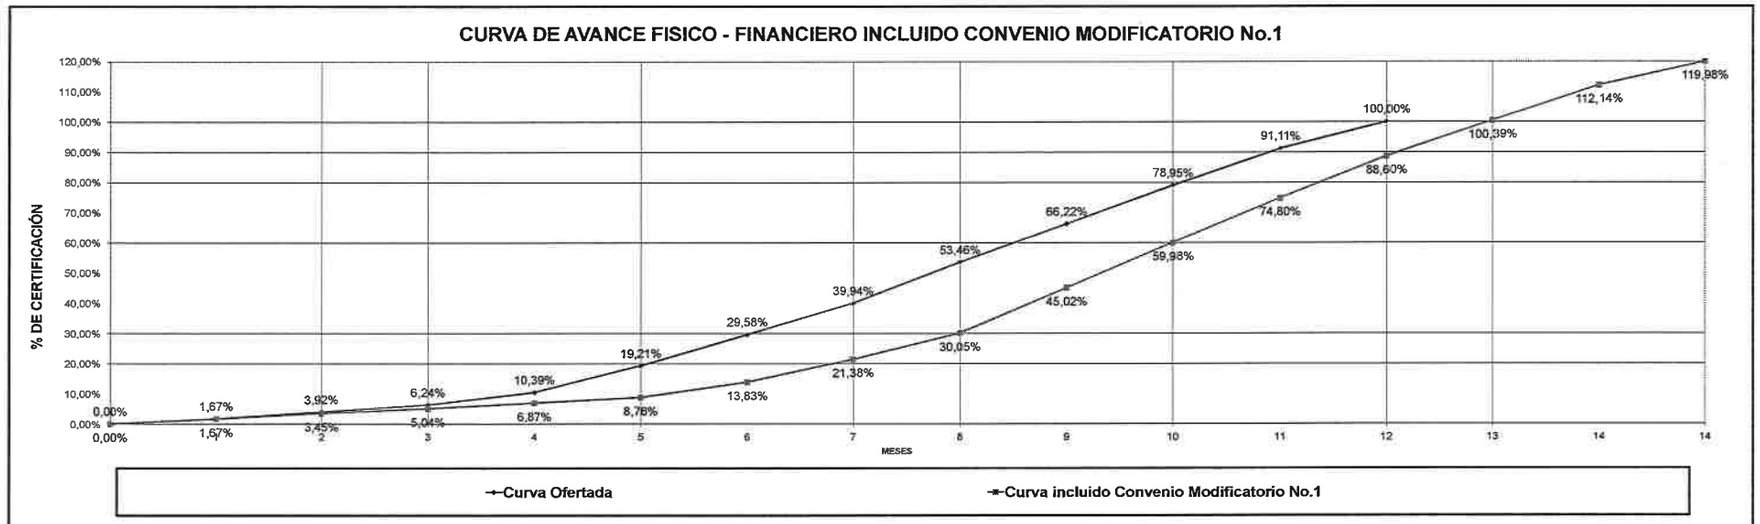

Meses		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Avance Mensual Previsto Contractual		1,67%	2,25%	2,32%	4,15%	8,82%	10,37%	10,37%	13,51%	12,76%	12,74%	12,16%	8,89%			
Avance Acumulado Previsto Contractual		1,67%	3,92%	6,24%	10,39%	19,21%	29,58%	39,94%	53,46%	66,22%	78,95%	91,11%	100,00%			
Avance Mensual Programado incluido el Convenio Modificatoro No.1		1,67%	1,78%	1,56%	1,83%	1,85%	5,07%	7,58%	8,67%	14,97%	14,85%	14,82%	13,80%	11,79%	11,74%	7,84%
Avance Acumulado Programado incluido el Convenio Modificatoro No.1		1,67%	3,45%	5,04%	6,87%	8,78%	13,83%	21,38%	30,05%	45,02%	59,98%	74,80%	88,60%	100,39%	112,14%	119,98%

Inga Deisy Caballero C

104 - cuatro cuatro
