Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
649	**Aberturas Celdas y Talleres**	**jue 14/1/21**	**vie 14/5/21**
650	Cerramiento de malla de metal desplegado en fachada para cubrir instalaciones sanitarias	jue 14/1/21	jue 28/1/21
651	(Pr1_Vpr1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
652	(Pr2_Vpr2) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,90 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
653	(PR11') Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada) de 1,56 m x 6,48 m. (verificar cantidad en planta)	vie 30/4/21	vie 14/5/21
654	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	jue 14/1/21	jue 28/1/21
655	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	jue 14/1/21	jue 28/1/21
656	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,84 m, con varilla de 20mm, cuenta con una (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
657	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,79 m, cuenta con una parte (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
658	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,05 m x 3.14 m, con varilla de 20mm para acceso desde comedor, (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
659	(Pr1_Vpr1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
660	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	jue 14/1/21	jue 28/1/21
661	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	jue 14/1/21	jue 28/1/21
662	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	jue 14/1/21	jue 28/1/21
663	(Pr1'_Vpr1') Provisión y colocación de puerta en celda de 0.80 x 2.10 con reja fija superior de 1,18 x 0,60 (ver especificaciones tecnicas)	vie 30/4/21	vie 14/5/21
664	(V21) Provisión y colocación persina, Celdas de maxima seguridad	jue 14/1/21	jue 28/1/21
665	(PR11') Provisión y colocación Abertura en zona tecnica sanitaria en fachada	vie 30/4/21	vie 14/5/21
666	(V21) Provisión y colocación persina corrediza, Celdas	jue 14/1/21	jue 28/1/21
667	(PM3') Provisión y colocación de puerta metálica (ver especificaciones tecnicas)	vie 30/4/21	vie 14/5/21
668	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
669	(PM3') Provisión y colocación de puerta metálica (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
670	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
671	(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N°18 (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
672	(PM3_accesible) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N°18 (ver especificaciones tecnicas)	jue 14/1/21	jue 28/1/21
673	(PR7') Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	vie 30/4/21	vie 14/5/21
674	**Aberturas Varias**	lun 5/10/20	mar 23/2/21
675	**31. ITEMS CONVENIO MODIF. 3**	**jue 11/3/21**	**dom 30/1/22**
676	**Carpinteria Metalica**	**dom 15/8/21**	**sáb 8/1/22**

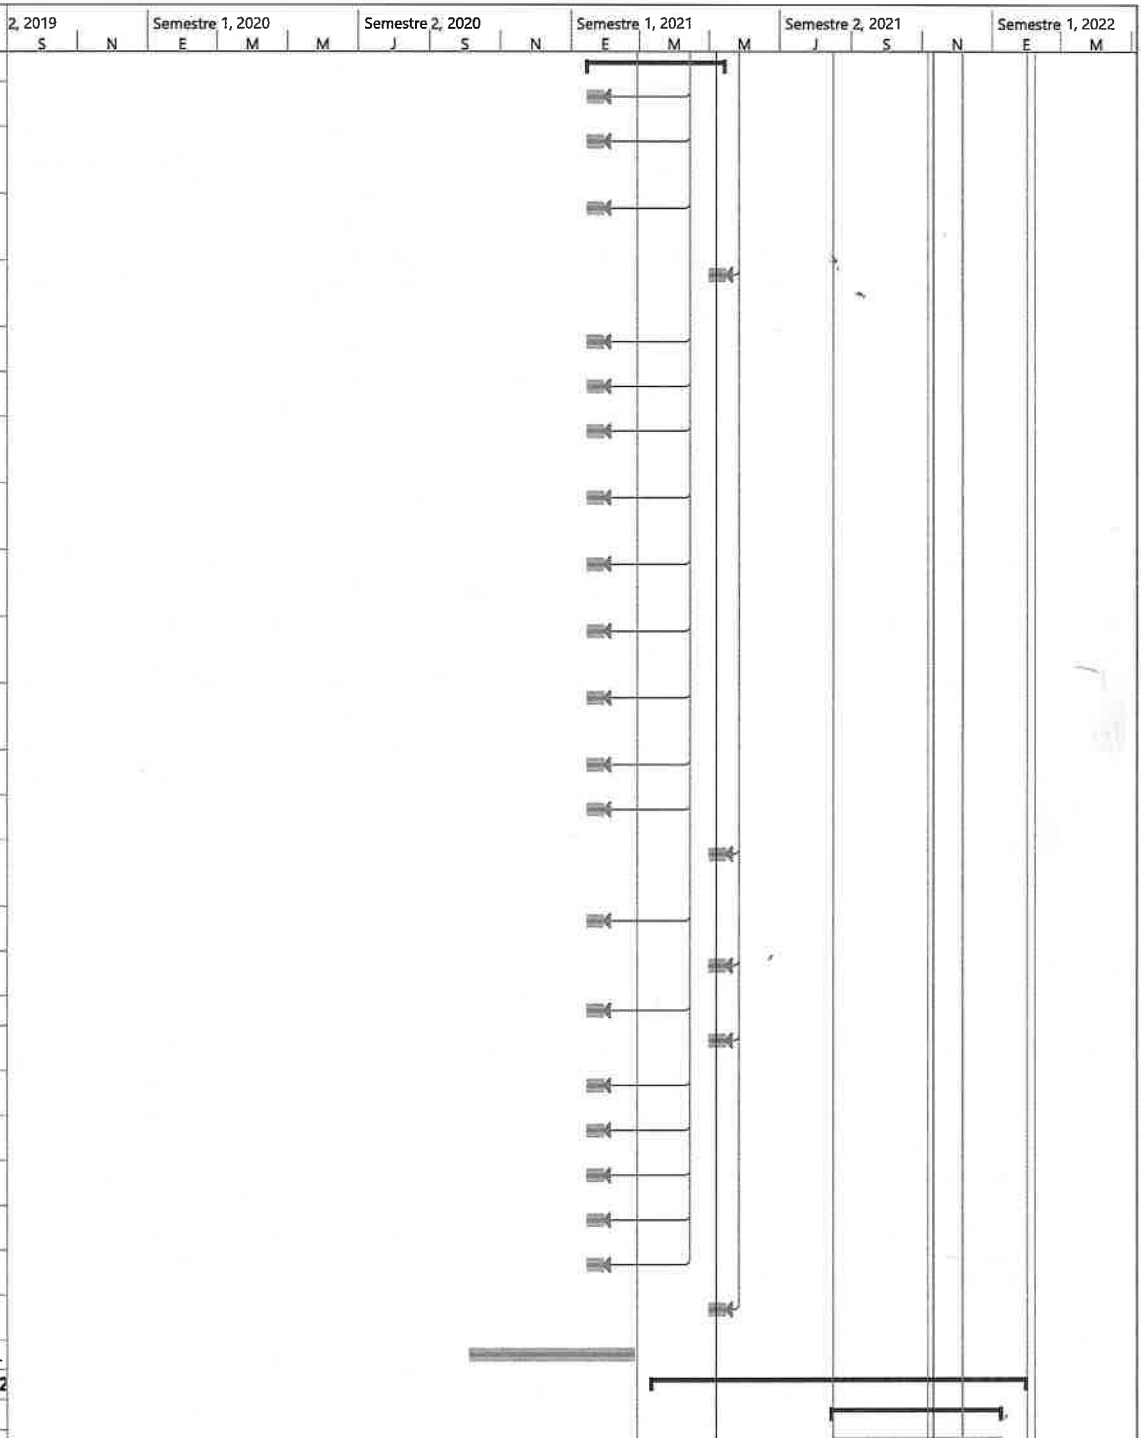

	expandida acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,82 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado - Puerta Oficina	15/8/21	
678	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,60 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herrajes y cerradura - Baño Guardia	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
679	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm - Ventana Pasillo Celdas	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
680	(Vr13) Provisión y colocación de ventana reja 3,90 m x 2,79 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
681	(Vr14) Provisión y colocación de ventana reja 3,90 m x 2,79 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
682	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
683	(PR17'A) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x3,04 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
684	(PR3.2) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,69 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
685	(PR3.1) Provisión y colocación de puerta de 1,54 m x 2,69 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
686	(Ps1) Provisión y colocación de puerta, hoja 1,98 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
687	(Ps2) Provisión y colocación de puerta, hoja 1,60 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
688	(P3) Provisión y colocación de puerta, hoja 0,80 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
689	(V39) Provisión y colocación de ventana, 2,00 m x 1,00 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
690	(Vb1) Provisión y colocación de ventana, 0,60 m x 0,40 m - Baño	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
691	(Vb3) Provisión y colocación de ventana, 3,00 m x 1,00 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
692	(PR3.2) Provisión y colocación de puerta reja 1,60 m x 2,69 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
693	(PR21) Provisión y colocación de Reja 1,24x2,10m y puerta 0,90x2,10m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
694	(PR17_8.60) Provisión y colocación de puerta reja 8,60 m x 2,49 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
695	(PR17') Provisión y colocación de puerta reja 8,19 m x 2,49 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
696	(PFP) Provisión y colocación de puerta reja 3,90m x 2,49 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
697	(Vr6') Provisión y colocación de ventana 2,42 m x 0,50 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
698	(Vr12) Provisión y colocación de ventana 0,97 m x 1,00 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
699	(PR9) Provisión y colocación de puerta reja 3,50 m x 2,49 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22

Sara Blanco
Representante Legal

00000052

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
700	(Vr6') Provisión y colocación de ventana 2,42 m x 0,50 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
701	(Puerta 1) Provisión y colocación de puerta 0,82 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
702	(Puerta 2) Provisión y colocación de puerta 0,72 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
703	(Ventana 1) Provisión y colocación de ventana 1,30 m x 1,15 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
704	(Ventana2) Provisión y colocación de ventana 0,40 m x 0,40	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
705	(PM3.1) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja enchapada metálica de 0,80 m x 2,10 m - Puerta principal de ingreso a baño de talleres	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
706	(PM3.1) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja enchapada metálica de 0,80 m x 2,10 m - Puerta principal de ingreso a baño de talleres	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
707	(Vrm1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m, con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20mm	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
708	(Vb4) Provisión y colocación de ventana reja 0,40 m x 0,40 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
709	(PG1) Provisión y colocación de puerta 0,80 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
710	(PMD) Provision y colocacion de puerta de madera, hoja 0,60 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
711	(PMP) Provisión y colocación de puerta metálica 0,72 m x 2,10 m	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
712	(PR11´ - A) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - cloacal) de 2,06 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con metal desplegado, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
713	(PR11´ - B) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - cloacal individual) de 1,05 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con metal desplegado, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
714	(PR11´ - C) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - ducha individual) de 0,45 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con metal desplegado., estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
715	(PR11´ - D) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - ducha doble) de 1,21 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con metal desplegado., estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
716	(Vrv9MS) Provision y colocacion de 1 reja fija de 0,40x1,30 y una persiana corrediza 0,40x1,30.	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
717	(Vr8/Vm2_1.90) Provisión y colocación de Reja fija 1.90x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
718	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio	dom 15/8/21	sáb 8/1/22

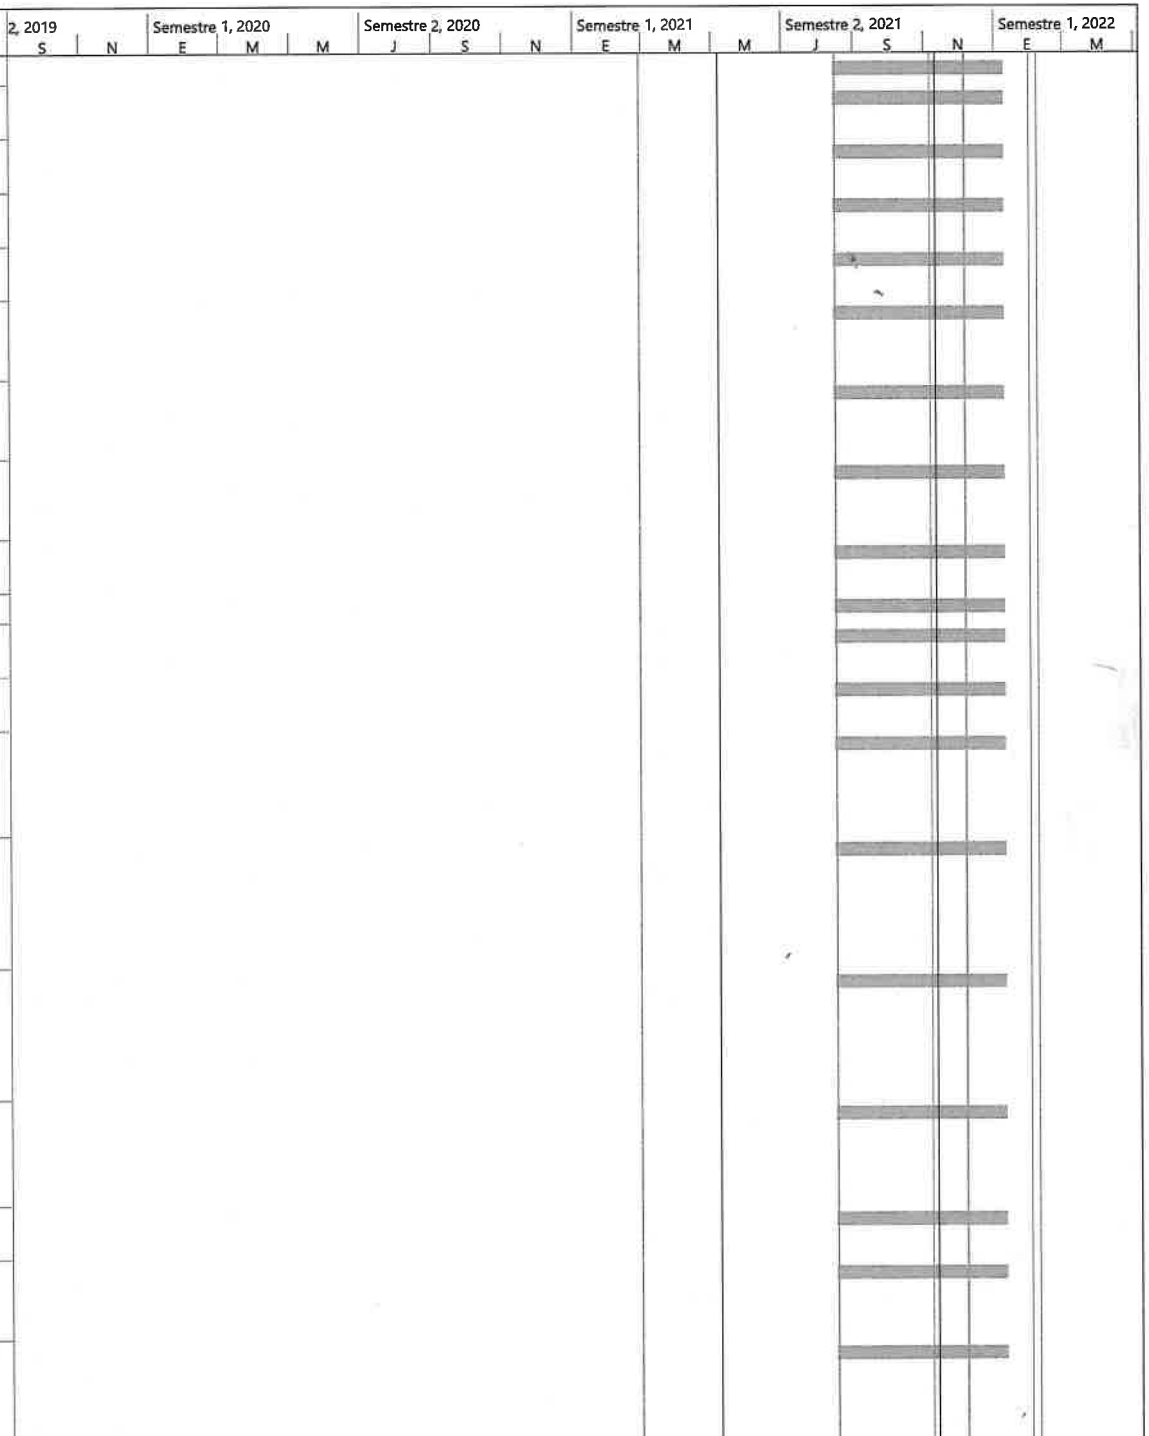

	de 1,70x1,00	15/8/21	
720	(V17) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,30x1,00	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
721	(V20baño) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de0,70x1,00	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
722	(Vt1) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 0,60x0,30	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
723	(PMVV) Puerta Vaiven en Baño	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
724	(VR7) Taller Maxima Seguridad 2x0,50	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
725	(VD1) Reja metalica 1,30x1,00 y ventana vidriera	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
726	(PM2) Puerta metalica enchapada 0,72x2,10	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
727	(Vga1) Ventana de vidrio templado fijo 1 x 1,10	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
728	(Vga2) Ventana de vidrio templado fijo 1 x 1,10	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
729	(P1ga) Ventana de vidrio templado fijo 0,70 x 2,10	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
730	(Vgb1) Ventana de vidrio corrediza 1,80 x 2,10	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
731	(Vgb2) Ventana de vidrio templado fijo 0,90x1,00	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
732	(P1d) Puertas de cateo - Recepcion Admin	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
733	(P4d) Puertas de cateo - Recepcion Admin	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
734	(PR3.3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,50 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
735	(Pr19v) Reja metalica fija 2,34x1,74 marco de caño de 40x40, con pared de 2mm	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
736	(PR10.1) Provisión y colocación de reja fija 0,20x2,10 m de dos hojas móvil de 1,38 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
737	(PR10.2) Provisión y colocación de reja fija 1,80x2,10 m de dos hojas móvil de 1,38 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
738	(PR10') Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,38 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
739	Provisión y colocacion de puerta eucatex, con perfilería de aluminio, Incluye cerradura pomo, bisagras.	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
740	Ventana proteccion iluminacion de celdas - Lado interno	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
741	Ventana proteccion iluminacion de celdas - Lado externo	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
742	Guardaganado	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
743	Rejilla metalica	dom 15/8/21	sáb 8/1/22
744	**Obras Complementarias**	**lun 16/8/21**	**vie 26/11/21**
745	Alambrado interno (Sector Visitas)	lun 4/10/21	jue 4/11/21
746	Cordon para empedrado	lun 4/10/21	jue 4/11/21
747	Mensulas metalicas para soporte de Estructura de Garita	sáb 30/10/21	sáb 13/11/21
748	Escalera metalica de acceso a Garita tipo caracol. Huella; ancho 1,10 mts. Altura total: 6 mts. Sistema de barandas, rodapie, fundaciones, estructura metálica independiente. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	sáb 30/10/21	vie 26/11/21
749	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	lun 16/8/21	vie 3/9/21
750	**Obra Seca**	**lun 30/8/21**	**sáb 9/10/21**

Sara Blanco
Representante Legal

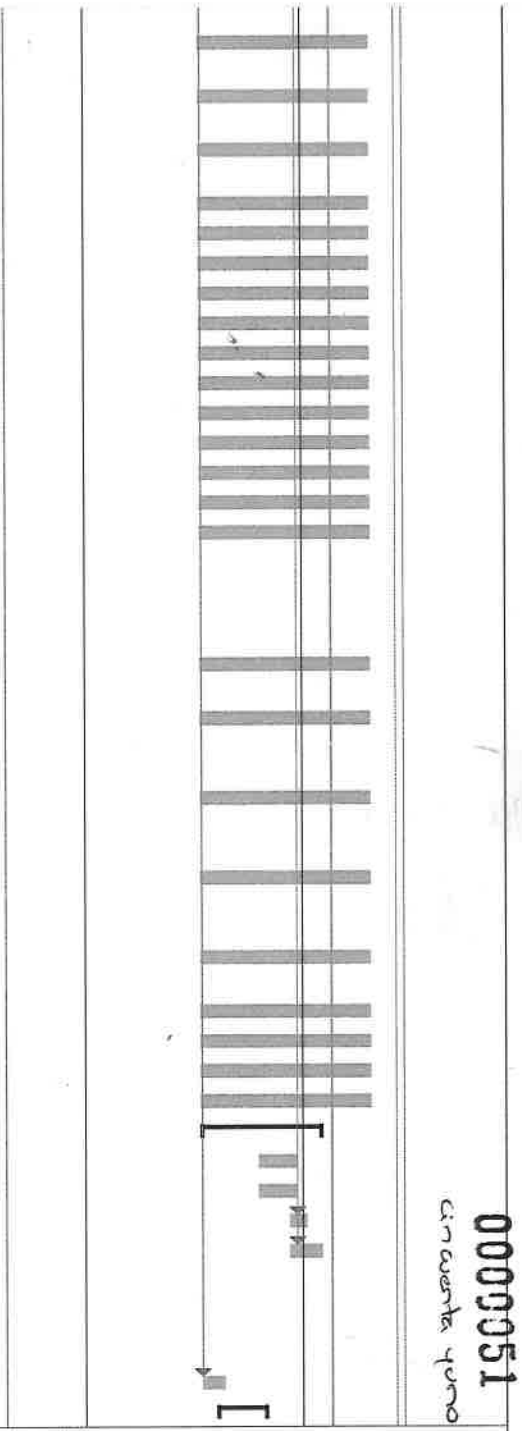

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
751	Provisión y colocacion de cielorraso de Durlock con placas estándar de 12,5 mm, estructura de chapa de 35 mm, cintado y masillado. (COCINA)	lun 30/8/21	dom 12/9/21
752	Provisión y colocacion de Buña z (COCINA)	dom 12/9/21	dom 26/9/21
753	Provisión y colocación de cierre vertical con placas cementicio de 8 mm, estructura de chapa de 35 mm, cintado y masillado, (LATERALES DE TECHO DE PABELLONES)	dom 26/9/21	sáb 9/10/21
754	**Instalaciones Electricas**	**jue 4/11/21**	**dom 30/1/22**
755	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
756	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
757	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
758	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
759	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
760	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
761	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
762	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
763	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
764	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
765	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
766	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYA	jue 4/11/21	dom 30/1/22
767	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
768	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	jue 4/11/21	dom 30/1/22
769	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	jue 4/11/21	dom 30/1/22
770	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
771	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
772	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
773	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	jue 4/11/21	dom 30/1/22
774	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	jue 4/11/21	dom 30/1/22
775	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
776	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
777	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
778	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	jue 4/11/21	dom 30/1/22
779	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	jue 4/11/21	dom 30/1/22
780	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
781	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
782	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
783	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	jue 4/11/21	dom 30/1/22
784	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente	jue 4/11/21	dom

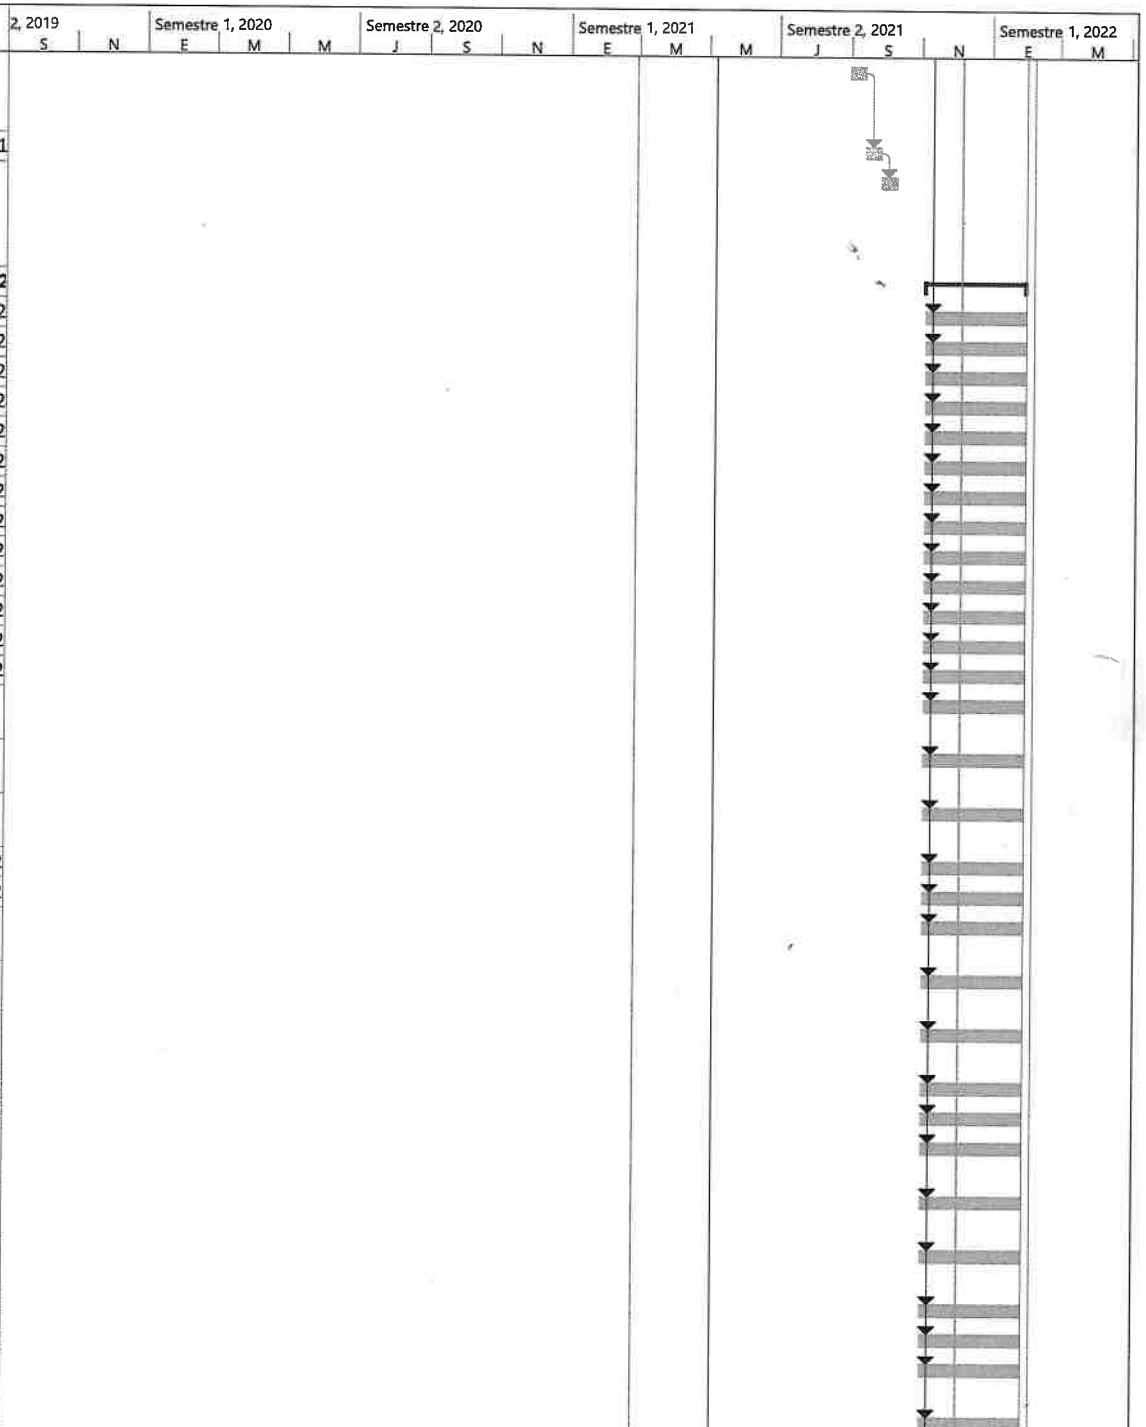

785	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
786	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
787	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
788	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
789	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
790	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
791	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
792	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
793	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
794	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
795	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
796	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
797	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
798	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
799	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
800	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente	jue 4/11/21	dom 30/1/22
801	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
802	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
803	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
804	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
805	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
806	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
807	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
808	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
809	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
810	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
811	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
812	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
813	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
814	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
815	Provisión e instalación de ventilador de techo	jue 4/11/21	dom 30/1/22
816	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
817	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
818	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
819	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
820	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
821	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22

Sara Blanco
Representante Legal

0000350

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
822	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
823	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
824	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
825	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
826	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
827	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	jue 4/11/21	dom 30/1/22
828	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
829	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	jue 4/11/21	dom 30/1/22
830	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2	jue 4/11/21	dom 30/1/22
831	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2.	jue 4/11/21	dom 30/1/22
832	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2	jue 4/11/21	dom 30/1/22
833	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x25mm2	jue 4/11/21	dom 30/1/22
834	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x50mm2	jue 4/11/21	dom 30/1/22
835	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x75mm2	jue 4/11/21	dom 30/1/22
836	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x95mm2	jue 4/11/21	dom 30/1/22
837	Provisión e instalación de bandeja portacables de 200 mm	jue 4/11/21	dom 30/1/22
838	Provisión e instalación de bandeja portacables de 600 mm	jue 4/11/21	dom 30/1/22
839	Provisión e instalación de bandeja portacables de 100 mm	jue 4/11/21	dom 30/1/22
840	Provisión e instalación de bandeja portacables de 300 mm	jue 4/11/21	dom 30/1/22
841	**Instalaciones Hidrosanitarias y PCI**	**jue 11/3/21**	**mar 25/1/22**
842	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD de 110 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
843	Artefacto sanitario provisión y colocación de kit sanitario (inodoro - lavatorio)	vie 30/4/21	mié 21/7/21
844	Artefacto sanitario ducha antivandalica	vie 30/4/21	mié 21/7/21
845	Artefacto sanitario de brazo para cisterna para alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21
846	Artefacto sanitario provision y colocacion de ducha pasante de alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21
847	Artefacto sanitario provision y colocacion de pino accionador de alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21
848	Artefacto sanitario provision y colocacion para pico pasante para lavatorio de alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21
849	Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para ducha de alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21
850	Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para lavatorio de alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21
851	Artefacto sanitario provision y colocacion de cisterna de alta seguridad	vie 30/4/21	mié 21/7/21

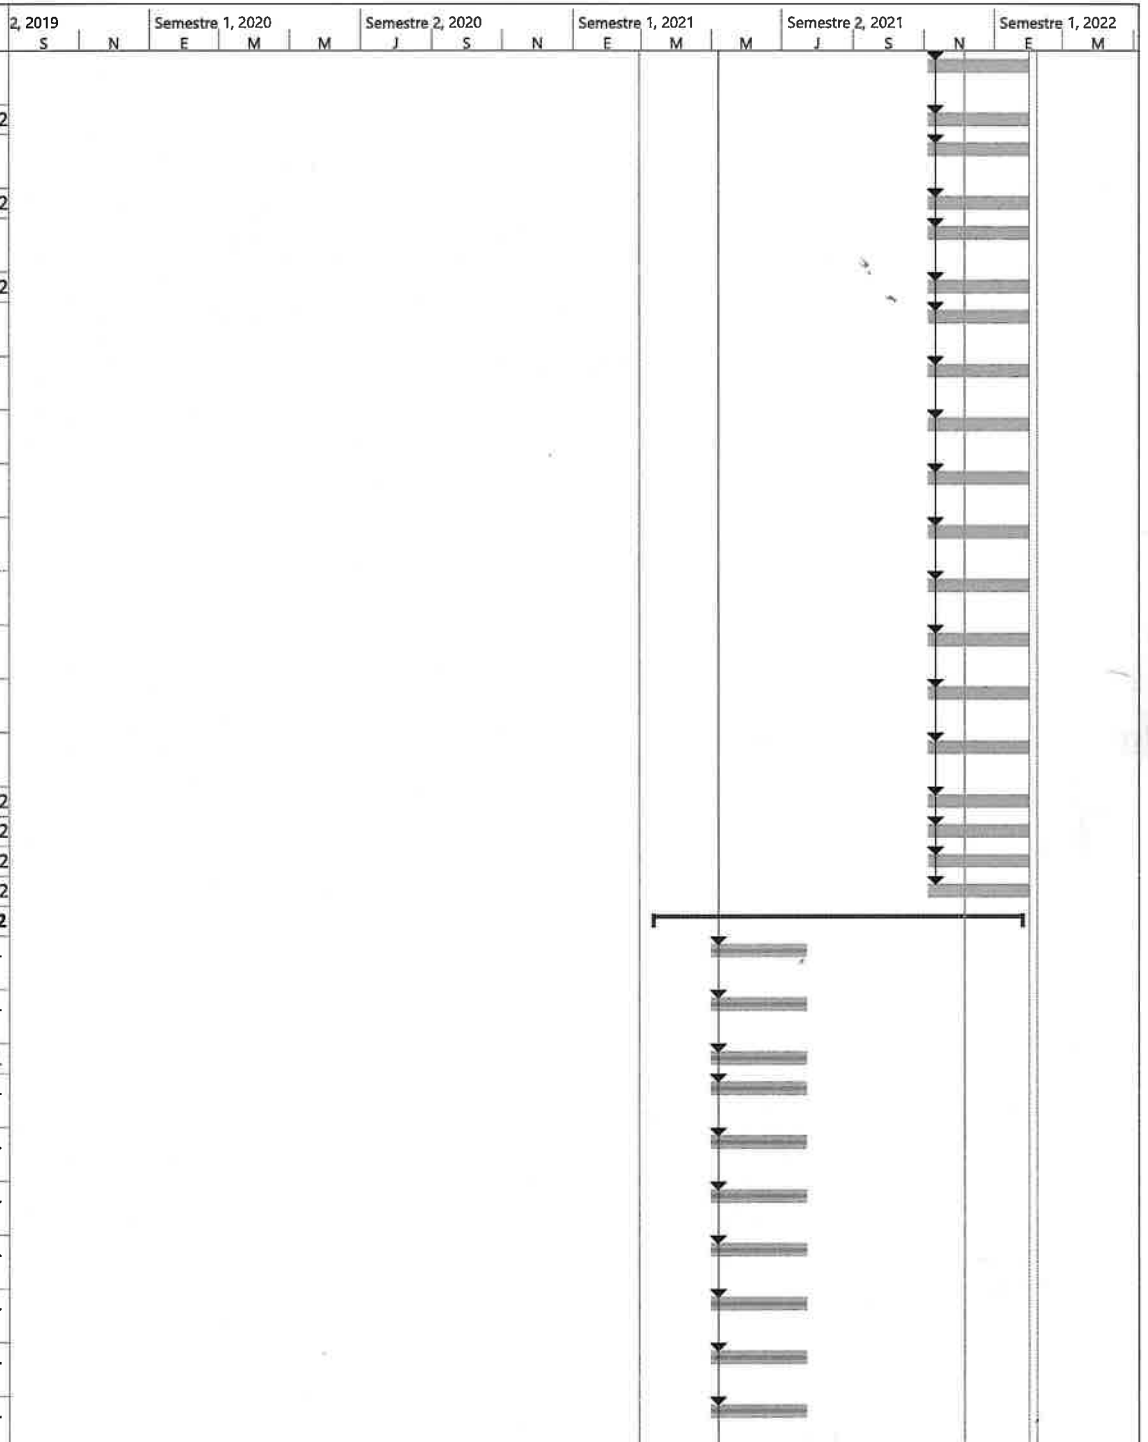

853	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
854	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 50 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
855	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	vie 30/4/21	mié 21/7/21
856	Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	vie 30/4/21	mié 21/7/21
857	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	vie 30/4/21	mié 21/7/21
858	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 100 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
859	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 300 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
860	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
861	Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	vie 30/4/21	mié 21/7/21
862	Artefacto sanitario inodoro para discapacitados	vie 30/4/21	mié 21/7/21
863	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	vie 30/4/21	mié 21/7/21
864	Inst. desague cloacal provisión y colocación de PVC de .250 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
865	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
866	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	vie 30/4/21	mié 21/7/21
867	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 50 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
868	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
869	Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	vie 30/4/21	mié 21/7/21
870	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	vie 30/4/21	mié 21/7/21
871	Artefacto sanitario canilla comun para lavamanos plástico	vie 30/4/21	mié 21/7/21
872	Artefacto sanitario griferia cromada pico movil con filtro para cocina	vie 30/4/21	mié 21/7/21
873	Inst. Desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .200 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
874	Inst.provisión y colocación de Caño de hierro galvanizado 3"	vie 30/4/21	mié 21/7/21
875	Inst.provisión y colocación de PVC negro 100mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
876	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
877	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
878	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 50 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
879	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
880	Provisión y colocación de cañerías de PVC 100	vie 30/4/21	mié 21/7/21
881	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .25 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
882	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21

Sara Blanco
Representante Legal

Cuarenta y nueve

0000049

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
883	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD De 160 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
884	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 50 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
885	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 160 mm	vie 30/4/21	mié 21/7/21
886	Caño de hierro galvanizado 4	vie 30/4/21	mié 21/7/21
887	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	vie 30/4/21	mié 21/7/21
888	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	vie 30/4/21	mié 21/7/21
889	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plastico	vie 30/4/21	mié 21/7/21
890	Estructura de salida pluvial con disipador de energía	vie 30/4/21	mié 21/7/21
891	Bomba elevadora. Pot= 5,5 kW	mié 1/12/21	mar 25/1/22
892	Bombas principal incendio. Pot= 30 HP	mié 1/12/21	mar 25/1/22
893	Bomba principal Pedrollo F50/160B 7,5HP	mié 1/12/21	mar 25/1/22
894	Entrepiso metálico Steel Deck de 8 mm - Con accesorios y conectores	mié 1/12/21	mar 25/1/22
895	Tuberia PVC 300mm vinilfort	jue 11/3/21	mié 7/4/21
896	Tuberia PEAD estructurado Dn 400	mié 7/4/21	mar 1/6/21
897	Tuberia PEAD estructurado Dn 500	mar 1/6/21	lun 26/7/21
898	Tuberia PEAD estructurado Dn 600	lun 26/7/21	dom 19/9/21
899	Tuberia PEAD estructurado Dn 800	dom 19/9/21	vie 12/11/21
900	Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de PCI	mié 29/12/21	mar 25/1/22
901	Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de elevacion	mié 29/12/21	mar 25/1/22
902	Tuberias de 6" hierro Galvanizado de alimentacion desde pozo	mié 29/12/21	mar 25/1/22
903	Tuberias de 4" hierro Galvanizado desde sistema elevacion a tanque,	mié 29/12/21	mar 25/1/22
904	Tuberias de 1 1/2" hierro Galvanizado. Ruptor de vacio	mié 29/12/21	mar 25/1/22
905	Valvula flotador	mié 29/12/21	mar 25/1/22
906	Llave de paso exclusa de 6"	mié 29/12/21	mar 25/1/22
907	Llave esferica	mié 29/12/21	mar 25/1/22
908	Tuberias + Valvulas de purga 1"	mié 29/12/21	mar 25/1/22
909	Excavación	mié 29/12/21	mar 25/1/22
910	Relleno y compactación	mié 29/12/21	mar 25/1/22
911	Cañería de desague del agua tratada por la PTAR hasta disposición final	mié 29/12/21	mar 25/1/22
912	Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de presurizacion	mié 29/12/21	mar 25/1/22
913	**Pinturas**	**lun 4/10/21**	**sáb 13/11/21**
914	Pintura de muros al látex interior - Muro perimetral y de seguridad	lun 4/10/21	sáb 13/11/21
915	Pintura de muros al látex exterior - Muro perimetral y de seguridad	lun 4/10/21	sáb 13/11/21
916	Pintura de cielorraso de losa	lun 4/10/21	sáb 13/11/21
917	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo (montantes)	lun 4/10/21	sáb 13/11/21

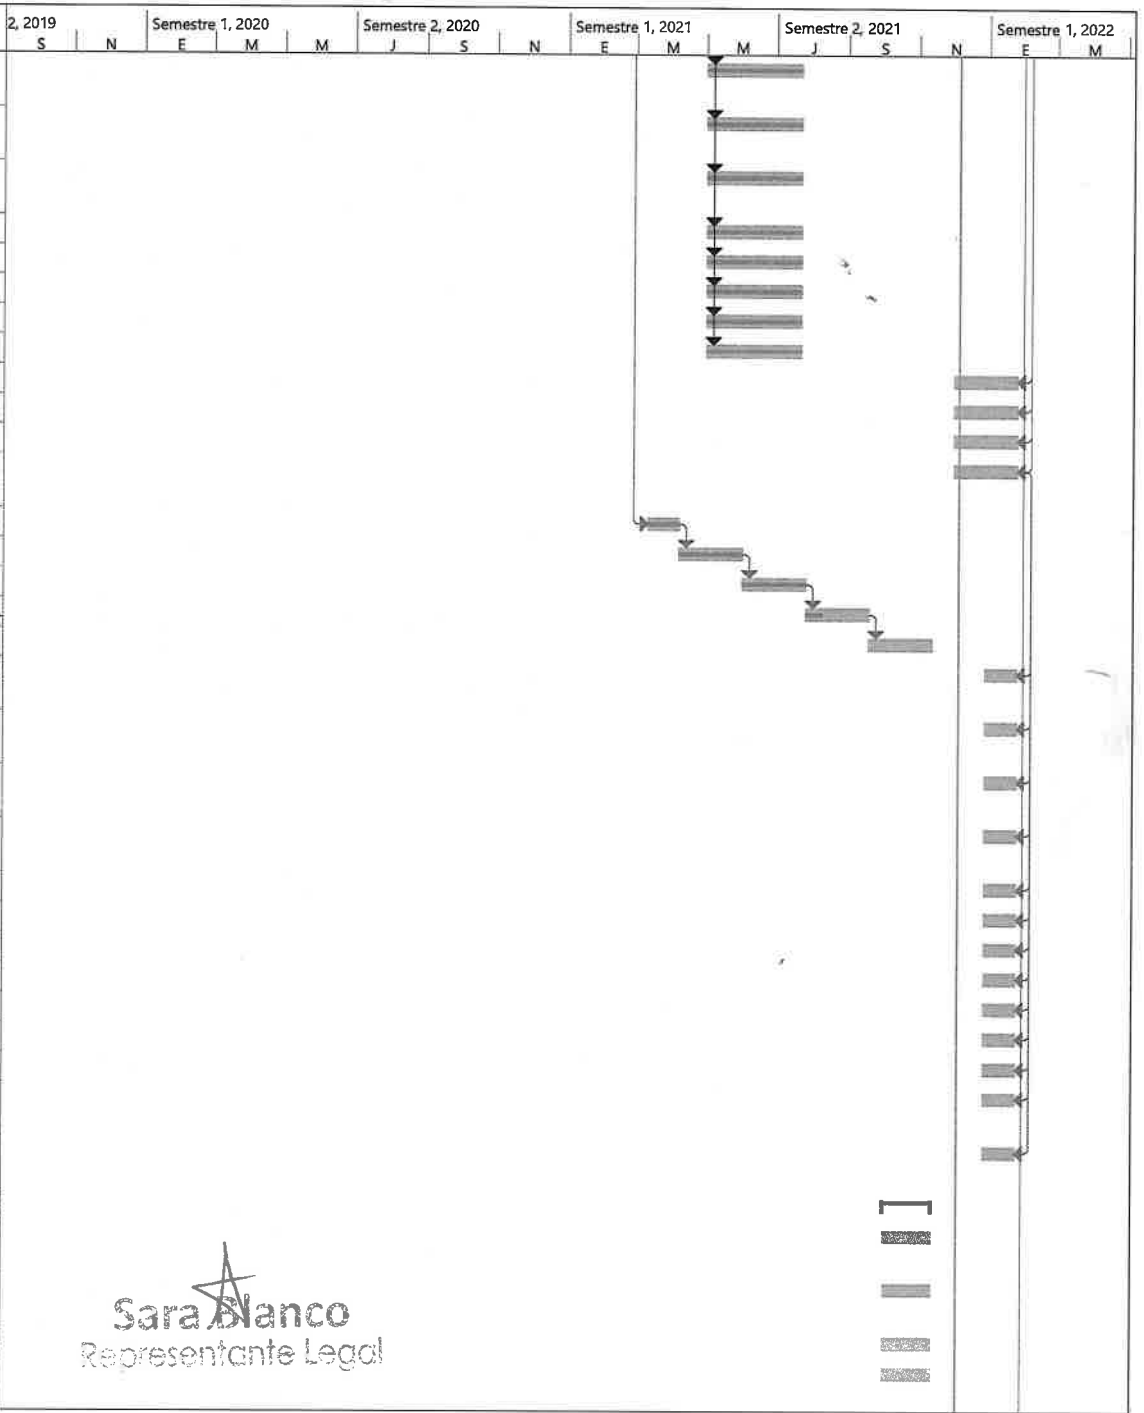

Sara Blanco
Representante Legal

0000048
cuarenta y ocho
