51 (cincuenta y uno)

Asunción, 6 de Octubre de 2021

Señor

Ing. Rubén Andino, Director

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Presente

Ref: *LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION – LOTE 2. ID: 365732. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019"*
Asunto: Eventos Compensables por Fuerza Mayor.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 30 días de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato:

- 23.1 **Casos de Fuerza Mayor**, "Para efectos del presente contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes."

Esta solicitud de compensación por eventos compensables es a consecuencia de la realización en simultaneo de obras de pavimentación asfáltica correspondiente al *llamado 67/2019 "Licitación Pública Nacional para las obras de caminos vecinales con pavimentación tipo asfalto en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú." Contrato 383/2019,* que en cuyo Convenio Modificatorio 1 prolonga 7 km del tramo original, ocasionando un traslado de la progresiva de inicio del presente contrato que repercute en retrasos en la ejecución normal del mismo.

Sin otro particular hacemos propia la ocasión para saludarle muy atentamente.

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

Ing. Edgar Ahrens
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha 06/10/21
Firma

50 (cincuenta)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 01 de octubre de 2021

COPIA

DCV-MOPC Nº 2.574 /2021

Señores
Consorcio CCI
18 de Júlio 2350.
Asunción-Central.
Presente

Ref.: **Contrato S.G. Ministro Nº 473/2019** - Lote 2.
Llamado MOPC Nº 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.
Asunto: Aprobación Cronograma Físico – Financiero.

Me dirijo a Ustedes, en el marco del llamado de la referencia, a fin de remitirle la siguiente **Aprobación del Cronograma y Curva de Avance Físico - Financiero**. Al respecto, su **Nota MEU 38.064/2021** en donde presentan la Documentación Técnica para el Convenio Modificatorio N°2.

Atendiendo el informe técnico presentado por el Ing. Jorge Villalba, Fiscal de Obra con fecha 16 de septiembre de 2021 al Departamento de Ejecución respecto a la revisión del Convenio Modificatorio N°2 y concluyendo la evaluación del Cronograma y Curva Físico - Financiero la DCV aprueba la presentación del mismo mientras se tramita el Convenio Modificatorio N°2, y otorga 12 (doce) días con lo cual la nueva fecha de finalización es el **13 de octubre del 2021.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

ING. RUBÉN ANDINO LEZCANO.
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM

A	:	**Ing. Osvaldo López**, Jefe Departamento de Ejecución – DCV
DE	:	**Jorge Villalba**, Fiscal de Obra
REF.	:	LLAMADO MOPC N° 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION. ID 365.732 **Contrato SG Ministro Nº 473 /2019** **Empresa Contratista: Consorcio CCI.** **Asunto: Informe técnico de la Fiscalización de C.M. N° 2**

FECHA : 01/10/2021

Me dirijo a Usted en relación al contrato de la referencia, a fin de remitirle el Informe Técnico de Fiscalización de la propuesta de Convenio Modificatorio N° 2 de la Empresa Contratista Consorcio CCI.

Los trabajos incluidos se adecuan a lo establecido en las Clausulas de las CGC-Contrataciones de Obras, Clausulas 19 (Obras o trabajos no previstos en las cantidades contractuales) y clausula 20 (Convenio Modificatorio de las Condiciones Generales de Contrato) y acorde a lo establecido en el Articulo N 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Las modificaciones a implementarse a través del Convenio Modificatorio N° 2, se basan en la revisión y actualización de las cantidades del Convenio modificatorio 1, vigente actualmente. Las modificaciones introducidas son necesarias para el logro de una obra funcional, atendiendo a los requerimientos técnicos acordes con las características de la vía y adecuándose a las condiciones reales del camino existente sobre el cual se desarrolla el trazado, razón por la cual, esta fiscalización considera razonable y recomienda, salvo mejor parecer, proseguir con los trámites necesarios para su aprobación y formalización a través del Convenio Modificatorio N° 2.

Detalle de la propuesta en el siguiente cuadro:

Monto Contractual Lote N° 2.	**Gs. 18.120.929.838 (IVA Incluido)**
Monto Convenio Modificatorio N° 1 del lote 2.	**Gs. 21.208.485.622 (IVA Incluido)**
Variación del Monto por CM N° 2 respecto al contrato.	**Gs. 3.558.326.555 (IVA Incluido)**

48 (cuarenta y ocho

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Variación del Monto por CM N° 2 respecto al CM N°1.	**Gs. 470.770.771 (IVA Incluido)**
Monto Final Modificado del Lote N° 2 por Convenio Modificatorio N° 2	**Gs. 21.679.256.393 (IVA Incluido)**
Variación % del aumento del monto del Lote N° 2	19,64. %
Fecha de Término de Obra por Convenio Modificatorio 2.	13/10/2021

Plazos aprobados a la fecha.

Orden de Inicio Contractual	**02/01/2020**
Fecha de Fin Contractual	**02/04/2021**
Fecha Modificada por Convenio Modificatorio 1	**19/06/2021**
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (COVID)	**13/08/2021**
Fecha Modificada por Inclemencias Climáticas	**16/09/2021**
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (Paro Camioneros)	**01/10/2021**
Fecha Modificada por Convenio Modificatorio 2	**13/10/2021**

Visto y considerando que:

- El informe Técnico adjunto exponе los objetivos y justificaciones del Convenio Modificatorio N° 2
- Existe correspondencia de las justificaciones que hacen a las modificaciones planteadas con lo establecidos en las Cláusulas Contractuales y en las Especificaciones Técnicas.
- El convenio Modificatorio de Obra se encuentra enmarcado en lo establecido en la Ley 2051/03. El porcentaje de ampliación se encuentra dentro del margen establecido.
- Existe correspondencia del Cronograma Físico – Financiero y del Programa de Ejecución con las modificaciones y justificaciones de la obra y con el cronograma Físico – Financiero Vigente.
- Los cálculos aritméticos de las planillas de cantidades y precios unitarios se encuentran correctos.

Por tanto, solicito la Revisión y aprobación del Convenio Modificatorio N° 2, además la orden de ejecución y los trámites correspondientes.

Ing. Jorge Villalba
Supervisor.

47 (cuarenta y siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

D.C.V. Nº 2.335 /2021

COPIA

Asunción, 16 de agosto de 2021

Señores
CONSORCIO CCI.
18 de julio N° 2.350 casi La Esperanza.
Asunción, Paraguay.

PRESENTE:

Ref.: **CONTRATO S.G MINISTRO N° 473/2019 - LOTE 2.**
LLAMADO MOPC N° 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION. ID 365732.

Me dirijo a ustedes en el marco del Contrato mencionado en la referencia, y en respuesta a la nota presentada por la contratista CONSORCIO CCI, a la secretaría de la Dirección de Caminos Vecinales con fecha 13/08/2021, en el cual solicitan una prórroga de plazo de 15 días por eventos de fuerza mayor.

Al respecto, según recomendación de la supervisión, luego de ser analizado el citado pedido, si bien, la obra en sí y los trabajos ejecutados no paralizaron, fueron condicionados en si las provisiones de los distintos materiales (cemento, varillas de hierro, combustible, piedra triturada, arena lavada), necesarios para la correcta ejecución de la obra, por tal motivo, la DCV emite la aprobación de 15 días de prórroga por los impedimentos mencionados en la solicitud de la contratista. Teniendo en cuenta que la fecha de culminación de obras es el 16/09/2021, **con lo cual la nueva fecha de finalización es el 01/10/2021.**

Sin otro particular, me despido atentamente.

ING. RUBEN ANDINO LEZCANO
Director.
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
16/8/21 14:3

46 (cuarenta y seis)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. JORGE VILLALBA, Fiscal de Obra.**

REF.: **Ampliación de plazo por Fuerza Mayor.**
LLAMADO MOPC N° 66/2019. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION. ID 365732 - **CONTRATO S.G MINISTRO N° 473/2019 - LOTE 2.**

FECHA: 16 de agosto de 2021

Elevo a consideración de esta jefatura la propuesta de la **Ampliación de plazo por Fuerza Mayor** al Contrato de la obra de la referencia, con sus correspondientes cronogramas, elaborados para el efecto, en forma conjunta con la Empresa Contratista.

En virtud a las cláusulas de la Condiciones Generales del Contrato:

- **22.1: Prórroga de los Plazos de Ejecución,** "Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de Inclemencias Climáticas."
- **22.2: Prórroga de los Plazos de Ejecución,** "De existir situaciones de Fuerza Mayor o Inclemencias Climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación en los términos del artículo 63 de la Ley De Contrataciones Públicas."
- **23.1 Casos de Fuerza Mayor**, "Para efectos del presente contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes."

Esta propuesta de Ampliación de plazo por Fuerza Mayor, se debe a la huelga de camioneros, luego de ser analizado el citado pedido, si bien, la obra en sí y los trabajos ejecutados no paralizaron, fueron condicionados en si las provisiones de los distintos materiales (cemento, varillas de hierro, combustible, piedra triturada, arena lavada), necesarios para la correcta ejecución de la obra.

43(cuarenta y cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Fortaleza de la gente

Detalles se exponen en el cronograma ya presentado.

Constatada la necesidad de incorporar un nuevo plazo de terminación de obra, la Fiscalización, de manera conjunta con los técnicos de la empresa Contratista, determinaron de acuerdo a los documentos ya presentados que el nuevo plazo modificado para la terminación de la obra es **1/10/2021**.

Orden de Inicio Contractual	02/01/2020
Fecha de Fin Contractual	02/04/2021
Fecha Modificada por Convenio Modificatorio 1	19/06/2021
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (COVID)	13/08/2021
Fecha Modificada por Inclemencias Climáticas	16/09/2021
Fecha Modificada por Fuerza Mayor (Paro Camioneros)	01/10/2021

Atentamente.

ING. JORGE VILLALBA
Fiscal de Obra - MOPC

44(cuarenta y cuatro)

Asunción, 13 de Agosto de 2021

Señor

Ing. Rubén Andino, Director

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Presente

Ref: *LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION – LOTE 2. ID: 365732. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019"*
Asunto: Eventos Compensables por Fuerza Mayor.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 15 días de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato:

- 23.1 **Casos de Fuerza Mayor**, "Para efectos del presente contrato, se considerarán comocausas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes." Esta solicitud de compensación por eventos compensables es a consecuencia del *paro del gremio de transportistas*, que afecto a la libre circulación por las principales rutas del país, ocasionando molestias a toda la ciudadanía.

Sin otro particular hacemos propia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Edgar Ahrens
Representante Legal

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

RECIBIDO
Fecha: 13/08/21 Hora 14:47
Firma.

 43 (cuarenta y tres)

Nacionales (https://npy.com.py/secciones/noticias/nacionales/)

Camioneros inician paro nacional para aumentar precio de fletes

Camioneros iniciaron hoy una protesta solicitando el aumento de las tarifas de los fletes y el cumplimiento de los acuerdos firmados con los agroexportadores. Aseguran que no realizarán cortes de ruta, pero sus camiones estarán varados a la vera de los caminos.

28 julio, 2021 *(https://www.instagram.com/npyoficial)*

Foto: Captura de pantalla - NPY

Ángel Zaracho, representante del sector, explicó que las condiciones de trabajo debido a la suba del combustible, los bajos precios de los fletes y el incumplimiento de los acuerdos con los agroexportadores hace que los camioneros trabajen a pérdida y la situación para ellos ya es insostenible.

El vocero comentó que representantes del Ejecutivo explicaron que nada pueden hacer para sostener el precio de los combustibles debido a la situación internacional, por tanto, los motivos de las protestas van más bien contra los ínfimos precios de fletes y la falta de cumplimiento de acuerdos firmados con el sector agroexportador.

Zaracho refirió que cuentan con un proyecto de Ley para la aplicar la suba a los precios de fletes, sin embargo, lamentó que la iniciativa está varada en el Congreso Nacional desde hace dos meses.

"Están bajando los precios y ya nos es imposible seguir trabajando, es más o menos 1 millón de guaraníes menos por viajes", criticó.

Como medida de presión, los camioneros se colocaran a la vera de las rutas en 40 lugares de todo el país.



Lo más visto Lo último

MEC anuncia aumento en dos plazos e insta a docentes a regresar a clases (https://npy.com.py/2021/10/mec-anuncia-aumento-en-dos-plazos-e-insta-a-docentes-a-regresar-a-clases/)
(https://npy.com.py/2021/10/mec-anuncia-aumento-en-dos-plazos-e-insta-a-docentes-a-regresar-a-clases/) 14 octubre, 2021 |

Accidente de transito deja dos heridos en Asunción (https://npy.com.py/2021/10/accidente-de-transito-deja-dos-heridos-en-asuncion/)
(https://npy.com.py/2021/10/accidente-de-transito-deja-dos-heridos-en-asuncion/) 13 octubre, 2021 |

Salud confirma que vacunarán a adolescentes sanos de 12 a 17 años (https://npy.com.py/2021/10/salud-confirma-que-vacunaran-a-adolescentes-sanos-de-12-a-17-anos/)
(https://npy.com.py/2021/10/salud-confirma-que-vacunaran-a-adolescentes-sanos-de-12-a-17-anos/) 13 octubre, 2021 |

Arrestan a supuesto campana y otro sospecho del cuadruple asesinato en PJC (https://npy.com.py/2021/10/arrestan-a-supuesto-campana-y-otro-sospecho-del-cuadruple-asesinato-en-pjc/)
(https://npy.com.py/2021/10/arrestan-a-supuesto-campana-y-otro-sospecho-del-cuadruple-asesinato-en-pjc/) 13 octubre, 2021 |

Detienen a supuesto asaltante en Zeballos Cué
(https://npy.com.py/2021/10/detienen-a-

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

03(tres) 42(cuarenta y dos)

NACIONALES

Se cumplen 20 días del paro de camioneros y varios gremios de productores exigen "libre tránsito"

Hoy se cumplen 20 días desde el paro de los camioneros en todo el país y varios gremios del sector productivo una vez más pidieron que los "piqueteros" garanticen el libre tránsito en las rutas nacionales. Varios camiones de gran porte siguen instalados en la Costanera de Asunción, para exigir la aprobación de la "ley de fletes".

POR ABC COLOR
16 DE AGOSTO DE 2021 - 01:00

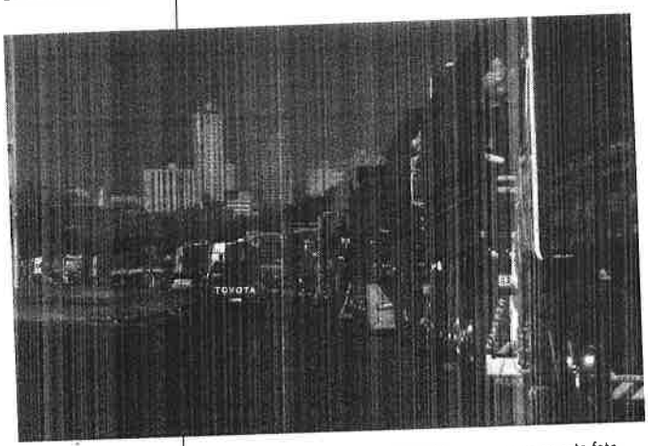

Los camioneros siguen apostados en la Costanera de Asunción, como se ve en esta foto

Durante el fin de semana no se registraron mayores inconvenientes en las rutas, pero siguen pidiendo que la Policía Nacional haga respetar el derecho de terceros. "El libre tránsito aún no está garantizado, circulamos a medias. Además, pasamos los retenes con custodia policial, cosa que no es fácil ni dinámica, muy complicada la situación", manifestó el titular de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), Erno Becker.

Al mismo tiempo, dijo que la inseguridad en las rutas persiste. "En Colonias Unidas, por ejemplo, una patrullera y otra camioneta pisaron clavos miguelito. Apelamos a una solución definitiva del tema camionero, que más que camionero es un tema de trasfondo político", sostuvo.

Lea más: Policía libera a camioneros retenidos contra su voluntad en Salto

41 (cuarenta y cua

2 (dos)

Asimismo dijo que el sector no se conforma con el decreto del Ejecutivo que crea el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga, por lo que seguirán insistiendo por la ley de fletes. "El temor de mis compañeros es que el decreto se trate como inconstitucional, por eso insistimos en que haya una ley y estamos atentos", había señalado.

Por otro lado, resaltó que del proyecto de "ley de fletes" ya se eliminó el punto donde se establecía el porcentaje de utilidad (25%), para que no se ataque como inconstitucional. "Según nuestros asesores todo el proyecto ley ya está en forma como para que se apruebe. Lo que hará esta ley es marcar un parámetro para que se pueda determinar si hay alguna distorsión en el mercado y ver quienes son los responsables de esa distorsión", añadió.

No te pierdas las últimas noticias nacionales

Suscribite a nuestro newsletter para recibir diariamente las noticias más importantes en tu correo.

CAMIONEROS *PARO* *LEY DE FLETES*

INGRESAR

01(uno) 40(cuarenta)

se reactiven las obras que se ven afectadas por la falta de insumos. Insistió que el país está tratando de salir de una recesión económica y que con estos conflictos la crisis va a durar "más tiempo de lo que la gente imagina".

Lea más: Senado ningunea a camioneros y éstos amenazan con parar por dos meses más

Insisten en una ley

El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, había señalado que están en condiciones de seguir con el paro, inclusive por dos meses más, si los legisladores siguen dilatando la "ley de fletes". Sin embargo, ayer se mantuvo en silencio y no comentó sobre las actividades que estarán realizando durante la semana.

Zaracho había criticado a los legisladores que, a su criterio, no están dimensionando el impacto económico de las movilizaciones del sector. "La situación ya es crítica, económicamente hablando. Les pedimos que urgentemente traten esto. Si bien se aprobó en general, no entendemos la demora de que se remita a comisiones, hay muchas cuestiones políticas. Esperemos que se pueda llegar a un consenso. El paro ya está generando efectos colaterales y merece atención urgente", aseveró.

39(treinta y nueve)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

COPIA

Asunción, 13 de agosto de 2021

D.C.V. Nº 2246/2021

Señores:

Consorcio CCI

Presente

Ref.: Llamado MOPC N.º 66/2019. "Licitación Pública Nacional para Obra de Mejoramiento en zonas criticas de caminos en el Departamentos de Concepción" – Lote N° 1. **Contrato Ministro S.G. N° 473/2019. ID. 365.732**
Asunto: Aprobación de prórroga de plazo por lluvia.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a vuestra nota con MEU EXPEDIENTE N° 33033/2021 de fecha 12 de agosto de 2021, a través de la cual se solicita prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido entre los meses de enero de 2020 hasta julio de 2021. Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 12 de agosto de 2021, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula N° 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 34 (treinta y cuatro) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 34 (treinta y cuatro) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo de los meses enero de 2020 hasta julio de 2021, a contar a partir de la fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado en la Causas de Fuerza Mayor, donde la nueva fecha de terminación queda establecida el **16 de setiembre de 2021**.

Atentamente.

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

RECIBIDO
Fecha: 05/10/21 Hora: 11:34
Firma:

MOPyC
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales

38(treinta y ocho)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM

A	:	**Ing. Osvaldo López,** Jefe **Departamento de Ejecución – DCV**
DE	:	**Ing. Jorge Villalba,** Supervisor de Obra
FECHA	:	12 de agosto de 2021.
REFERENCIA	:	Llamado MOPC N.º 66/2019. "Licitación Pública Nacional para Obra de Mejoramiento en zonas criticas de caminos en el Departamentos de Concepción" – Lote N° 2. **Contrato Ministro S.G. N° 473/2019. ID. 365.732**
Asunto	:	**Aprobación de prórroga por lluvia.**

Me dirijo a usted en relación a la Nota con MEU N° 33033/2021 de fecha 12 de agosto de 2021 remitida por al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones referente a la solicitud de prórroga por lluvia y sus consecuencias del contrato de la referencia, solicitada por el Consorcio CCI.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, el Contratista presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de enero 2020 a Julio 2021 y en base a estos solicita una ampliación adicional de 34 (treinta y cuatro) días del plazo contractual.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 34 (treinta y cuatro) días por lluvias y humedad excesiva.

Prórroga de Plazo

Fecha de terminación de obras de acuerdo al plazo de 15 meses del Contrato.	**Prórroga por CM N° 1**	**Nueva fecha corregida por CM N° 1**
27/03/2021	2,55 meses	19/06/2021
	Prorroga por causas de fuerza mayor	**Nueva fecha corregida por Causas de Fuerza mayor**
	55	13/08/2021
	Prorroga por lluvia	**Nueva fecha corregida por Lluvia**
	34 días	16/09/2021

	LPN 66/2019 Lote 2-CCI					
	2019		2020		2021	
	Dias de Lluvias	Corresponde	Dias de Lluvias	Corresponde	Dias de Lluvias	Corresponde
Enero	0	0	5	5	18	10
Febrero	0	0	4	4	5	0
Marzo	0	0	4	0	7	0
Abril	0	0	1	0	12	4
Mayo	0	0	6	0	6	0
Junio	0	0	8	0	6	0
Julio	0	0	0	0		
Agosto	0	0	9	1		
Septiembre	0	0	6	0		
Octubre	0	0	12	4		
Noviembre	0	0	9	1		
Diciembre	0	0	13	5		
		0		20		14

Total días 34

En atención a lo señalado más arriba, esta supervisión sugiere otorgar prórroga por 77 (treinta) días a partir del 29/07/2021, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es **el 16 de septiembre de 2021**.

Ing. Jorge Villalba

Supervisor

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	B	B	B	B	30	H	20	15	H	B	B	B	80	H	B	B	35	H	B	15	45	15	15	80	30	B	50	35	H	B	B	13	5	18	13
	Feb	B	B	B	35	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	35	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				4	1	5	23
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	10	B	20	B	B	90	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	3	7	24
	Abr	B	B	B	35	H	B	B	B	B	B	50	H	10	H	20	H	B	90	H	B	B	B	B	70	H	B	B	B	B	B			6	6	12	18
	May	B	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	B	2	1	3	28
	Jun	B	B	B	B	B	90	20	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	20	B	B	B	B	B	B	15	B	B		5	1	6	24
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0

ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CCI.

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ING. JORGE MARCEL VILLALBA RUIZ DIAZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

36 (treinta y seis)

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

Certificado de Trabajo Nº: 18 - Junio/2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Ene		B	B	B	B	23.2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	79	B	B	19.1	10.2	B	B	B	B	B	B	85.6	B	B	5	0	5	25
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	50	H	B	B	B	B	25	B	B	B			3	1	4	25
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	65	H	B	B	B	B	B	B	B	B	30	B	B	B	3	1	4	27
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	105	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	0	1	29
	May	B	B	B	B	B	50	B	B	B	B	B	55	H	H	B	B	B	B	B	B	B	40	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	3	6	25
	Jun	B	30	H	20	30	20	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	70	H	B	B	B		6	2	8	22
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	38	15	5	40	120	30	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	6	3	9	22
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	26	H	15	H	H	B	B	B	10	B	B	B		3	3	6	24
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	20	H	B	B	B	15	H	20	H	B	B	B	B	40	H	100	H	H	B	6	6	12	19
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	45	100	30	H	H	B	25	45	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		6	3	9	21
	Dic	B	B	50	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	50	25	20	20	H	B	B	7	B	B	B	B	B	B	B	22	10	15	10	3	13	18

ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CCI.

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ING. JORGE MARCEL VILLALBA RUIZ DIAZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

35 (treinta y cinco)

34 (treinta y cuatro)
04 (CUATRO)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000002

PARA:

DE:

FECHA: 31/01/2020

ASUNTO:

Se inician los trabajos de Mantizacion y Limpieza en zona de Obra. Las actividades se realizan segun lo previsto. —

Los dias de lluvia con sus consecuencias se detallan a continuacion:

Lunes 6/01 = 23,2 mm
Sabado 18/01 = 79 mm
Martes 21/01 = 19,1 mm
Miercoles 22/01 = 10,2 mm
Miercoles 29/01 = 85,6 mm

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Walter Molinas

Firma de la Contratista

Ing. C.C.I.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Ros

33 (treinta y tres)
05 (cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000004

PARA:

DE:

FECHA: 29/02/2020

ASUNTO:

Las Actividades se realizaron con normalidad, Ajustandose al cronograma de avance previsto, se realizaron los sgts. trabajos: Movilizacion, Desbroce, exc. de bolsones y zanjas de drenaje, Terraplenes.

Las lluvias presentados fueron los sgts.=

Miercoles 19/02 = 25 mm
Jueves 20/02 = 50 mm
Viernes 21/02 = Humedad
Miercoles 26/02 = 25 mm

Se realizaron trabajos de revision y verificacion del Proyecto.

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Walter Molinas

Firma de la Contratista

Ing. Edgardo Amieva
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

32 (treinta y dos)
06/2020

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000006

PARA:

DE:

FECHA: 31/03/20

ASUNTO:

los trabajos se realizan con normalidad, sin inconvenientes.

Se realizan trabajos de Movimiento de Suelo presentandose un avance total acumulado de 6,67 %, por encima del 4,9 % proyectado.

Los dias de lluvia presentes en el mes fueron =

Martes 17/03 = 10 mm

Jueves 19/03 = 65 mm

Viernes 20/03 = Mojado

Sabado 28/03 = 30 mm

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Matías Molinas

Firma de la Contratista

Ing. Edgar O. Amarilla
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 719 c/ Tacuary - Tel. 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Res

31 (treinta y uno)
07/2020

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000008

PARA:

DE: **FECHA:** 30/04/20

ASUNTO:

Las Actividades se desarrollan con normalidad presentándose buen clima a lo largo del periodo de certificación se continuan los trabajos de Mov. de suelo con un avance de obra de 10,38 %. La lluvia estuvo presente en el día Lunes 13 de Abril con 105 mm caídos.

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Walter Molinas

Ing. Edgar O. Ahrens J.
Representante Legal

Ing. Walter ...

... 40 mm

Sábado 23/05 = Humedad

30 (treinta)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000012

PARA:

DE: **FECHA:** 30/06/2020

ASUNTO:

Las Actividades se desarrollan sin atrasos con avances en todos los rubros de mov de suelo, ripio y Obras de Arte.

Las lluvias afectaron los días sgts =

- Martes 2/06 = 30 mm
- Miercoles 3/06 = Humedad
- Jueves 4/06 = 20 mm
- Viernes 5/06 = 30 mm
- Sábado 6/06 = 20 mm
- Sábado 13/06 = 20 mm
- Viernes 26/06 = 70 mm
- Sábado 27/06 = Humedad

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista

Ing. Edgar O. [illegible]
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

29 (veintinueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000010

PARA:

DE:

FECHA: 29/05/2020

ASUNTO:

Las Actividades en ambos frentes se desarrollan con normalidad segun lo planeado. Se realizan actividades de Mov de suelo y Obras de Arte.

El avance ejecutado Acumulado es de 14,75 % vs el proyectado de 11,19 %.

Dentro del Periodo de certificacion se tuvieron lluvias en los Sgts. dias =

Miercoles 6/05 = 50 mm

Martes 12/05 = 55 mm

Miércoles 13/05 y Jueves 14/05 = Humedad

Viernes 22/05 = 40 mm

Sábado 23/05 = Humedad

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Firma de la Contratista

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolivar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

Ing. Edgar O. Ahrens
Representante Legal

Ing. Walter Molinas

28 (veintiocho)
(p/ Dia)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000016

PARA:

DE: **FECHA:** 31/09/2020

ASUNTO:

Continúa con normalidad el desarrollo de la Obra en ambos frentes de trabajo, la curva de avance ejecutada se registra por encima de la proyectada.

Las lluvias presentes del mes de Agosto son como sigue =

- Sabado 15/07 = 38 mm
- Domingo 16/07 = 15 mm
- Lunes 17/07 = 5 mm
- Martes 18/08 = 40 mm
- Miercoles 19/08 = 120 mm
- Jueves 20/08 = 30 mm
- Viernes 21, Sabado 22 y Dom. 23/09 = Humedo.

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar O. Ahrens S.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 579 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar

27 (veintisiete)

U (obra)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000018

PARA:

DE:

FECHA: 30/09/2020

ASUNTO:

El desarrollo de la Obra continua con normalidad con movimiento en ambos frentes de trabajo.
Se presenta un avance acumulado ejecutado de 45,56 %, por encima del proyectado (37,72 %).
Las lluvias afectaron a la obra en los sgte. días =

- Sabado 19/09 = 26 mm
- Domingo 20/09 = Humedad
- Lunes 21/09 = 15 mm
- Martes 22/09 = Humedad
- Miercolis 23/09 = Humedad
- Domingo 27/09 = 10 mm

CONSORCIO CCI
RUC: 80009205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar C. Arrúa J.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2C20

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MB - Servicios

Ing. Walter Ramos

26 (veintiséis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000020

PARA:

DE:

FECHA: 01/11/2020

ASUNTO:

El desarrollo de las actividades en ambos frentes de trabajo se realizan con normalidad, con un avance semejante al previsto programado. Se desarrollan las Obras de corte, mov. de suelo y enripiado.

Las lluvias ocasionaron una afectacion en los Sgts. días =

Lunes 12/10/20 = 20 mm
Martes 13/10/20 = 20 mm
Miercoles 14/10/20 = Humedad
Domingo 18/10/20 = 15 mm
Lunes 19/10/20 = Humedad
Martes 20/10/20 = 20 mm
Miercoles 21/10/20 = Humedad
Lunes 26/10/20 = 40 mm
Martes 27/10/20 = Humedad
Miercoles 28/10/20 = 100 mm
Jueves 29/10/20 = Humedad
Viernes 30/10/20 = Humedad

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma del Contratista

Representante Legal

Ing. Walter

25 (veinticinco)
13 (trece)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000024

PARA:

DE: FECHA: 28/11/2020

ASUNTO:

Los trabajos se realizan con normalidad cumpliendo los protocolos establecidos por el MOPC p/ COVID 19 y de seguridad y ambiente.
Continúan las obras de mov. suelo, enripiado y obras de arte en ambos frentes.
Las lluvias tuvieron afectación en los sgts. días =

Martes 10/11 = 60 mm
Miércoles 11/11 = 45 mm
Jueves 12/11 = 100 mm
Viernes 13/11 = 30 mm
Sábado 14/11 = Humedad
Domingo 15/11 = Humedad
Martes 17/11 = 25 mm
Miércoles 18/11 = 45 mm
Jueves 19/11 = Humedad

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fisca. de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar O. Ahrens E.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020
ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345

24 (veinticuatro)
14 / CATORCE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

CONSORCIO C.C.I.

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 473/2019 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE N° 2 - TRAMO: ESTANCIA SAN RAFAEL (KM) 42 J. F. LÓPEZ (PUENTESIÑO)

LIBRO DE OBRA Nº 0000027

PARA:

DE: FECHA: 31/12/2020

ASUNTO:

LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON NORMALIDAD CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MOPC C/ COVID 19 Y DE SEGURIDAD Y AMBIENTE. CONTINUAN LAS OBRAS DE MOV. DE SUELO, ENRIPIADO Y OBRAS DE ARTE EN AMBOS FRENTES.

LAS LLUVIAS TUVIERON AFECTACION EN LOS SGTS. DIAS:

JUEVES 03/12 - 50 MM
VIERNES 04/12 - 35 MM
SABADO 05/12 - HUMEDAD
DOMINGO 06/12 - HUMEDAD
LUNES 14/12 - 50 MM
MARTES 15/12 - 25 MM
MIERCOLES 16/12 - 20 MM
JUEVES 17/12 - 20 MM
VIERNES 18/12 - HUMEDAD
LUNES 21/12 - 7 MM
MARTES 29/12 - 22 MM
MIERCOLES 30/12 - 10 MM
JUEVES 31/12 - 15 MM

CONSORCIO CCI
RUC: 80109205-1

ANEXO:

Firma de la Fiscalización
Ing. Civil Jorge M. Villalba R.D.
Fiscal de Obras

Firma de la Contratista
Ing. Edgar G. Ahrens E.
Representante Legal

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary - Tel.: 490 345 - 10 Block 50 x 3 del 00001 al 00500 - II/2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Celeste - TRIPLICADO: Rosa

MB - Servicios Gráficos - Simón Bolívar
