ANEXO 2

CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCIERO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

T&C Ingenieros de Topografía y Caminos S. A.

Obra : PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 1RA. TANDA - LOTE 2
ANEXO 2 - Cronograma Físico Financiero

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CM N° 01	Precio Unitario	Precio Total	Mes 1 ago-19	Mes 2 sept-19	Mes 3 oct-19	Mes 4 nov-19	Mes 5 dic-19	Mes 6 ene-20	Mes 7 feb-20	Mes 8 mar-20	Mes 9 abr-20	Convenio Modificatorio Nº01 Mes 10 may-20	Mes 11 jun-20	Mes 12 jul-20	Mes 13 ago-20	Mes 14 sept-20
PAVIMENTO																			
1	Bacheo de Empedrado Existente	m²	1.004,00	76.360	76.665.440														
2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	m³	5.521,00	211.425	1.167.277.425														
3	Regularización de Subrasante en Banquina	m²	70.380,00	8.098	569.937.240														
4	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	m³	9.792,00	247.835	2.426.800.320														
5	Riego de Imprimación	lt	78.336,00	12.618	988.443.648														
6	Riego de Liga	lt	122.209,00	8.966	1.095.725.894														
7	Regularización con CºAº	Ton	12.221,00	433.693	5.300.162.153														
8	Carpeta de CºAº	m³	9.089,92	1.167.276	10.610.445.458														
OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
9	Pórticos de Señalización	un	1,00	53.080.000	53.080.000														
10	Señalización Horizontal	m²	6.366,24	116.245	740.043.569														
11	Tachas Reflectivas	un	7.073,60	25.213	178.346.677														
12	Tachones Reflectivos	un	354,00	76.289	27.006.306														
13	Señalización Vertical	m²	31,84	1.689.271	53.786.389														
14	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	ml	1.200,00	353.944	424.732.800														
15	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	m³	15,00	3.702.518	55.537.770														
16	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	ml	2.000,00	87.314	174.628.000														
17	Revestimiento Vegetal con Tepes	m²	7.073,60	7.299	51.630.206														
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS																			
18	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	12,00	17.810.857	213.730.284														
MOVILIZACIÓN																			
19	Movilización	gl	1,00	618.631.000	618.631.000														
Avance Mensual Programado - Contractual						1,58%	2,02%	2,27%	3,57%	5,05%	6,86%	13,08%	19,05%	15,82%	12,59%	14,98%	3,12%		
Avance Mensual Programado Acumulado - Contractual						1,58%	3,60%	5,87%	9,44%	14,49%	21,35%	34,43%	53,48%	69,30%	81,89%	96,87%	100,00%		
Avance Mensual Programado - Convenio Modificatorio N° 01						1,58%	2,72%	2,77%	2,94%	6,90%	7,73%	14,17%	14,27%	15,26%	15,76%	13,12%	10,20%	10,30%	2,26%
Avance Mensual Programado Acumulado - Convenio Modificatorio N° 01						1,58%	4,30%	7,07%	10,01%	16,91%	24,64%	38,81%	53,08%	68,34%	84,10%	97,22%	107,42%	117,71%	119,97%

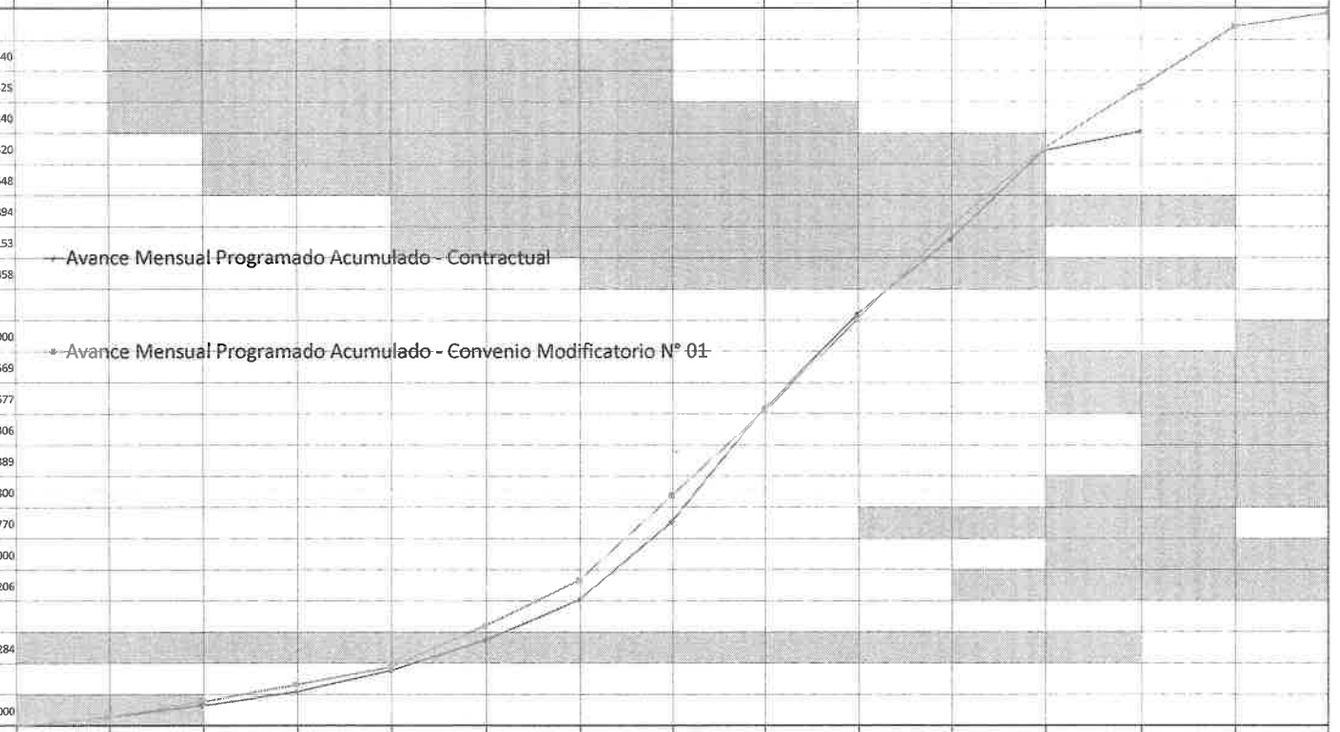

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)
