46 (cincuenta)

**LLAMADO MOPC Nº 01/2021 - ID-491.919**
**Obra:** SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES 7 REGIÓN ORIENTAL
**Contratista** CONSORCI ICE
**Fiscalizador** CONSORCIO FUTURE ATP & ASOCIADOS
**Supervisor** MOPC
**Fecha :** 31/1/2025

**TRAMO 10 - LOTE 2 – 42.87 km**
**Voladam - San Pablo ( hasta la cabecera sur del puente sobre el río Jejui y mejora del acceso a San Pablo)**

| Item | Descripción del Item | UNIDAD | CANT. | Precio con Iva en Gs Unitario | Precio con Iva en Gs Total | Incid. (%) | Plazo | Incid. Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ETAPA DE HABILITACION | | | | | | | |
| 1.1 | Desbroque, Desbroce y Limpieza | Ha | 164,57 | 3.480.834 | 644.118.661 | 0,37% | 24 | 0,02% |
| 1.2 | Remoción de Estructuras existentes | gl | 1,00 | 19.146.908 | 19.146.905 | 0,01% | 13 | 0,00% |
| 1.3 | Excavación no Clasificada | m3 | 94.568,00 | 19.144 | 1.816.332.640 | 1,04% | 26 | 0,04% |
| 1.4 | Excavación de Bolsones | m3 | 91.294,22 | 20.341 | 1.653.605.932 | 0,95% | 26 | 0,04% |
| 1.5 | Excavación de Zanjas de Drenaje | m3 | 5.428,39 | 20.341 | 110.418.881 | 0,06% | 13 | 0,00% |
| 1.6 | Terraplen | m3 | 1.129.831,06 | 32.586 | 36.784.088.921 | 21,11% | 39 | 0,54% |
| 2 | Paquete Estructural | | | | | | | |
| 2.1 | Subrasante mejorada CBR>15% | m3 | 29.635,75 | 38.812 | 1.152.047.815 | 0,66% | 16 | 0,04% |
| 2.1A | Subrasante mejorada CBR>25% (Nuevo Item) | m3 | 142.893,16 | 58.205 | 8.036.368.808 | 4,61% | 30 | 0,15% |
| 2.2 | Subbase Granular CBR ≥ 80% | m3 | 96.736,44 | 216.325 | 21.119.764.834 | 12,12% | 29 | 0,42% |
| 2.3 | Base Granular Estabilizada 60/10 (CBR>100%) | m3 | 82.874,46 | 247.089 | 20.477.364.979 | 11,75% | 17 | 0,69% |
| 2.4 | Base Asfáltica | m3 | 19.138,27 | 1.324.679 | 25.350.150.936 | 14,55% | 12 | 1,21% |
| 2.5 | Carpeta de Concreto Asfáltico c/Polímero | m3 | 15.768,64 | 1.416.679 | 22.338.267.769 | 12,82% | 7 | 1,83% |
| 2.6 | Riego de liga | m2 | 606.000,00 | 4.149 | 2.513.505.000 | 1,08% | 12 | 0,14% |
| 2.7 | Imprimación Asfáltica | m2 | 480.000,00 | 12.475 | 5.988.000.000 | 3,44% | 17 | 0,20% |
| 2.8 | Tratamiento Superficial Doble | m2 | 16.990,00 | 29.493 | 501.069.080 | 0,29% | 8 | 0,05% |
| 2.9 | Mampostería de Piedra Bruta | m3 | 2.880,00 | 307.289 | 837.418.920 | 0,48% | 8 | 0,08% |
| 2.10 | Regularización sobre empedrado existente - Tasa 80kg/m2 | Ton | 1.305,92 | 235.446 | 307.473.640 | 0,18% | 7 | 0,02% |
| 2.11 | Reparación de empedrado existente | m2 | 5.170,00 | 56.146 | 290.274.620 | 0,17% | 8 | 0,02% |
| 2.12 | Losa de H°A° | m3 | 75,00 | 2.014.515 | 152.297.334 | 0,09% | 8 | 0,01% |
| 2.13 | Protección con Gaviones | m3 | 480,00 | 913.026 | 438.242.880 | 0,25% | 5 | 0,05% |
| 2.14 | Colchon Reno | m2 | 1.920,00 | 470.675 | 903.696.000 | 0,52% | 5 | 0,10% |
| 3 | Alcantarillas | | | | | | | |
| 3.1 | Alcantarillas Tubulares | | | | | | | |
| 3.1.1 | Alcantarilla Tubular Simple de Ø = 80cm | m | 16,00 | 1.252.373 | 20.037.968 | 0,01% | 18 | 0,00% |
| 3.1.2 | Alcantarilla Tubular Simple de Ø = 100cm | m | 240,00 | 1.674.784 | 401.948.160 | 0,23% | 6 | 0,04% |
| 3.1.6 | Cabezales para alcantarillas tubulares | m3 | 292,70 | 1.940.021 | 568.643.517 | 0,29% | 13 | 0,02% |
| 3.2 | Alcantarillas Celulares | | | | | | | |
| 3.2.2 | Alcantarilla Celular Simple de 1.20x1.20m | m | 123,00 | 2.039.338 | 250.838.574 | 0,14% | 32 | 0,02% |
| 3.2.3 | Alcantarilla Celular Simple de 1.30x1.50m | m | 225,00 | 3.012.843 | 677.889.675 | 0,39% | 32 | 0,01% |
| 3.2.4 | Alcantarilla Celular Simple de 2.00x2.00m | m | 94,00 | 3.479.641 | 326.904.254 | 0,19% | 32 | 0,01% |
| 3.2.5 | Alcantarilla Celular Doble de 1.20x1.20m | m | 154,00 | 3.606.480 | 555.357.920 | 0,32% | 32 | 0,01% |
| 3.2.6 | Alcantarilla Celular Doble de 1.30x1.50m | m | 373,00 | 5.115.105 | 1.907.934.165 | 1,10% | 32 | 0,03% |
| 3.2.7 | Alcantarilla Celular Doble de 2.00x2.00m | m | 86,00 | 6.908.751 | 594.152.586 | 0,34% | 32 | 0,01% |
| 3.2.8 | Alcantarilla Celular Doble de 2.50x3.00m | m | 16,00 | 9.075.881 | 145.365.456 | 0,08% | 32 | 0,00% |
| 3.2.10 | Alcantarilla Celular Triple de 1.20x1.20m | m | 63,00 | 6.910.702 | 435.378.006 | 0,25% | 32 | 0,01% |
| 3.2.11 | Alcantarilla Celular Triple de 1.30x1.50m | m | 269,00 | 9.477.102 | 2.549.340.438 | 1,46% | 32 | 0,05% |
| 3.2.12 | Alcantarilla Celular Triple de 2.00x2.00m | m | 310,00 | 12.033.280 | 3.727.217.730 | 2,14% | 32 | 0,07% |
| 3.2.16 | Cabezales para Alcantarillas Celulares | m3 | 1.659,19 | 2.247.937 | 3.729.754.891 | 2,14% | 32 | 0,07% |
| 3.2.16 | Alcantarilla Celular Simple de 2.50 x 2.50m para pasa ganado (Item nuevo) | m | 82,00 | 7.855.943 | 644.187.326 | 0,37% | 8 | 0,05% |
| 3.2.17 | Alcantarilla Celular simple de 1.50 x 0.80m (Item nuevo) | m | 14,00 | 3.604.845 | 50.467.760 | 0,03% | 8 | 0,00% |
| 3.2.18 | Alcantarilla Celular doble de 1.50 x 0.80m (Item nuevo) | m | 17,00 | 4.845.889 | 82.354.833 | 0,05% | 8 | 0,01% |
| 3.2.19 | Alcantarilla Celular cuadruple de 1.50 x 1.50m (Item nuevo) | m | 20,00 | 13.100.967 | 262.019.340 | 0,15% | 8 | 0,02% |
| 3.2.20 | Alcantarilla Celular quintuple de 1.50 x 0.80m (Item nuevo) | m | 17,00 | 12.090.553 | 205.539.401 | 0,12% | 8 | 0,01% |
| 3.2.21 | Ampliación Alcantarilla Celular Simple de 1.50 x 1.50m (Item nuevo) | m | 28,13 | 3.580.048 | 100.689.349 | 0,06% | 8 | 0,01% |
| 3.2.22 | Ampliación Alcantarilla Celular Doble de 1.50 x 1.50m (Item nuevo) | m | 8,50 | 6.917.538 | 58.804.738 | 0,03% | 8 | 0,00% |
| 3.2.23 | Ampliación Alcantarilla Celular Doble de 2.00 x 2.00m (Item nuevo) | m | 18,00 | 9.404.075 | 169.693.350 | 0,10% | 8 | 0,01% |
| 3.2.24 | Ampliación Alcantarilla Celular Doble de 2.50 x 3.00m (Item nuevo) | m | 11,00 | 13.127.540 | 144.403.795 | 0,08% | 8 | 0,01% |
| 4 | Obras Complementarias | | | | | | | |
| 4.1 | Tratado de Alambrado | m | 62.590,00 | 24.146 | 1.510.515.950 | 0,87% | 35 | 0,02% |
| 4.2 | Alambrado | m | 3.000,00 | 26.913 | 80.739.000 | 0,05% | 2 | 0,03% |
| 4.3 | Cordón de hormigón | m | 364,71 | 57.885 | 20.145.641 | 0,01% | 5 | 0,00% |
| 4.4 | Cordón Cunetá de hormigón | m | 800,00 | 138.074 | 69.644.400 | 0,05% | 5 | 0,01% |
| 4.5 | Señalización Vertical | m2 | 492,51 | 1.352.081 | 666.344.993 | 0,37% | 8 | 0,05% |
| 4.6 | Señalización Horizontal | m2 | 15.705,26 | 40.681 | 638.906.582 | 0,37% | 8 | 0,05% |
| 4.7 | Tacha Reflectarias | u | 11.044,00 | 25.246 | 278.816.824 | 0,16% | 8 | 0,02% |
| 4.8 | Hitos Kilometricos | u | 56,00 | 897.380 | 50.253.618 | 0,03% | 8 | 0,00% |
| 4.9 | Empastado de Taludes | m2 | 162.000,00 | 6.308 | 1.021.612.200 | 0,59% | 8 | 0,07% |
| 4.10 | Barandas Metálicas de Contención vehicular para suelo | m | 28.236,40 | 217.019 | 7.324.314.892 | 4,19% | 16 | 0,26% |
| 4.11 | Drenaje longitudinal profundo | m | 400,00 | 389.485 | 155.794.000 | 0,09% | 8 | 0,02% |
| 4.12 | Cuneta revestida de hormigon | m3 | 1.612,00 | 786.160 | 1.267.669.920 | 0,73% | 28 | 0,03% |
| 4.13 | Protección forestal de plantaciones | u | 15,00 | 22.807.462 | 342.111.930 | 0,20% | 13 | 0,02% |
| 4.14 | Dársenas de Estacionamiento | ud | 13,00 | 25.173.645 | 251.736.450 | 0,14% | 7 | 0,02% |
| 4.15 | Accesos a Fincas | ud | 10,00 | 9.546.862 | 95.468.620 | 0,05% | 6 | 0,01% |
| 4.16 | Iluminación en intersecciones | u | 7,00 | 5.623.616 | 39.365.312 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 4.17 | Mudanzas de columnas y líneas de AIDE | u | 173,00 | 2.907.529 | 503.002.617 | 0,29% | 33 | 0,01% |
| 4.18 | Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana Ø40mm (Accesorios | m | 4.600,00 | 56.390 | 259.394.000 | 0,15% | 5 | 0,02% |
| 4.19 | Regularización de Hormigón en Tablero de Puentes existentes (Nuevo Item) | m3 | 33,46 | 2.147.797 | 71.907.900 | 0,04% | 5 | 0,01% |
| 4.20 | Obras complementarias y elementos de protección ambiental para pasa fauna (Nuevo | u | 3,00 | 13.455.297 | 40.365.891 | 0,02% | 7 | 0,00% |
| 4.21 | Edificaciones de pasafauna con tapa de asentos 1P14 malla 2"x 2"ambodal y postes de 4"x4"h=1.80 con Sonda | m2 | 792,00 | 76.499 | 60.515.928 | 0,03% | 7 | 0,00% |
| 4.22 | Provisión y plantación de plantines de especies nativas dentro de ensanchamientos de pasa fauna (Nuevo Item) | u | 264,00 | 32.595 | 8.586.600 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4.23 | Provisión e instalación de junta para puente semiintegro 1P40 JN4 02 Incluya tapaco, mastic de asfalto y cordon | m | 80,00 | 3.758.846 | 300.707.680 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| 5 | Movilización | | | | | | | |
| 5 | Movilización | gl | 1,00 | 4.926.048.138 | 4.926.048.138 | 2,83% | 2 | 1,41% |
| 6 | Mitigación Ambiental | | | | | | | |
| 6 | Mitigación Ambiental | gl | 1,00 | 501.339.369 | 501.339.369 | 0,29% | 40 | 0,01% |
| I | OTROS | | | | | | | |
| 7 | Suministros del Contratista/Servicios Especializados | | | | | | | |
| 7.1 | Suministros para el control de exceso de carga | u | 1,00 | 1.648.286.027 | 1.648.286.027 | 0,95% | 9 | 0,11% |
| 7.2 | Suministro a la supervisor/Oficina y Alojamiento | mes | 30,00 | 40.693.738 | 1.220.512.140 | 0,70% | 40 | 0,02% |
| 8 | Estrategia de Comunicación Masiva | | 30,00 | 104.097.300 | 3.122.919.900 | 1,79% | 40 | 0,04% |
| 8.1 | Estrategia de Comunicación Masiva | | | | | | | |
| | | | | | 195.818.871.336 | 112,39% | | |

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO- PRORROGA POR FALTA DE LIBERACION DE FRANJA/ May/2025

| Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/8/2022 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 |
| 1.1 | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 1.2 | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 1.4 | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.5 | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.6 | | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,01% | 0,08% | 0,14% |
| 2.1A | | | | | | | | | | | | | | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04% | 0,08% |
| 3.1.2 | | | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 3.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.3 | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 3.2.4 | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 3.2.5 | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 3.2.6 | | | | | | | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| 3.2.7 | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 3.2.8 | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2.10 | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 3.2.11 | | | | | | | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| 3.2.12 | | | | | | | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| 3.2.16 | | | | | | | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| 3.2.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.17 | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 4.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | 14/12/2025 |
| 1.1 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,11% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,71% |
| 2.1A | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,85% |
| 2.2 | | | | | | | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,85% |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,22% |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,22% |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 1,91% | 2,11% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% |
| 2.6 | | | | | | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| 2.7 | | | | | | | | | | | | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| 2.8 | | | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 2.9 | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | |
| 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
| 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 3.2.3 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.4 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.5 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.6 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | | | | |
| 3.2.7 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 3.2.10 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.11 | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | | | | |
| 3.2.12 | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | | | | |
| 3.2.16 | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | | | | |
| 3.2.16 | | | | | | | | | | | | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | | | | |
| 3.2.17 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 3.2.18 | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.19 | | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | | | | |
| 3.2.20 | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.21 | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.22 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 3.2.23 | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 3.2.24 | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | | |
| 4 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | |
| 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4.7 | | | | | | | | | | | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | | | | |
| 4.8 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | | | | |
| 4.9 | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | | | | | | | | |
| 4.10 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | | | |
| 4.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | | | | |
| 4.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14 | | | | | | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | |
| 4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.17 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | | |
| 4.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | | | |
| 4.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4

28 l quince

**LLAMADO MOPC Nº 91/2021 - ID 401.919**
**Obra:** SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES ? REGIÓN ORIENTAL
**Contratista** CONSORCI ICE
**Fiscalizado:** CONSORCIO FUTURE ATP & ASOCIADOS
**Supervisión** MOPC
**Fecha :** 31/1/2025

**TRAMO 1B - LOTE 2 – 42.87 km**
**Volendam - San Pablo ( hasta la cabecera sur del puente sobre el río Jejuí y mejora del acceso a San Pablo)**

| Item | Descripción del Item | UNIDAD | CANT. | Precio con Iva en Gs Unitario | Precio con Iva en Gs Total | Incid. (%) | Plazo | Incid. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ETAPA DE HABILITACION | | | | | | | |

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO- PRORROGA POR FALTA DE LIBERACION DE FRANJA/ Mayo/2025

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17/6/2022 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 |
| MESES | 2.528.69.077 | 5.524.469.125 | 6.420.248.774 | 7.876.265.706 | 9.600.956.693 | 12.379.506.992 | 15.752.843.615 | 19.753.136.724 | 24.511.097.796 | 29.415.980.600 | 35.095.978.269 | 41.473.861.002 | 48.964.200.273 | 56.200.348.559 | 62.491.668.602 | 70.889.794.623 | 80.462.202.383 | 100.671.555.326 | 114.312.264.624 | 127.717.235.950 | 141.697.930.562 | 156.255.022.563 | 170.062.695.809 | 174.271.238.303 | | | | | | |
| | CONVENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance Mensual % | 0,00% | 1,47% | 1,61% | 0,19% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,51% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,65% | 0,69% | 0,66% | 0,92% | 0,98% | 0,96% | 0,99% | 1,36% | 1,40% | 1,52% | 1,61% | 1,61% | 1,73% | 1,79% | 1,70% | 2,28% | 2,46% | 2,28% | 2,28% |
| Avance Acumulado % | 0,00% | 1,47% | 3,08% | 3,27% | 3,49% | 3,72% | 3,94% | 4,45% | 5,07% | 5,70% | 6,32% | 6,96% | 7,64% | 8,30% | 9,24% | 10,19% | 11,14% | 12,13% | 13,49% | 14,90% | 16,42% | 18,03% | 19,70% | 21,43% | 23,22% | 24,92% | 27,20% | 29,66% | 31,95% | 34,22% |
| O. INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MESES | 2.564.024.118 | 5.300.669.729 | 5.684.556.370 | 6.646.968.241 | 6.471.974.759 | 6.663.624.490 | 7.716.943.459 | 8.606.944.021 | 9.020.046.380 | 11.013.147.864 | 12.110.240.315 | 13.334.556.788 | 14.488.864.257 | 16.105.041.022 | 17.780.042.906 | 19.415.000.193 | 21.141.962.467 | 23.508.371.986 | 26.058.002.643 | 28.780.277.563 | 31.920.794.489 | 34.379.251.412 | 37.332.760.222 | 40.454.037.883 | 43.423.734.245 | 47.398.413.130 | 51.976.267.712 | 55.661.687.987 | 59.638.676.852 | 64.419.275.530 |

| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | 14/12/2025 |
| MESES | 72.543.752.406 | 80.931.760.451 | 88.607.305.852 | 96.752.411.768 | 103.513.175.542 | 121.011.376.242 | 135.736.681.179 | 150.745.553.442 | 163.600.704.330 | 170.092.723.185 | 185.617.520.324 | 196.602.786.631 | 198.618.871.330 |
| CONVENIO | | | | | | | | | | | | | |
| Avance Mensual % | 4,69% | 4,68% | 4,92% | 5,56% | 5,05% | 7,21% | 6,42% | 6,72% | 7,62% | 7,02% | 5,64% | 5,50% | 0,18% |
| Avance Acumulado % | 41,63% | 46,31% | 51,11% | 56,68% | 62,28% | 69,49% | 77,91% | 86,63% | 94,05% | 101,07% | 106,70% | 112,21% | 112,39% |
| O. INICIO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Firma del Representante Legal Contratista

**Ing. EMILIO DIAZ DE VIVAR**
**Representante Legal**

Ing. Alberto Alfonso
Representante Le

Fernando Patamozo Páez
Ingeniero Civil
Reg. N° C.I.C.N° 3125

74 (cobro)

CURVA DE AVANCE OBRAS DE HABILITACION
LOTE 2 -PRORROGA A MAYO/2025

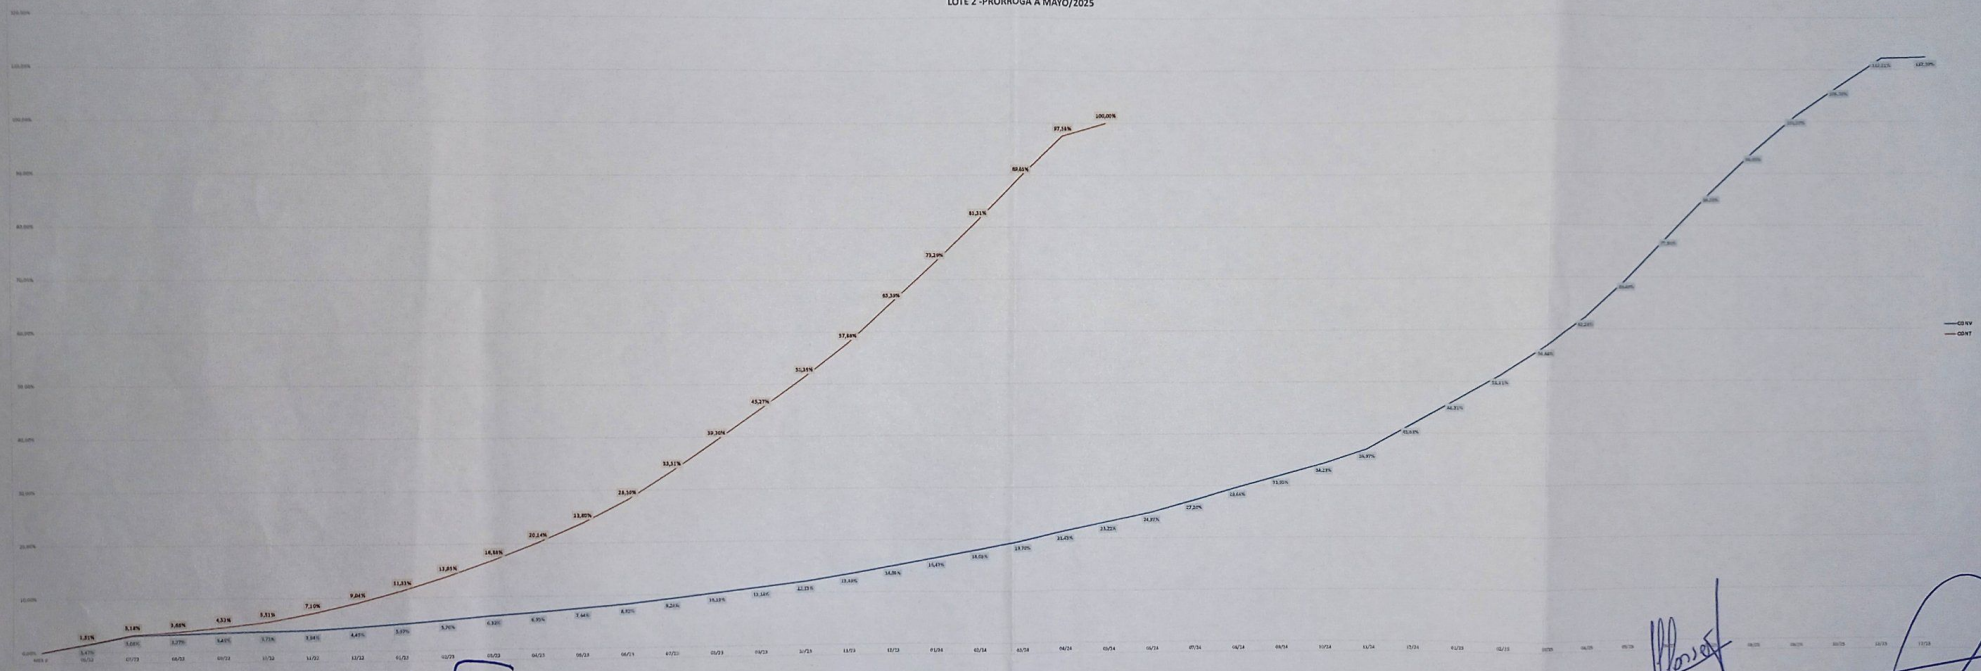


Ing. EMILIO DIAZ DE VIVAR
Representante Legal

Ing. Alberto Alfonso
Representante Legal

Fernando Retamozo Paez
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 3125
