02 (dos)

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

CRONOGRAMA DE OBRA REPROGRAMADO SEGÚN ORDEN DE EJECUCION N°06

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

					MOTIVOS DE FUERZA MAYOR			DESARROLLO DE LA OBRA																							
Nº ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO TOTAL	MES 1- 22 MARZO 2023	MES 2-ABRIL 2023	MES 3- MAYO 2023	MES 4 - 9 JUNIO 2023	MES 5-JULIO 2023	MES 6- AGOSTO 2023	MES 7- SETIEMBRE 2023	MES 8- OCTUBRE 2023	MES 9 - NOVIEMBRE 2023	MES 10- DICIEMBRE 2023	MES 11- ENERO 2024	MES 12- FEBRERO 2024	MES 13- MARZO 2023	MES 14- ABRIL 2024	MES 15- MAYO 2024	MES 16- JUNIO 2024	MES 17 - JULIO 2024	MES 18 - AGOSTO 2024	MES 19 - SEPTIEMBRE 2024	MES 20 - OCTUBRE 2024	MES 21 - NOVIEMBRE 2024	MES 22 - DICIEMBRE 2024	MES 23 - ENERO 2024	MES 24 - FEBRERO 2025	MES 25 - MARZO 2025	MES 26 - ABRIL 2025	MES 27 - 15 MAYO 2025
	MOVIMIENTO DE SUELO																														
1	Desbosque, Desbrose y Despeje	ha	36,66	183.984.992				9,98%	31,91%	14,40%	3,00%	2,35%	4,83%	3,16%						13,64%	16,72%										
2	Excavación no Clasificada	m3	83.279,40	1.197.141.375						0,95%		28,62%	6,75%									10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%				
3	Excavación de Bolsones	m3	8.327,94	173.629.221					100,00%																						
4	Excavación zanjas de drenaje	m3	7.151,43	120.415.778						10,23%	9,17%											13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%				
5	Terraplén	m3	252.513,42	7.577.927.734					13,48%	20,31%	13,51%	12,94%	3,22%		4,23%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	7,92%								5,37%			
6	Excavación Estructural	m3	1.180,60	28.757.055								100,00%																			
	PAVIMENTO																														
7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m3	36.705,70	1.102.198.760																10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%			
8	Riego de Imprimación	L	118.776,60	886.073.436																			10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
9	Riego de Liga	L	39.592,20	277.501.730																									30,00%	30,00%	40,00%
10	Sub Base Cementada Rc7 ≤ 2.8 Mpa (e=20 cm)	m3	23.323,10	3.415.481.410																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
11	Base Granular CBR 100	m3	21.895,20	3.483.789.062																			10,00%	10,00%	15,00%	13,00%	15,00%	15,00%	22,00%		
12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m3	1.587,40	1.943.679.231																									5,00%	45,00%	50,00%
13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m3	3.889,90	5.214.212.565																									5,00%	45,00%	50,00%
14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m2	910,00	89.524.890																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	OBRAS DE ARTE																														
	Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado																														
15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	103,49	156.164.030											15,46%			15,46%	15,46%	19,33%	17,15%	17,15%									
16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	11,56	32.575.641																		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	35,89	110.708.914								55,73%						44,27%													
18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	41,09	120.062.391															33,33%	33,33%	33,33%										
19	Alcantarilla Tubular Triple D= 1,20 m	ml	24,15	224.607.896									62,11%					37,89%													
	Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado																														
20	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m	ml	25,07	115.498.994								39,89%	43,88%		16,23%																
21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m	ml	31,71	355.582.907															33,33%	33,33%	33,33%										
22	Alcantarilla Celular Doble H°A° 1,50x1,50m	ml	27,28	180.342.542								73,31%						26,69%													
23	Alcantarilla Celular Doble H°A° 2,00x2,00m	ml	28,06	240.779.886															33,33%	33,33%	33,33%										
24	Alcantarilla Celular Triple H°A° 1,50x1,50m	ml	110,96	861.716.137																20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
	OBRAS COMPLEMENTARIAS																														
25	Señalización vertical	m2	138,81	214.330.969																										50,00%	50,00%
26	Señalización Horizontal	m2	4.604,29	179.843.567																										50,00%	50,00%
27	Baranda metalica de contención vehicular	ml	7.145,98	2.603.952.236																										50,00%	50,00%
28	Tachas bidireccionales	un	3.433,67	71.245.219																										50,00%	50,00%
29	Cordón Cuneta	ml	407,37	46.871.585																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
30	Mojones de kilometraje	m2	14,00	14.012.488																											100,00%
31	Empastado	m2	17.068,00	134.376.364																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	5,00	11.199.380																10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
33	Construcción de Alambrado	m	14.662,00	348.735.670					4,20%	6,96%	2,73%	5,52%						10,00%	10,00%	10,00%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%					
34	Pórtico de señalización	un	4,00	237.009.916																										50,00%	50,00%
35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	1.386,80	208.792.448																10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
36	Disipadores de hormigón	m3	988,16	800.942.218																			10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%				
37	Canaleta de bajada	ml	53,83	13.114.872																						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
38	Cordón de hormigón	ml	374,22	17.723.808																			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
39	Cajas de captación AT50,80	m3	40,00	18.034.440																										50,00%	50,00%
40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	65,00	29.305.965																										50,00%	50,00%
41	Gradas disipadoras	m3	31,50	102.647.822																								20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
42	Canalizacion de muro de piedra bruta	m3	1.346,10	606.903.992																								20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
43	Darsenas y casetas para Refugio de Pasajeros	un	2,00	25.445.822																										50,00%	50,00%
44	Protección de Areas de Préstamos	un	15,00	272.995.155																										50,00%	50,00%
45	Iluminación con artefactos	un	39,00	345.356.973																										20,00%	80,00%
	INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS																														
46	Instalacion y Servicios Especializados	Mes	12,00	452.389.524				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%												
	MOVILIZACION																														
47	Movilizacion	Gl	1,00	791.909.386				50,00%	30,00%	20,00%																					
	PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA																														
48	Plan de gestion socio ambiental PGA	Gl	1,00	393.846.638																25,00%		25,00%		25,00%		25,00%					
	INDEMNIZACION																														
49	Indemnizacion	Gl	-	-																											
	PORCENTAJE MENSUAL RESPECTO AL MONTO DE OBRAS CONTRACTUAL				0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	4,28%	5,02%	3,02%	4,59%	1,56%	0,12%	1,11%	1,10%	1,10%	1,77%	1,93%	3,70%	1,75%	2,72%	3,87%	4,15%	4,22%	4,45%	4,86%	5,32%	6,24%	15,11%	16,74%
	PORCENTAJE ACUMULADO RESPECTO AL MONTO DE OBRAS CONTRACTUAL				0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	5,54%	10,56%	13,58%	18,17%	19,73%	19,85%	20,96%	22,07%	23,17%	24,94%	26,87%	30,57%	32,32%	35,04%	38,92%	43,06%	47,28%	51,73%	56,59%	61,90%	68,14%	83,26%	100,00%

PDF Scanner ACE Scanner

01 curva

CURVA DE AVANCE FISICO - FINANCIERO REPROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE EJECUCION NRO 06

CONTRATISTA: CIVSA

Contrato SG Ministro N° 180/2022
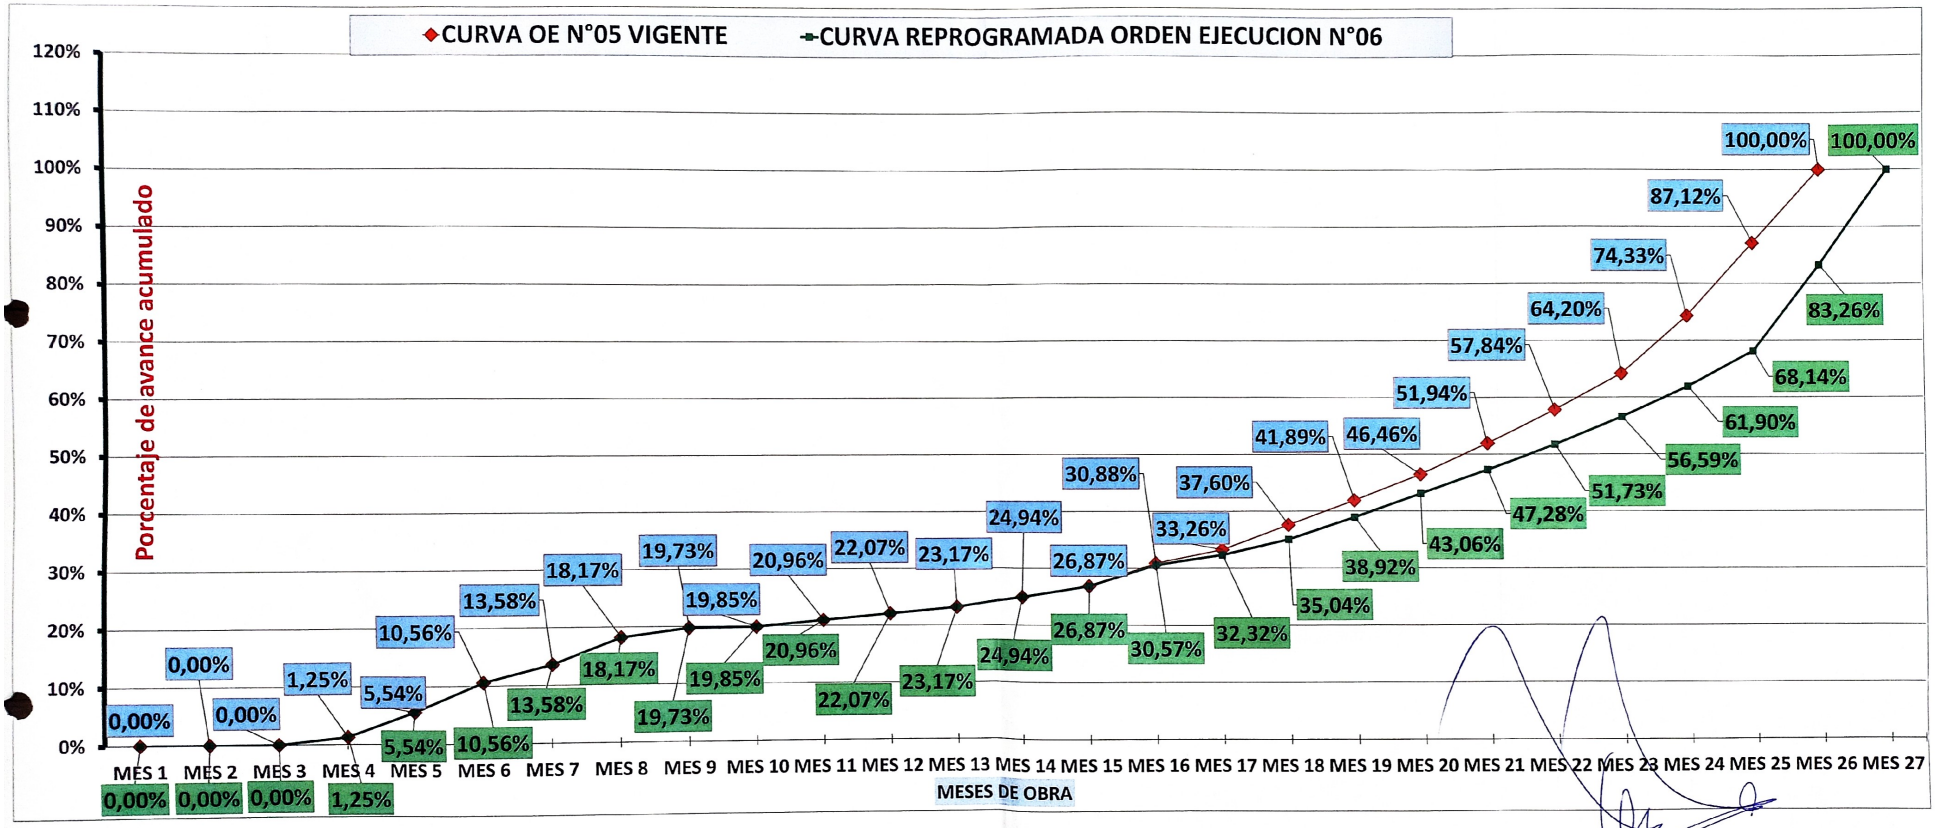
Llamado MOPC No.: 98/2021
