Encarnación, 11 de Abril de 2022

# Dictamen N° 01/2022

Según la nota presentada por el Contratista San Blas Construcciones de fecha 08/04/22 en el que solicita prórroga por lluvia en la ejecución de Contrato en relación a "Obras en el Campus -Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria -Plurianual 2021-2022" LOTE I, ID N° 400.199, adjudicado a la empresa San Blas Construcciones S.R.L. según Resolución REC/UOC N°020/2021.

*El pedido de prórroga por lluvia obedece a que debido a las inclemencias del tiempo no pudieron ejecutarse algunos rubros previstos, por lo que se solicita una prórroga de 15 (quince) días la nota de referencia anexa registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología DINAC., como correspondencia de los días de lluvia.*

Visto el Informe de precipitaciones del Fiscal de Obras, presentado el 11 de abril, argumentado con copias del Libro de Obras el cual adjunta.

*"Los contratos con afectación por las lluvias caídas son las siguientes: Del llamado con ID N° 400.199 – Obras en el Campos Sector de la Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria (Plurianual 2.021-2.022). En la que fue Adjudicada a la Empresa Constructora San Blas. La cantidad de días de afectación por lluvias caídas en los meses de noviembre y diciembre del año 2.021 y los meses de enero y febrero del año 2.022 son de 15 (quince) días.*

**PLANILLA DE REGISTROS DE RECIPITACIONES**

| MESES | FECHAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DE DIAS DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Total General de lluvias caídas:*** | ***15*** |

Y reunidos los criterios técnicos. Se recomienda al Sr. Rector, dar curso a lo solicitado.

**Lic. Liz Genez**
Técnico Administradora de Contratos

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

**AUDITORIA INTERNA**

Encarnación, 12 de Abril de 2022.-

## Dictamen de Auditoria Nº 22/2022

Según el Memorando del Dirección General de Administración y Finanzas DGAF. N°30/2022 de fecha 11/04/22 en el que solicita prórroga en la ejecución de Contrato en realción a "Obras en el Campus -Sector Facultad de Ingenieria y Residencia Universitaria -Plurianual 2021-2022 LOTE I", ID N° 400.199 ,adjudicado a la empresa San Blas Construcciones S.R.L. según Resolución REC/UOC N°020/2021.

El pedido obedece a que debido a las inclemencias del tiempo no pudieron ejecutarse algunos rubros previstos, por lo que se solicita una prórroga de 15 ( quince ) días el Memorando de referencia anexa registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrolodía DINAC., como correspondencia de los días de lluvia.

A efectos el decreto 2992 que reglamenta la Ley 2051/03 y su modificatoria la Ley 3439/07 dice en su Art. 97:

"Cuando por caso fortuito fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras , los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas."

Y reunidos los criterios técnicos, y legales, Recomiendo al Sr. Rector, dar curso a lo solicitado.

Lic. Miguel Martinez Basualdo
Auditor Interno

**Marcelo N. Allende B.**
ARQUITECTO
Emiliano R. Fernández casi Padres Jesuitas — Telf.: 071 – 207 645
Encarnación – Itapúa – Py. — 0985 – 742 407
E_mail: marallende01@hotmail.com — 0975 – 138 380



# INFORME DE PRECIPITACIONES

## CD 26/2021

## "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS"

**PLURIANUAL 2021 – 2022**

## ID N°: 401.318

Encarnación – Marzo de 2022

Encarnación, 11 de abril de 2022

**Ing. Hildegardo González Irala**
Rector de la Universidad Nacional de Itapúa

**Ref.:** Contratación Directa N° 26/2021 con número de **ID N° 401.318**, para el **Servicio de Fiscalización de Obras.-**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quién corresponda para presentar mi Informe de Precipitaciones por la Fiscalización de Obras, estipulado según el Manual de Gestión de Contratos de Obras Publicas de la DNCP.

Se adjunta copia del libro de obra de los días de precipitaciones.

Atentamente…

Marcelo N. Allende B.
ARQUITECTO
Reg. N° 2.091

## Introducción:

El mes de desarrollo de este informe de precipitaciones corresponde a los meses de noviembre y diciembre del año 2.021 y los meses de enero y febrero del año 2.022.

## Desarrollo:

| PLANILLA DE REGISTROS DE PRECIPITACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESES** | **FECHAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL DE DIAS DE** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| ***Total General de lluvias caidas:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***15*** |

- **Los contratos con afectación por las lluvias caídas son las siguientes:**

Del llamado con ID N° 400.199 – Obras en el Campos Sector de la Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria (Plurianual 2.021-2.022). En la que fue Adjudicada a la Empresa Constructora San Blas.

***La cantidad de días de afectación por lluvias caídas*** en los meses de noviembre y diciembre del año 2.021 y los meses de enero y febrero del año 2.022 ***son de 15 (quince) días.***

## Fotografías:

REDMI NOTE 8
ARQ. ALLENDE

Fin de mi Informe.-

Marcelo N. Allende B.
ARQUITECTO
Reg. Nº 2.091

Arq. Marcelo N. Allende B.
Fiscal de Obras
11 de abril de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000006

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 05/11/2021. **ESTADO DEL TIEMPO:** Bueno - Lluvioso por la tarde

*ACTIVIDADES*

Aula Ingeniería
Continuan los trabajos de encofrados p/ columnas.
Se suspenden las actividades por presencia de precipitaciones

*OBSERVACIONES*

Se solicita a la fiscalización la verificación de las columnas para su hormigonado

Se autoriza el hormigonado de las columnas y se solicita realizar probetas p/ la verificación de la calidad del Hº (7, 14 y 28 días).

**Ing. Civil Andrés Díaz**
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000015

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** Ma./11/2021 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin actividades por precipitaciones.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

GRAFICA SAN LUIS 2x100 (1) 2023 x2

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000016

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 17/11/2021 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin actividades por precipitaciones

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 000017

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 12/11/2021 ESTADO DEL TIEMPO: Nublado - Húmedo

ACTIVIDADES

Aula Ingeniería
Continúan los trabajos de encadenado
Los [illegible] se ejecutan según las indicaciones de la contratista y la fiscalización, las mismas se colocan conforme a los planos entregados por la contratante
Se suspenden los trabajos por humedad excesiva en el ambiente
Laboratorio

Continuación de Revoque

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L
CONTRATISTA

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000023

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 25/11/21 **ESTADO DEL TIEMPO:** Nublado - Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Inician los trabajos de mampostería y aislación, de ladrillo común y de ladrillo visto.
(En el transcurso de la mañana se suspendieron las actividades por presencia de lluvias)

Laboratorio

Inician los trabajos para la colocación del entrepiso metálico.

*OBSERVACIONES*

- PARA LAS BASES DE PERFIL SE ESTABLECE LA SIGUIENTE DISCUCIÓN (VER DETALLE) QUE SE UTILIZARA SOBRE LA VIGA CENTRAL DE HºAº. EN COMPENSACIÓN A ESTO UNA BASE ES IGUAL A DOS DE LA QUE CONSTA EN PLANILLA.

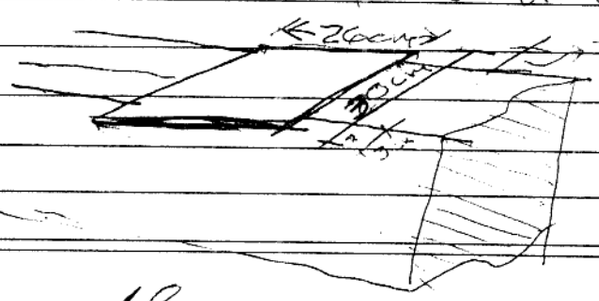


Ing. Civil Andrés Díaz
CONTRATISTA
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000026

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 29/11/21 **ESTADO DEL TIEMPO:** Nublado - Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Continuan con trabajos de ladrillo comun y de ladrillo visto.

Laboratorio

Continuan con trabajos para la colocación del entrepiso metálico

Se suspenden las actividades por presencia de humedad a causa de las precipitaciones del día anterior.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000038

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID - CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 13/12/21 ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA

ACTIVIDADES

Sin actividades por precipitaciones.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000061

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 08/01/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** LLUVIA

*ACTIVIDADES*

Sin Actividades por presencia de lluvia.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

GRAFICA SAN LUIS (071) 2023422

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000076

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 26/01/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin Actividades por presencia de lluvia.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
CONTRATISTA
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000083

OBRA: LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID. CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 03/02/22 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin Actividades por presencia de lluvia.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000084

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 04/02/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin Actividades por presencia de lluvia.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil
Representante Tá
San Blas Con
CONTRATISTA

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000085

OBRA: LCO N° 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

ID CONTRATO : IDN° 400199 Nº CONTRATO: PBS/LCO/18/2021

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONTRATISTA: SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

FECHA: 05/02/22 ESTADO DEL TIEMPO: Humedo

*ACTIVIDADES*

Sin Actividad por humedad excesiva.

*OBSERVACIONES*

Ing. Civil Andrés Díaz
CONTRATISTA
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.

FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000101

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 24/02/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin actividades por presencia de lluvias.

*OBSERVACIONES*

**Ing. Civil Andrés Díaz**
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

GRAFICA SAN LUIS ☎ (071) 202342

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000102

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 25./02./22..... **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin actividades por presencia de lluvias.

*OBSERVACIONES*

**Ing. Civil Andrés Díaz**
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

# LIBRO DE OBRA

Nº 0000104

**OBRA:** LCO Nº 01/2021. "OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022" **LOTE Nº 01**

**ID - CONTRATO :** IDN° 400199 **Nº CONTRATO:** PBS/LCO/18/2021

**UBICACIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA- AULA FACULTAD DE INGENIERÍA

**CONTRATISTA:** SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

**FISCALIZACIÓN:** ARQ. MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ

**FECHA:** 28/02/22 **ESTADO DEL TIEMPO:** Lluvioso

*ACTIVIDADES*

Sin actividades por presencia de lluvias

*OBSERVACIONES*

**Ing. Civil Andrés Díaz**
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL

**SAN BLAS**
CONSTRUCCIONES S.R.L
*Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A*
*Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com*
*Encarnación – Paraguay*

Encarnación, 08 de abril de 2022.-

**Señores**
**Dirección de Infraestructura y Obras**
**Arq. Myriam Morinigo**
**Universidad Nacional de Itapúa**
**Contrato:** Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote Nº 1** IDNº 400.199
**Referencia**: Pedido de prórroga de plazo de ejecución.

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de solicitar la prórroga de plazo de ejecución de obra por un total de 15 (quince) días, por lo cual adjuntamos los registros de lluvias de la Dirección de meteorologías e hidrología registro oficial de precipitaciones correspondientes a la ciudad de Encarnación.

Los días solicitados corresponden a las siguientes fechas:
Noviembre 05,16,17,18,25, y 29; diciembre 13; enero 08,26; febrero 03,04,05,24,25,28 en las cuales no se pudieron realizar las actividades por precipitaciones y humedad excesiva.
Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

*Ing. Com. Patricia Cáceres*
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

**SAN BLAS**
CONSTRUCCIONES S.R.L
*Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A*
*Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com*
*Encarnación – Paraguay*

Encarnación, 05 de diciembre de 2021 .-

**Señores**
**Dirección de Infraestructura y Obras**
**Arq. Myriam Morinigo**
**Universidad Nacional de Itapúa**

**Contrato:** Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote Nº 1** IDNº 400.199

**Referencia**: Presentación Registro de Precipitaciones

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el registro oficial de precipitaciones correspondiente al mes de noviembre del corriente.

Las mismas corresponden a las siguientes fechas 05,16,17,18,25, y 29 en las cuales no se pudieron realizar las actividades por precipitaciones o humedad excesiva

Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

**SAN BLAS**
CONSTRUCCIONES S.R.L
*Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A*
*Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com*
*Encarnación – Paraguay*

Encarnación, 07 de enero de 2022 .-

**Señores**
**Dirección de Infraestructura y Obras**
**Arq. Myriam Morinigo**
**Universidad Nacional de Itapúa**
**Contrato:** Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote Nº 1** IDNº 400.199
**Referencia**: Presentación Registro de Precipitaciones

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el registro oficial de precipitaciones correspondiente al mes de diciembre del corriente.

Las mismas corresponden a las siguientes fechas 13 de diciembre en el cual no se trabajó por lluvia.

Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

**SAN BLAS**
CONSTRUCCIONES S.R.L
*Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A*
*Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com*
*Encarnación – Paraguay*

Encarnación, 07 de febrero de 2022 .-

**Señores**
**Dirección de Infraestructura y Obras**
**Arq. Myriam Morinigo**
**Universidad Nacional de Itapúa**

**Contrato:** Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote Nº 1** IDNº 400.199

**Referencia**: Presentación Registro de Precipitaciones

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el registro oficial de precipitaciones correspondiente al mes de enero del corriente.

Las mismas corresponden a las siguientes fechas 08,26 de enero en las cuales no se pudieron realizar las actividades por precipitaciones.

Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

**SAN BLAS**
CONSTRUCCIONES S.R.L
*Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto. A*
*Tel. Fax 071 208 344 – E-mail: sanblas_construcciones@hotmail.com*
*Encarnación – Paraguay*

Encarnación, 07 de Marzo de 2022 .-

**Señores**
**Dirección de Infraestructura y Obras**
**Arq. Myriam Morinigo**
**Universidad Nacional de Itapúa**

**Contrato:** Obras en el Campus- Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022 **Lote Nº 1** IDNº 400.199

**Referencia**: Presentación Registro de Precipitaciones

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda con el fin de presentar el registro oficial de precipitaciones correspondiente al mes de febrero del corriente.

Las mismas corresponden a las siguientes fechas 03,04,05,24,25,28 de febrero en las cuales no se pudieron realizar las actividades por precipitaciones y humedad excesiva.

Adjuntamos registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular. Atentamente.

*Ing. Com. Patricia Cáceres*
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

**SAN BLAS**
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

**Rectorado**

Encarnación, 12 de abril de 2022.-

**RESOLUCIÓN REC Nº 100/2022.-**

**VISTO:**

El Memorándum DGAF. N° 30/2022 de fecha 11 de abril de 2022, de la ***Lic. Oraida Úbeda de Gamón***, *Directora General de Administración y Finanzas*, eleva a consideración la solicitud de la Dirección de Infraestructura y Obras, donde solicitan Prórroga por Lluvia "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote I – Adjudicado a la empresa San Blas Construcciones SRL.----------

**CONSIDERANDO:**

Que, en el memorando la Dirección de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, D.I.O N° 45/2022, solicita prórroga de ejecución de contrato "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote I Facultad de Ingeniería, debido a precipitaciones según consta en los Registros de precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e Hidrología – DINAC, acaecidos en el periodo de ejecución de las obras, corresponden a 15 días hábiles, tiempo solicitado; así mismo, la Contratista ha presentado una nota donde solicita también la prórroga por 15 días y adjunta los registros de lluvias de la Dirección de meteorología e hidrología.----------

Que, adoptar las medidas necesarias para el buen gobierno de la Universidad, es atribución del Rector, conforme establece el artículo 21, inciso "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

***POR TANTO;***
***EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:*** ----------

**R E S U E L V E:**

1) **AUTORIZAR** la Prórroga de ejecución del contrato de "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022" Lote I, por Lluvias por el periodo de 15 días hábiles, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.---

2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

***Abg. Néstor Ibáñez Miranda***
Secretario General

***Prof. Ing. Hildegardo González Irala***
Rector

**Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>**

# Notificación de prórroga por lluvia

2 mensajes

**Infraestructura Y Obras** <infraestructurayobras@uni.edu.py> 12 de abril de 2022, 13:46
Para: "San Blas Construcciones S.R.L." <sanblas_construcciones@hotmail.com>

Adjunto remito la resolución de prórroga por lluvia de la Licitación de "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022- Lote 1

**FAVOR DAR ACUSE DE RECIBIDO**

**Resolución 100 prórroga por lluvia.pdf.pdf**
497K

**San Blas Construcciones S.R.L.** <sanblas_construcciones@hotmail.com> 12 de abril de 2022, 14:07
Para: Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>

Buenas tardes
Por medio de la presente damos acuse de recibido
Atte.
Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres
Socia Gerente San Blas Construcciones S.R.L.

Get Outlook for Android

**From:** Infraestructura Y Obras <infraestructurayobras@uni.edu.py>
**Sent:** Tuesday, April 12, 2022 1:46:00 PM
**To:** San Blas Construcciones S.R.L. <sanblas_construcciones@hotmail.com>
**Subject:** Notificación de prórroga por lluvia

[El texto citado está oculto]
