Caacupé, 09 de mayo de 2024

A

Abog. Celva Saldívar Giménez

Encargada de la UOC

Presente

Referencia: Informe de obra

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 63/2023
ID Nº: 432.547

Fecha de Acta de inicio: 22/09/2023

Fecha fin de obra: 19/05/2024

Por la presente se informa sobre la solicitud de prórroga de los trabajos de "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 63/2023,** de la ***empresa CCG CONSTRUCCIONES CIVILES, representado por el Ing Alfredo Lezcano***

La empresa viene realizando trabajos de:

1- CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL"

Acta de inicio	22/09/2023
Fecha final de plazo	19/05/2024
Fecha nueva de final de plazo (prórroga)	**28/06/2024**

Avance actual de obra: 75%

Se otorga 40 (cuarenta) días de prórroga por lluvias y sus consecuencias.

Se anexa informe de obras del Contrato N° 63/2023.

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara G.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2555

Recibido
09/05/2025

20/05/2025

1- ***Contratista : CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL***

Contrato Nº: 63/2023

Monto del Contrato: 234.097.700 Gs.

Escuela Básica N° 2241 San Roque González de Santa Cruz – Cñía San Blas Primero de Marzo - Avance de la obra: 75 %

Lugar o Institución	Monto de contrato	Monto certificado	Porcentaje de avance	Situación
Escuela Básica N° 2241 San Roque González de Santa Cruz	234.097.700		75%	En ejecución

Consiste en la Construcción de dos aulas

La mampostería se encuentra en la altura de asiento de los tirantes, se observa además los acopios de tirantes de hormigón, y preparación de los trabajos para el techo (vigas cumbreras, vigas de encadenado sobre mamposterías).

Se observa personales trabajando en el sitio de obras.

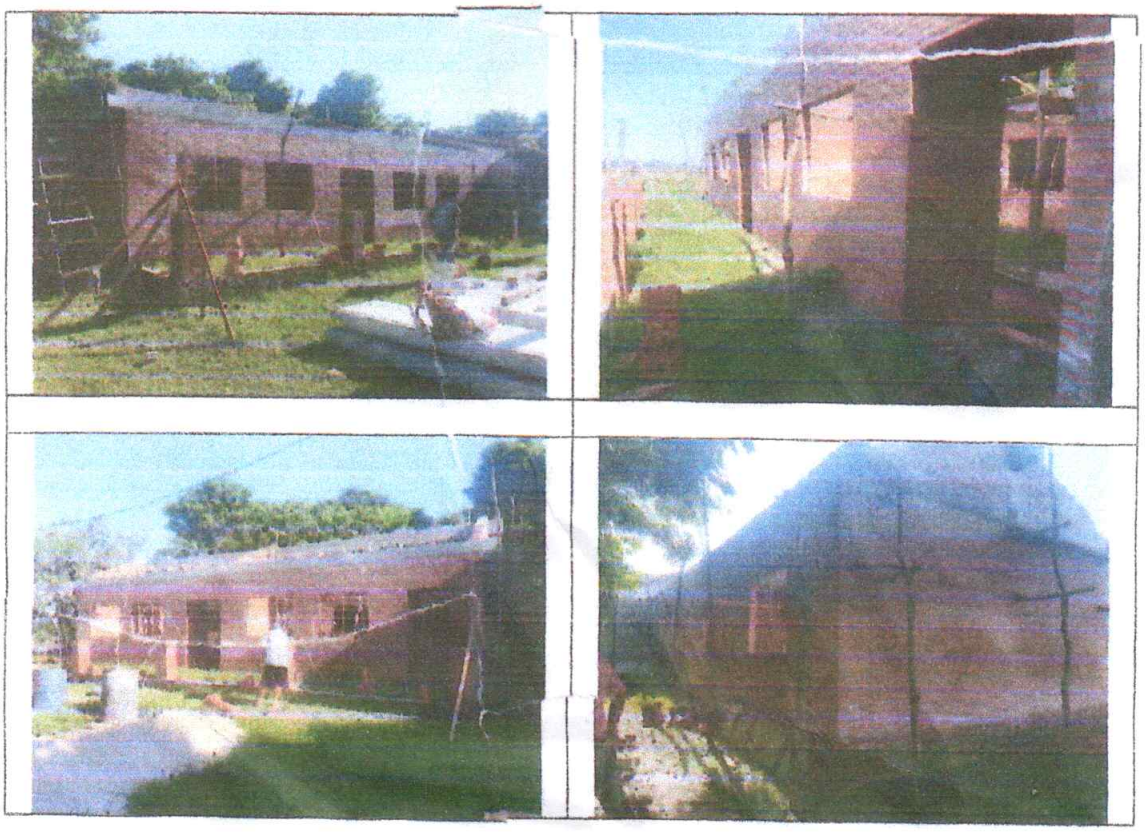

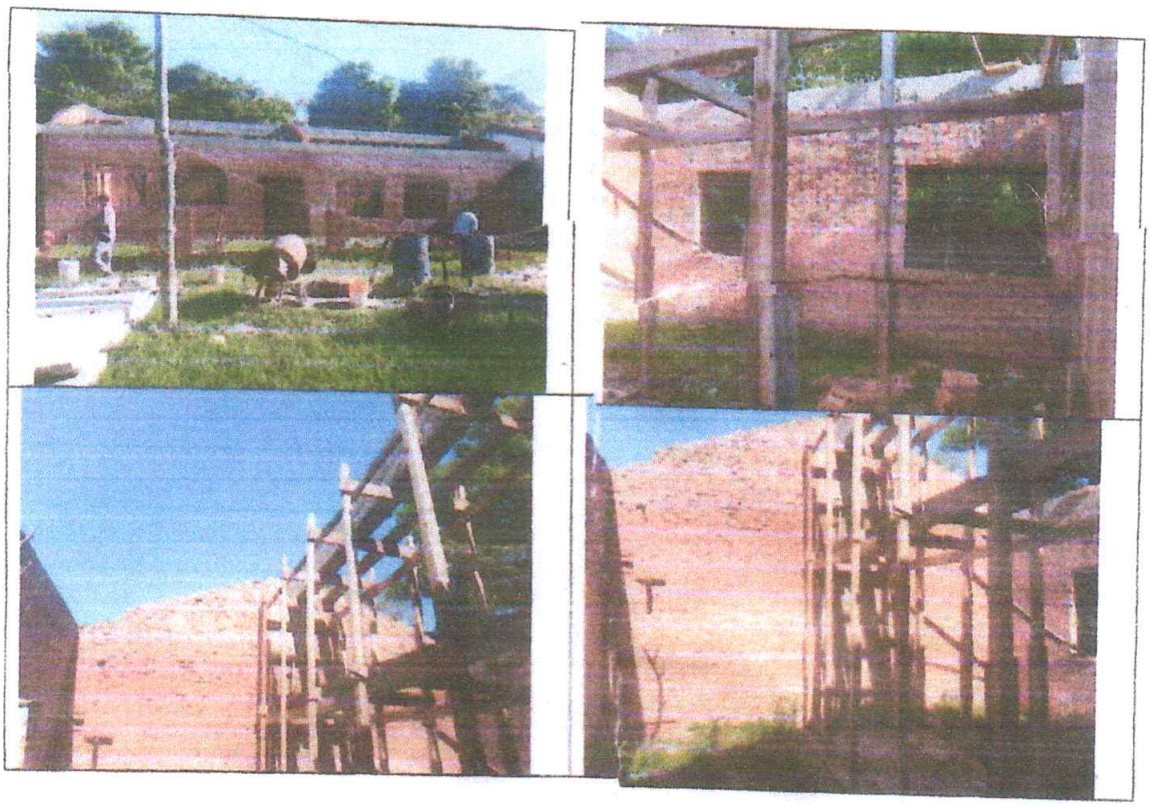

Es mi informe

Jorge Nogura S.
AR[illegible]ECTO
Reg. MOPC 2595
