		jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-
Item	Rubros	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes
1	Movimiento de Suelos											
1,1	Desbosque, desbroce y despeje		0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%				
			0,088%	0,066%	0,066%	0,044%	0,088%	0,088%	0,088%			
1,2	Remoción de estructuras existentes		0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%		
			0,003%	0,002%	0,002%	0,001%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,0
1,3	Excavación no clasificada					0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,01
							0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,01
1,4	Excavación de bolsones					0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,02
							0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,0
1,5	Excavación de zanjas de drenaje					0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,04
							0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,0
1,6	Terraplén						1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	1,07
								1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	1,0
2	Paquete Estructural											
2,1	Subrasante mejorada CBR>15%							0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,28
									0,283%	0,283%	0,154%	0,1
2,2	Subbase Granular 70/30 CBR ≥ 80%									0,395%	0,395%	0,39
											0,395%	0,3
2,3	Base Granular CBR=100%										1,157%	1,15
												0,6
2,4	Base Asfáltica											
2,5	Carpeta de Concreto Asfáltico c/ Polímero											
2,6	Riego de liga											
2,7	Imprimación Asfáltica										0,165%	0,16
3	Alcantarillas											
3,1	Alcantarillas Tubulares				0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1	Alcantarilla Tubular Simple de Ø = 60cm						0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,01
								0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,0
3.1.2	Alcantarilla Tubular Simple de Ø = 100cm						0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,00
								0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,0
3.1.4	Alcantarilla Tubular Doble de Ø= 100cm						0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,00
								0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,0
3.1.6	Alcantarilla Tubular Triple de Ø= 100cm						0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,00
								0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,0
3.1.7	Cabeceras para Alcantarillas Tubulares						0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,00
								0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,0
3,2	Alcantarillas Celulares											
3.2.1	Alcantarilla Celular Simple de 0,70x1,00m						0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,00
								0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,0
3.2.2	Alcantarilla Celular Simple de 1,00x1,00m						0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,00
								0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,0
3.2.3	Alcantarilla Celular Simple de 1,50x1,50m						0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,02
								0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,0
3.2.4	Alcantarilla Celular Simple de 2,00x2,00m						0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,00
								0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,0
3.2.5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00x1,00m											
3.2.6	Alcantarilla Celular Doble de 1,50x1,50m						0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,03
								0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,0
3.2.7	Alcantarilla Celular Doble de 2,00x2,00m						0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,00
								0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,0
3.2.9	Alcantarilla Celular Doble de 3,00x3,00m						0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,01
								0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,0
3.2.11	Alcantarilla Celular Triple de 1,50x1,50m						0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,00
								0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,0
3.2.12	Alcantarilla Celular Triple de 2,00x2,00m						0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,03
								0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,0
3.2.13	Alcantarilla Celular Septuple de 1,00x1,00m						0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,01
								0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,0
3.2.14	Alcantarilla Celular Septuple de 2,00x2,00m						0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,02
								0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,0
3.2.15	Cabeceras para Alcantarillas Celulares						0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,03
								0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,0
4	Obras Complementarias											
4,1	Traslado de alambrado			0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,04
				0,048%	0,043%	0,037%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,0
4,2	Alambrado			0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,03
				0,035%	0,031%	0,027%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,0
4,3	Cordón de hormigón											
4,4	Cordón Cuneta de hormigón											
4,5	Señalización Vertical											
4,6	Señalización Horizontal											
4,7	Taches Reflectantes											
4,8	Hitos kilométricos											
4,9	Empastado de taludes											

6(seis)

S CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGIÓN ORIENTAL, ID 401,919

TRAMO 1A - LOTE 1 - 39,31 km

sario – Volendam (incluido los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua)

Corrección por lluvias del Cronograma Físico Financiero

3	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	
l	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	
																0,53%
																0,53%
																0,03%
																0,03%
%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%									0,19%
%	0,010%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,010%	0,007%	0,002%	0,002%						0,19%
%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%									0,35%
%	0,016%	0,021%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,008%	0,005%	0,002%	0,002%					0,35%
%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%								0,64%
%	0,033%	0,035%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,037%	0,010%	0,007%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%			0,64%
%	1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	1,075%									13,98%
%	0,831%	0,880%	1,075%	1,075%	1,075%	1,075%	0,198%	0,196%	0,244%	0,000%	1,80%					13,98%
%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%							3,96%
%	0,216%	0,231%	0,283%	0,283%	0,283%	0,283%	0,274%	0,051%	0,004%	0,178%	0,178%	0,286%	0,170%			3,96%
%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%						5,13%
%	0,300%	0,321%	0,395%	0,395%	0,395%	0,395%	0,341%	0,072%	0,090%	0,105%	0,130%	0,395%	0,395%	0,034%		5,13%
%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%				16,19%
%	0,840%	0,840%	1,157%	1,157%	1,157%	1,157%	0,860%	0,210%	0,285%	0,165%	1,157%	1,157%	1,157%	0,386%		16,19%
				2,101%	2,101%	2,101%	2,101%	2,101%	2,101%	2,101%	2,101%	2,101%	2,101%			21,01%
							1,125%	0,347%	0,478%	0,478%	0,478%	2,101%	1,192%	1,247%	0,692%	21,01%
						1,562%	1,562%	1,562%	1,562%	1,562%	1,562%	1,562%	1,562%			12,49%
								0,784%	0,393%	1,562%	1,562%	1,562%	1,562%	2,834%	2,800%	12,49%
						0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%			2,15%
								0,119%	0,104%	0,268%	0,268%	0,268%	0,268%	0,429%	0,429%	2,15%
%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%				2,31%
	0,121%	0,139%	0,165%	0,165%	0,165%	0,165%	0,142%	0,039%	0,017%	0,037%	0,165%	0,165%	0,165%	0,029%		2,31%
0	0	0	0	0	0	0	0									
%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%								0,21%
%	0,013%	0,012%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,014%	0,001%	0,001%	0,015%	0,015%	0,015%				0,21%
%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%								0,10%
%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,006%	0,001%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%				0,10%
%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%								0,08%
%	0,004%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,002%				0,08%
%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%								0,11%
%	0,006%	0,007%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%				0,11%
%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%								0,06%
%	0,003%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,004%				0,06%
%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%								0,02%
%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,001%	0,000%	0,000%	0,002%	0,002%	0,002%				0,02%
%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%								0,03%
%	0,001%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%				0,03%
%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%								0,30%
%	0,017%	0,018%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,019%	0,004%	0,003%	0,022%	0,019%	0,019%				0,30%
%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%								0,04%
%	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,002%	0,000%	0,001%	0,003%	0,003%	0,003%				0,04%
%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%								0,45%
%	0,026%	0,028%	0,032%	0,032%	0,032%	0,032%	0,028%	0,006%	0,007%	0,032%	0,032%	0,032%				0,45%
%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%								0,10%
%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,006%	0,001%	0,002%	0,001%	0,001%	0,002%				0,10%
%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%								0,26%
%	0,014%	0,015%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,016%	0,004%	0,014%	0,018%	0,016%	0,018%				0,26%
%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%								0,13%
%	0,007%	0,008%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,008%	0,002%	0,002%	0,009%	0,008%	0,009%				0,13%
%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%								0,43%
%	0,024%	0,027%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,027%	0,007%	0,007%	0,030%	0,027%	0,030%				0,43%
%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%								0,17%
%	0,009%	0,010%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,010%	0,002%	0,001%	0,012%	0,012%	0,010%				0,17%
%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%								0,27%
%	0,016%	0,017%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,017%	0,004%	0,014%	0,020%	0,020%	0,020%				0,27%
%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%								0,43%
%	0,024%	0,025%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,025%	0,006%	0,007%	0,030%	0,030%	0,030%				0,43%
%																0,43%
%	0,031%	0,043%														0,43%
%																0,32%
%	0,022%	0,032%														0,32%
							0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%			0,05%
									0,002%	0,002%	0,002%	0,007%	0,007%	0,003%	0,003%	0,05%
							0,289%	0,289%	0,289%	0,289%	0,289%	0,289%	0,289%			2,02%
									0,004%	0,013%	0,024%	0,140%	0,140%	0,140%	0,140%	2,02%
								0,036%	0,036%	0,036%	0,036%	0,036%	0,036%			0,22%
										0,028%	0,029%	0,036%	0,036%	0,031%	0,035%	0,22%
								0,070%	0,070%	0,070%	0,070%	0,070%	0,070%			0,42%
										0,033%	0,053%	0,070%	0,070%	0,102%	0,105%	0,42%
								0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%			0,15%
												0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,15%
								0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%			0,03%
												0,016%	0,005%	0,016%	0,016%	0,03%
							0,074%	0,074%	0,074%	0,074%	0,074%	0,074%	0,074%			0,52%
									0,012%	0,037%	0,074%	0,074%	0,074%	0,102%	0,105%	0,52%

		jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr
Item	Rubros	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes
4,1	Baranda metálica de contención vehicular para suelo											
4,12	Cuneta revestida de hormigón											
4,13	Protección forestal de Préstamos										0,004%	0,0
4,14	Dársenas de Estacionamiento											
4,15	Accesos a Fincas											
4,16	Iluminación en intersecciones											
4,17	Mudanzas de columnas y líneas de ANDE		0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	
4,18	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona										0,002%	0,0
4,19	Pórtico de Señalización											
5	Movilización	0,721%	0,721%	0,721%								
6	Mitigación ambiental	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,0
A2-	OTROS											
7	Suministros del Contrato/Servicios Especializados											
7,1	Suministros para el control de exceso de carga											
7,2	Suministro a la supervision/Oficina y Alojamiento	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,0
8	Estrategia de Comunicación Masiva	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,0
	AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL CONTRACTUAL	0,89%	1,01%	1,10%	0,38%	0,46%	1,76%	2,04%	1,95%	2,35%	3,67%	3,
	AVANCE FISICO - FINANCIERO ACUMULADO CONTRACTUAL	0,89%	1,90%	2,99%	3,37%	3,83%	5,59%	7,63%	9,58%	11,93%	15,61%	19,
	MONTO MENSUAL DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS CONTRACTUAL	₲ 1.134.559.461	₲ 1.298.586.119	₲ 1.405.371.719	₲ 481.105.564	₲ 584.982.796	₲ 2.255.762.961	₲ 2.618.038.306	₲ 2.505.804.739	₲ 3.011.906.707	₲ 4.709.501.420	
	AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL MODIFICADO POR LLUVIA	0,89%	1,01%	1,10%	0,35%	0,24%	0,40%	1,76%	2,02%	1,90%	1,38%	2,
	AVANCE FISICO - FINANCIERO ACUMULADO MODIFICADO POR LLUVIA (Junio 2022- Oct 2023)	0,89%	1,90%	2,99%	3,34%	3,58%	3,99%	5,75%	7,77%	9,67%	11,05%	13
	MONTO MENSUAL DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS CORREGIDOS	₲ 1.134.559.461	₲ 1.298.586.119	₲ 1.405.371.719	₲ 444.176.620	₲ 308.770.491	₲ 518.879.103	₲ 2.255.762.961	₲ 2.592.530.677	₲ 2.433.723.515	₲ 1.773.996.313	

Ing. Pedro Fernández
Superintendente
EDB Construcciones

I
Dir
Cons

5 (cinco)

AS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGIÓN ORIENTAL, ID 401.919

TRAMO 1A - LOTE 1 - 39,31 km

sario – Volendam (incluido los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua)

Corrección por lluvias del Cronograma Físico Financiero

23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	
1	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	
							0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%			3,65%
									0,261%	0,261%	0,522%	0,522%	0,522%	0,783%	0,783%	3,65%
				0,105%	0,105%	0,105%	0,105%	0,105%	0,105%	0,105%	0,105%	0,105%				0,95%
								0,052%	0,052%	0,052%	0,052%	0,052%	0,052%	0,104%	0,104%	0,95%
3%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%			0,07%
	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,008%	0,008%	0,07%
				0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%			0,49%
								0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,049%	0,098%	0,098%	0,49%
	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%					0,85%
			0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%	0,077%			0,85%
				0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%			0,51%
								0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,101%	0,101%	0,51%
																0,33%
%	0,033%	0,033%														0,33%
1%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%							0,02%
%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%							0,02%
											0,015%	0,015%	0,015%			0,04%
													0,015%	0,015%	0,015%	0,04%
																2,16%
																2,16%
2%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%			0,30%
	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%			0,30%
									0,139%	0,139%	0,139%	0,139%	0,139%			0,69%
											0,069%	0,069%	0,139%	0,209%	0,209%	0,69%
3%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%			1,76%
%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%			1,76%
8%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%			1,88%
8%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%			1,88%
1%	3,63%	3,63%	3,63%	5,94%	5,94%	7,77%	8,66%	7,68%	7,55%	7,26%	6,88%	6,81%	5,38%			
4%	22,87%	26,50%	30,13%	36,07%	42,01%	49,77%	58,43%	66,11%	73,66%	80,93%	87,81%	94,62%	100,00%			
	₲ 4.653.746.207	₲ 4.653.746.207	₲ 4.653.746.207	₲ 7.609.954.515	₲ 7.609.954.515	₲ 9.956.292.536	₲ 11.099.219.259	₲ 9.846.368.456	₲ 9.677.188.944	₲ 9.312.829.908	₲ 8.825.734.748	₲ 8.727.002.268	₲ 6.897.935.803			
0%	2,87%	3,02%	3,63%	3,63%	3,63%	3,62%	4,17%	1,55%	2,24%	5,11%	7,33%	8,17%	9,29%	13,66%	14,42%	
6%	16,53%	19,55%	23,18%	26,81%	30,44%	34,06%	38,22%	39,77%	42,01%	47,12%	54,45%	62,62%	71,91%	85,58%	100,00%	
	₲ 3.685.135.971	₲ 3.870.565.052	₲ 4.653.746.207	₲ 4.653.746.207	₲ 4.653.746.207	₲ 4.639.232.307	₲ 5.340.657.905	₲ 1.986.219.081	₲ 2.871.648.553	₲ 6.550.675.323	₲ 9.396.926.125	₲ 10.468.841.824	₲ 11.914.746.369	₲ 17.515.056.762	₲ 18.488.860.284	

g. Héctor Calcagno
ector de Fiscalización
orcio Fiscalizador Vial

Ing. Hugo Colmán
Supervisor de Obra
MOPC

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

LLAMADO MOPC N° 91/2021 SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE L
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENI

TRAMO 1A

Villa del Rosario – Volendam (incluido

Correción por lluvias de

Curva de Avance Fisico Financiero Corregido por Lluvi

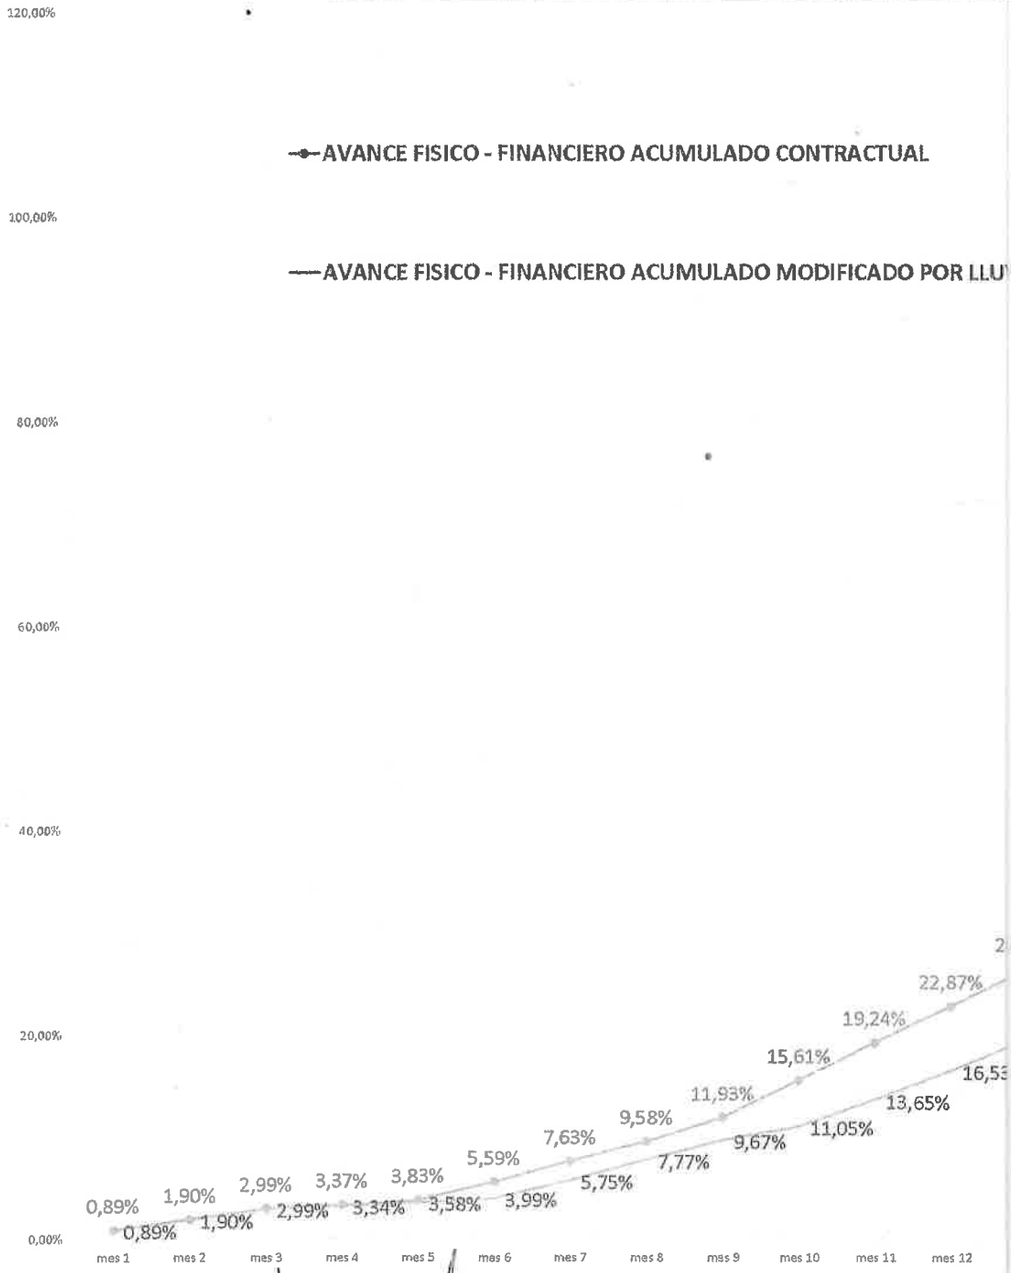

Ing. Pedro Fernández
Superintendente
EDB Construcciones

4 (cuatro)

ICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
IIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES REGIÓN ORIENTAL. ID 401.919

LOTE 1 - 39,31 km

los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua)

Cronograma Fisico Financiero

ıs. Contemplando lluvias desde Junio 2022 a Octubre 2023

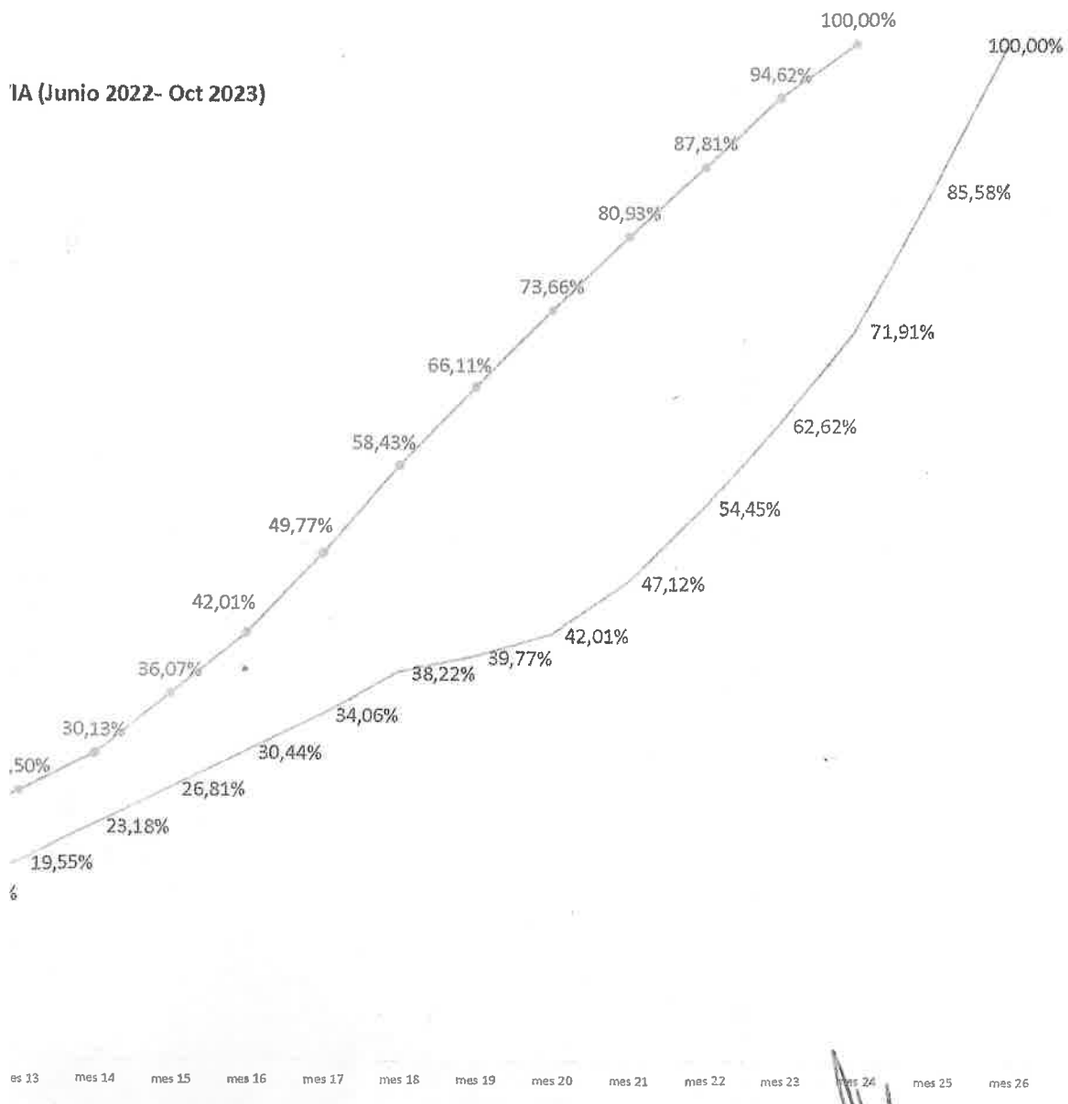

Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

Ing. Hugo Colmán
Supervisor de Obra
MOPC
