DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

00006081

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1			0,0									
2			0,0									
3			8,8									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			12,8									
17			0,0									
18			0,0									
19			0,1									
20			1,1									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			13,4									
28			0,0									
29			3,2									
30			0,0									
31			0,0									
Total			39,4									
Máx. 24h			13,4									
Día Máx.			27									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-

MARIA AUXILIADORA RAMIREZ DE AYUB
Notaria Pública - Registro Nº 657
Av. Romulo Rios 1040
Telefax: 227.990
Asunción - Paraguay

Ing. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
DMH - DINAC

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

000048

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				32,6								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				2,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				16,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				12,1								
24				4,4								
25				0,2								
26				0,2								
27				0,2								
28				0,1								
29				0,1								
30				0,1								
31												
Total				68,4								
Máx. 24h				32,6								
Día Máx.				5								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tengo a la vista. CONSTE.
MARIA ... MARTINEZ DE ÁYUB
Notaria Titular ... Matrícula N° 65
Teléfono 227.529
Asunción, Paraguay

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

00006059

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					0,1							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,8							
5					0,1							
6					0,1							
7					0,1							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,1							
12					0,0							
13					0,1							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,1							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					1,5							
Máx. 24h					0,8							
Día Máx.					4							

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que [illegible]

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Ing. Osvaldo A[illegible] Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Lic. Maria Laurita Aveiro G.

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

000036

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay

0000053

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						4,9						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,1						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						5						
Máx. 24h						4,9						
Día Máx.						5						

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-

MARIA ... MEZ DE AYUB
Notaria ... 657
Tte. ...
Asunción - Paraguay

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Silvia Filartiga
Arquitecta

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obra
MOPC

DIRECC... Dpto.

Lic. Alicia Lourdes Aveiro C.
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos
DMA - DINAC

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

000029

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

00006057

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1							0.0					
2							0.0					
3							0.0					
4							0.0					
5							0.0					
6							0.0					
7							0.0					
8							0.0					
9							0.0					
10							0.0					
11							0.0					
12							0.0					
13							0.0					
14							2,4					
15							12,3					
16							0,8					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,8					
27							0,1					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							1,5					
Total							17,9					
Máx. 24h							12,3					
Día Máx.							15					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro C.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. a Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

00006056

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Nota Nº 09/2022.-

Asunción, 7 de febrero de 2022.-

Señora
Arq. Rocío Soledad Duarte de Busto
Director de Obras Publicas
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)
Presente

Referencia: Llamado MOPC Nº 131/2018 "Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios - Ad Referéndum al PGN 2019"
Asunto: Disminución de personal por rebrote de COVID 19

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de poner a conocimiento la disminución de personal en obra, por el rebrote de COVID 19, que es de público conocimiento actualmente; desde el 02 de enero del corriente año solicitando así 30 días prorroga.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Eva Giménez
07/02/22
14:35 hs

(+595 21) 208 334 / 208 367 / 212 934
(+595 981) 257 801
www.aponteletorre.com.py
info@aponteletorre.com.py
J.F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Asunción, Paraguay

Nacionales (https://npy.com.py/secciones/noticias/nacionales/)

Covid-19: Casos se disparan con 4.145 nuevos contagios y nueve muertes

El Ministerio de Salud Pública reportó 4.145 nuevos casos de Covid-19 y nueve muertes en su reporte emitido este viernes.

14 enero, 2022 *(https://www.instagram.com/npyoficial)*

Archivo - Última Hora

El Ministerio de Salud Pública informó que procesaron 13.001 muestras, de las cuales 4.145 dieron positivo por Covid-19. Los casos de coronavirus en Paraguay subieron a 494.034.

Asimismo, la cartera sanitaria reportó nueve muertes, todos hombres. De los cuales seis eran no vacunados, dos con vacunación completa pero con enfermedades de base y una víctima tenía incompleto su esquema de vacunación.

Según el informe, de los fallecidos, dos tenían entre 40 a 59 años y siete de 60 años para arriba.

Procedían de los departamentos de Itapuá, Alto Paraná y Central.

Los fallecidos por Covid-19 en Paraguay aumentaron a 16.720.

Además, hay 378 internados por el coronavirus, de los cuales 82 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el informe oficial, de los pacientes graves, 47 no están vacunados, 28 tienen dos dosis y seis tienen una sola dosis.

> Informe #COVID19 (https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) | 14 de enero
>
> 📍Procesamos 13.001 muestras, 4.145 positivos.
>
> 📍Total de confirmados: 494.034
>
> 📍09 fallecidos. Total: 16.720
> 40 a 59 años: 2 (1 dosis incompleta, 1 no vacunados)
> 60 años y más: 7 (2 dosis completa, 5 no vacunados).
> pic.twitter.com/0NVM0mtxnO (https://t.co/0NVM0mtxnO)
>
> — Ministerio de Salud (@msaludpy) January 14, 2022 (https://twitter.com/msaludpy/status/1482103646301130758?ref_src=twsrc%5Etfw)

Lo más visto Lo último

Acahay: Reportan presunto feminicidio, mujer fue asesinada a tiros (https://npy.com.py/2022/04/acahay-reportan-presunto-feminicidio-mujer-fue-asesinada-a-tiros/)

(https://npy.com.py/2022/04/acahay-reportan-presunto-feminicidio-mujer-fue-asesinada-a-tiros/)

15 abril, 2022 |

Sicario dispara contra mujer en Ponta Porã (https://npy.com.py/2022/04/sicario-dispara-contra-mujer-en-ponta-pora/)

(https://npy.com.py/2022/04/sicario-dispara-contra-mujer-en-ponta-pora/)

17 abril, 2022 |

Capturan a paraguayos por pesca depredadora (https://npy.com.py/2022/04/paraguayos-detenidos-por-pesca-depredadora/)

(https://npy.com.py/2022/04/paraguayos-detenidos-por-pesca-depredadora/)

17 abril, 2022 |

NPY, 5 años conectándote con las noticias (https://npy.com.py/2022/04/npy-5-anos-conectandote-con-las-noticias/)

(https://npy.com.py/2022/04/npy-5-anos-conectandote-con-las-noticias/)

17 abril, 2022 |

Patrulla Caminera da inicio a Operativo Retorno de Semana Santa (https://npy.com.py/2022/04/patrulla-caminera-da-inicio-a-operativo-retorno-de-semana-santa/)

(https://npy.com.py/2022/04/patrulla-caminera-da-inicio-a-operativo-retorno-de-semana-santa/)

17 abril, 2022 |

Por otro lado, hubo 275 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el Covid-19 aumentó a 450.191.

Por otro lado, la cartera sanitaria emitió un informe especial retrospectivo con relación a meses anteriores e informaron que a los datos de este viernes se suman, 220 casos positivos de meses anteriores para un total de 494.254.

Asimismo, se detalla que en los últimos meses del 2021 han fallecido 77 personas cuyos datos no se conocían y que hasta ahora fueron reportados. Con este número el total de muertes asciende a 16.797.

Durante esta semana, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram) reportó que se encuentra con una ocupación del 80% de camas de UTI. Todos los casos son respiratorios, entre ellos positivos por coronavirus y otros con sospecha.

El incremento se dio desde la primera semana del mes de enero.

> 📍Datos cierre retrospectivo fallecidos, discriminados por franjas etarias:
>
> ≤19 años: 1 (no vacunado)
> 20 a 39 años: 9 (9 no vacunados).
> 40 a 59 años: 19 (1 dosis incompleta, 18 no vacunados).
> 60 años y más: 48 (1 dosis completa, 3 dosis incompleta, 44 no vacunados).
>
> — Ministerio de Salud (@msaludpy) January 14, 2022 (https://twitter.com/msaludpy/status/1482103654173790211?ref_src=twsrc%5Etfw)

Más sobre: Informe covid-19 (https://npy.com.py/temas/informe-covid-19/)

« Conceden libertad ambulatoria al condenado Ramón González Daher (https://npy.com.py/2022/01/conceden-libertad-ambulatoria-al-condenado-ramon-gonzalez-daher/)

Hombre fallece mientras entrenaba en un gimnasio en Itapúa »

Temas

#VacunatePY (https://npy.com.py/temas/vacunatepy/) Accidente fatal (https://npy.com.py/temas/accidente-fatal/) Albirroja (https://npy.com.py/temas/albirroja/) Alerta coronavirus (https://npy.com.py/temas/alerta-coronavirus/) Alerta covid (https://npy.com.py/temas/alerta-covid/) Alerta covid-19 (https://npy.com.py/temas/alerta-covid-19/) Alto Paraná (https://npy.com.py/temparana/) Amambay (https://npy.com.py/temas/ama Argentina (https://npy.com.py/temas/argentina/) asunción (https://npy.com.py/temas Brasil (https://npy.com.py/temas/brasil/) Caaguazú (https://npy.com.py/temas/caaguazu/) Capiatá (https://npy.com.py/temas/capiata/) Cerro Porteño (https://npy.com.py/temas/cerro-porteno/) Ciudad del Este (https://npy.com.py/temas/ciudad-del-este/) clima (https://npy.com.py/temas/clima/) Concepción (https://npy.com.py/temas/concepcior Congreso (https://npy.com.py/temas/congreso/) Copa Libertadores (https://npy.com.py/temas/copa-libertadores/) Coronavirus (https://npy.com.py/temas/coronavirus/) Covid-19 (https://npy.com.py/temas/covi 19/) Covid-19 en Paraguay (https://npy.com.py/temas/covid-19-en-paraguay/) Delincuencia (https://npy.com.py/temas/delincuencia/) Encarnación (https://npy.com.py/temas/encarnacion/) Extrema inseguridad (https://npy.com.py/temas/extrema-inseguridad/) Fernando de la Mora (https://npy.com.py/temas/fernando-de-la-mora/) Fiscalía (https://npy.com.py/temas/fiscalia/) Informe covid-19 (https://npy.com.py/temas/informe-covid-19/) Inseguridad (https://npy.com.py/temas/inse Investigación

NACIONALES

Covid-19: Se disparan los casos con 3.366 nuevos contagios y 14 muertes

13 DE ENERO DE 2022

El Ministerio de Salud Pública reportó 3.366 nuevos casos de Covid-19 y 14 muertes en su reporte emitido este jueves.

Las muestras de casos sospechosos de Covid-19 aumentaron masivamente.

El **Ministerio de Salud Pública** informó que procesaron 14.914 muestras, de las cuales 3.366 dieron positivo por **Covid-19**. Los casos de **coronavirus** en Paraguay subieron a 489.889.

dosis completa de la vacuna y tres no estaban vacunadas.

Además, hubo nueve personas de las cuales dos tenían la dosis completa y siete no estaban inmunizadas, todas ellas tenían entre 60 años y más.

Informe **#COVID19** | 13 de enero

Procesamos 14.914 muestras, 3.366 positivos

Total de confirmados: 489.889

14 fallecidos. Total: 16.711
20 a 39 años: 1 (1 no vacunado)
40 a 59 años: 4 (1 dosis incompleta, 3 no vacunados)
60 años y más: 9 (2 dosis completa, 7 no vacunados) **pic.twitter.com/TlyDuok5aq**

— Ministerio de Salud (@msaludpy) **January 13, 2022**
Procedían de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Asunción y Canindeyú.

Los fallecidos por Covid-19 en Paraguay aumentaron a 16.711.

Además, hay 316 internados por el coronavirus, de los cuales 67 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el informe oficial, de los pacientes graves, 41 no están vacunados, 18 tienen dos dosis y ocho tienen una sola dosis.

Nota relacionada: "**Covid-19: Camas de UTI del Ineram con 80% de ocupación**"

Por otro lado, hubo 250 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el Covid-19 aumentó a 449.916.

Durante el miércoles último, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram) reportó que se encuentra con una ocupación del 80% de camas de UTI. Todos los casos son respiratorios, entre ellos positivos por coronavirus y otros con sospecha.

El incremento se dio desde la primera semana de enero.

Lea también: "**Covid-19: Salud establece nuevo protocolo de aislamiento para vacunados y no vacunados**"

Además, las salas de contingencia respiratorias también se van llenando de pacientes con Covid-19 y otros cuadros respiratorios.

Desde el miércoles rige un nuevo protocolo de aislamiento para vacunados y no vacunados, según publicó el Ministerio de Salud Pública.

Temas

Covid-19 Ministerio de Salud Pública Coronavirus

Te puede interesar

NACIONALES

Covid-19: Tercera ola duraría poco y habría un descenso en marzo, según Vigilancia de la Salud

20 DE ENERO DE 2022

La directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, dijo que la tercera ola del Covid-19 no duraría mucho, tomando de referencia a otros países. Si comienza en un mes, probablemente habría un descenso a fines de marzo, mencionó.

La directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala. Foto: Gentileza.

el país, que comenzó a mediados de diciembre.

El Ministerio de Salud Pública reportó el miércoles un nuevo récord de contagios de 6.760 casos.

Irala afirmó que se dio un aumento rápido de casos. Asimismo, mencionó que haciendo una comparación de la tercera ola con otros países donde llegó antes, "hay una cuestión esperanzadora". "Lo que muestra Inglaterra, que empezó antes, es que este tipo no dura mucho, sube muy alto, rápido", acotó.

Le puede interesar: Subregistro con ómicron podría trepar a 30.000 contagios diarios

La directora de Vigilancia de la Salud explicó que si a fines de enero hay un probable pico de casos y en un mes se registra la ola pandémica, para fines de marzo se podría producir un descenso.

"Si uno va mirando que sube aproximadamente desde mediados de diciembre y a fin de mes (enero) tengamos un pico en un mes y medio, desde ahí el descenso va a tomar quizás el mismo tiempo y de ahí, una curva picuda, aproximadamente en un mes –si es que tenemos el pico– el descenso sería a finales de marzo", explicó.

Lea también: Ministerio de Salud reporta nuevo récord de contagios con 6.760 casos

"Ahí vamos a tener probablemente tipo 400 en promedio", agregó seguidamente.

De acuerdo con las proyecciones hechas por el Instituto para la Métrica y Evaluación en Salud (IHME, en inglés), de la Universidad de Washington, Estados Unidos, el frenético avance de ómicron genera curvas altísimas de contagios y una abrupta caída al cabo de un mes.

Más detalles: Julio Borba insta a no minimizar efectos de la variante ómicron

En otro momento indicó que podría darse un aumento de fallecimientos por Covid-19 en febrero.

Las hospitalizaciones en el país también van en incremento a medida que sube el número de contagios por Covid. Actualmente, la variante ómicron del **coronavirus** es la dominante en el país.

Temas

Covid-19 Dirección General de Vigilancia de la Salud Coronavirus

Te puede interesar

8 DE ABRIL

Las noticias más relevantes de la jornada

PANDEMIA

Covid-19: Salud reporta 565 contagios y siete muertes en la última semana

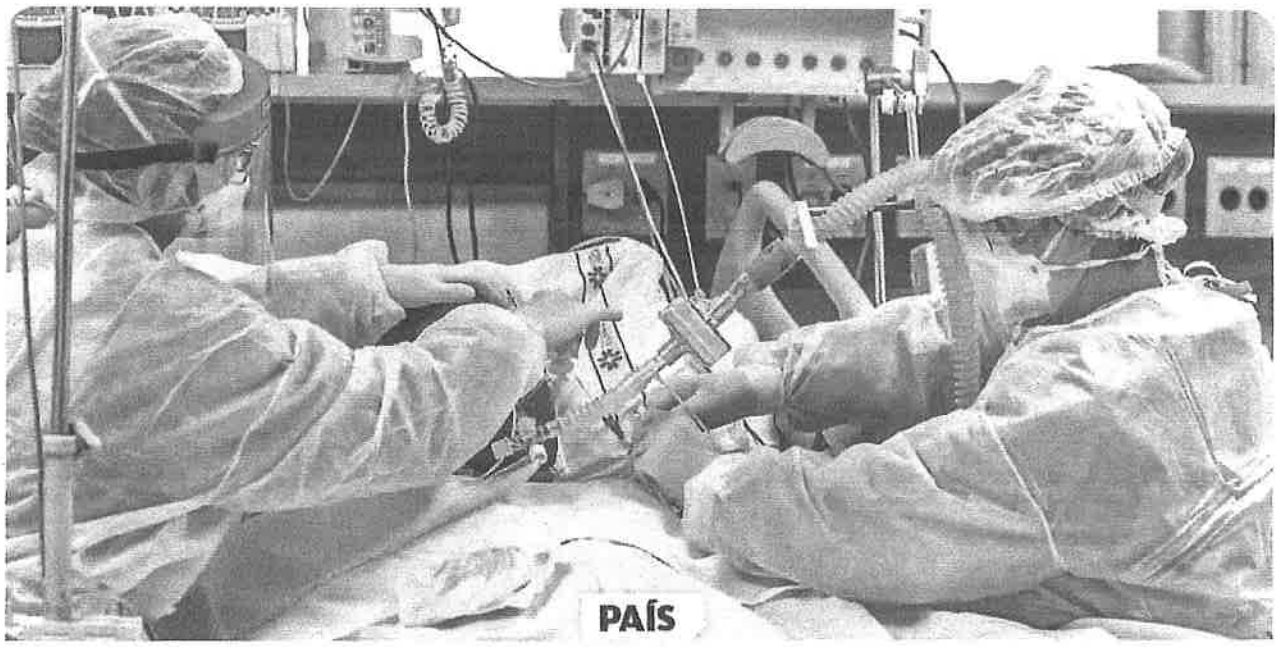

COVID-19: 360.093 casos positivos y 14.247 fallecidos se reportaron en el 2021

En cuanto a los números acumulados, el Ministerio de Salud informó que 468.025 personas se contagiaron con el virus y 16.629 perdieron la vida en Paraguay desde el primer caso en marzo del 2020. Foto: AFP/Ilustrativa.

PAÍS 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 20:01

COVID-19: 360.093 casos positivos y 14.247 fallecidos se reportaron en el 2021

Compartir en redes

Continúa la tendencia al alza de contagios por COVID-19 en Paraguay al cierre de esta semana y del 2021, considerado la tercera ola, y con esto, se registraron hasta hoy 468.025 personas infectadas confirmadas con el virus, desde el primer caso en marzo del 2020, según señaló el reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Según el informe COVID del 31 de diciembre del 2021, se confirmaron 903 nuevos casos positivos hoy viernes, de las 4.975 muestras procesadas, acumulando ya así un total de 468.025 confirmados.

En tanto, pese a que la cifra de fallecidos es mínima, en los últimos días estuvo repuntando. El deceso registrado hoy es de cuatro personas, totalizando 16.629 hasta la fecha.

Se trata así de tres mujeres y un hombre, procedentes de Caaguazú, Asunción, Alto Paraná y Central, cuya edad oscila, uno entre los 40 a 59 años, y tres de 60 años o más.

Ministerio de Salud
@msaludpy

Informe #COVID19 I 31 de diciembre:

❗ Procesamos 4.975 muestras, 903 positivos.

❗ 4 fallecidos. Total: 16.629.
40 a 59 años: 1 (dosis completa).
60 años y más: 3 (2 dosis completa, 1 no vacunado).

6:10 p. m. · 31 dic. 2021

Leer toda la conversación en Twitter

419 Consulta la información más reciente sobre la CO...

Leer 37 respuestas

Le puede interesar: Ómicron en Paraguay: "La transmisión ha aumentado muchísimo, pero no la internación", dice infectólogo

Asimismo, el número de personas hospitalizadas también va en aumento, pues se registran 143 personas internadas, de las cuales 46 están en las unidades de terapia intensiva (UTI) luchando por su vida. De entre los internados en UTI, 31 son no vacunados, 12 tienen dosis completa y 3 dosis incompleta. La buena noticia es referente al número de recuperados que a diario se registra, en la fecha es de 101, sumando así 448.025.

Números del 2021

De acuerdo al recuento realizado, en todo el año 2021 se reportaron en Paraguay un total de 360.093 casos positivos de COVID-19 y 14.247 fallecidos a causa de la letal enfermedad. De esta manera, este año se superó abismalmente los números reportados en todo el 2020, cuyo detalle indica que en los 365 días del año pasado unas 107.932 personas se contagiaron con la enfermedad en nuestro país y 2.382 perdieron la vida a raíz del coronavirus.

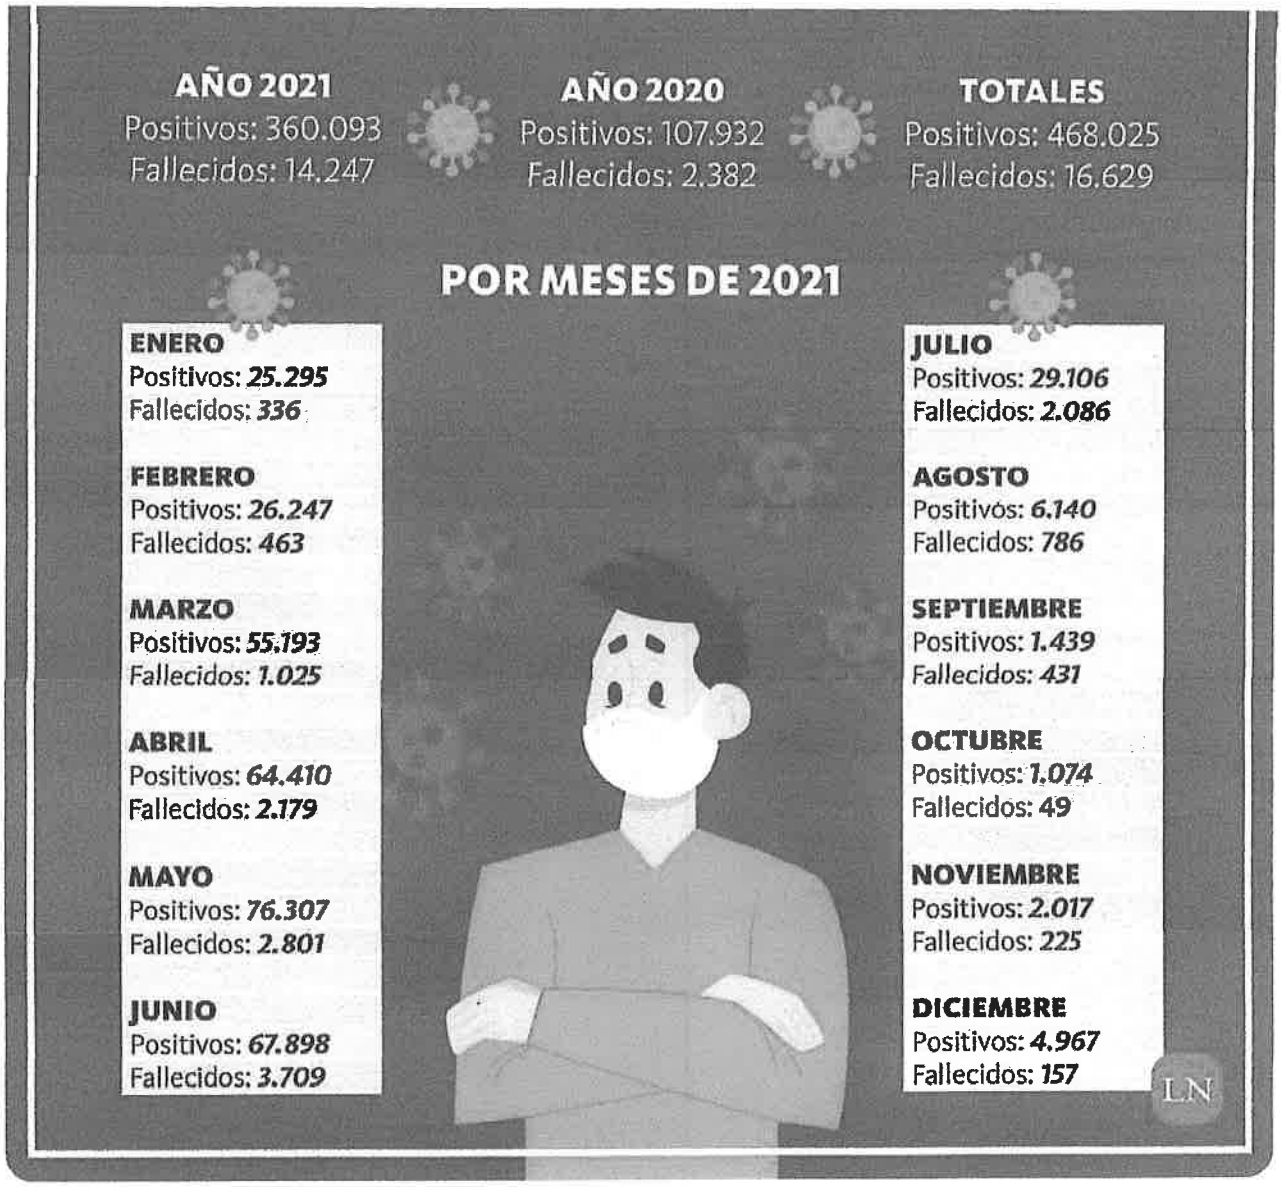

Cuidados

El ingreso de la nueva variante ómicron sería el responsable del aumento de los casos, además del relajamiento de gran parte de la ciudadanía, pues en buses y muchos lugares se dejó de usar las mascarillas, y en algunos comercios ya no se exige el lavado de manos. Asimismo, la gente no escatima a la hora de juntarse y muchas veces lo hace sin respetar el distanciamiento correspondiente y sin el tapabocas.

Leer más: El 30% de los casos positivos del jueves sería por la variante ómicron

PAÍS

18 DE ABRIL DE 2022, 12:34

Estudiantes podrán dar clases y permanecer al aire libre sin tapabocas, aseguran desde el MEC

Compartir en redes

Este lunes se derogó la Ley Nº 3.456 que declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante la pandemia, por lo que el uso de tapabocas ya no es obligatorio ante la baja cantidad de contagios de COVID-19, hospitalizaciones y decesos durante once semanas consecutivas a nivel país. El ministro de Educación, Nicolás Zárate Rojas, adelantó que los estudiantes de escuelas y colegios podrán acceder a clases sin utilizar las mascarillas.

En tanto, las autoridades sanitarias recomiendan seguir utilizando el tapabocas de manera consciente e inteligente en lugares cerrados como supermercados, donde no existe circulación de aire o ventilación adecuada, en el transporte público, escuelas y colegios, pero sobre todo en hospitales públicos y privados.

En ese sentido, Zárate Rojas señaló que la cartera de Estado preparará un protocolo especial sobre el uso de las mascarillas dentro de las aulas o al aire libre tanto para los estudiantes como para los docentes y funcionarios educativos. Adelantó que tanto en clases como al aire libre ya no se utilizarán los tapabocas.

"Se puede estar sin tapabocas en clases, siempre y cuando no haya otro compañero con síntomas. Esos compañeros deberán seguir usando tapabocas. Vamos a liberar el tema del uso de tapabocas al aire libre y con recomendaciones de uso en caso de presentar síntomas o cuadros sospechosos", expresó el titular del MEC en contacto con 730 AM.

Lea también: El Ejecutivo derogó la ley que establece el uso obligatorio del tapabocas

que la resolución regirá tanto para instituciones públicas, privadas y subvencionadas.

"El lineamiento es que esta misma tarde vamos a reunir al equipo técnico para ajustar nuestro protocolo conforme al decreto que ha salido. Tenemos que sacar una resolución modificando el protocolo. Vamos a dar mucho énfasis en el tema de la aireación, de mantener las ventanas abiertas. Vamos a seguir el 100% de las recomendaciones emanadas del decreto", detalló Zárate Rojas.

Esta mañana, el Ejecutivo dejó sin efecto la declaración de emergencia sanitaria ante el COVID-19, así como las medidas previstas en los decretos Nº 3.442 del 9 de marzo y Nº 3.456 del 16 marzo del 2020. La situación se basa en informes del Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica mejorada en el país.

Lea también: Apelan al uso consciente del tapabocas ante inminente derogación de ley

Etiquetas: #tapabocas #pandemia #uso obligatorio #ministerio de Eduación #Nicolás Zárate Rojas

Dejanos tu comentario

0 comentarios Ordenar por **Más recientes**

Agrega un comentario...

Plugin de comentarios de Facebook

También te puede interesar

PAÍS

La tercera ola marcó récords de contagios, pero con menos muertes

10 DE FEBRERO DE 2022

Comparaciones. Los números de la tercera ola van disminuyendo cada día. La situación es diferente de la que se vivía hace un año aproximadamente.

El 9 de febrero del 2021, el Ministerio de Salud Pública reportaba 874 nuevos contagios. Dicha cantidad ya iba reafirmando que el país estaba en el ascenso de la curva de la segunda ola. El promedio de casos por día era de 762. Durante ese periodo, que ya venía viéndose desde finales de noviembre, hubo días en que se llegó a 1.000 nuevos contagios confirmados. Posteriormente la cantidad fue incrementándose. Para final del segundo mes del año el promedio cada siete días en cada jornada estaba en 1.108. El 28 de febrero había terminado con 937 casos. Marzo ya mostraba que la epidemia estaba superando todo lo visto antes en el país. Dicho mes culminaba con un promedio de 1.978 casos por día cada semana. El 31 de marzo culminó con 1.976 nuevos infectados. Para abril, en que se empezó a sentir más el drama social a causa del Covid, el promedio con que dicho mes culminaba llegaba a 2.278 contagios por día. Mayo y junio fueron los meses donde la situación se desbordó por completo. El drama social se intensificó, a la par de contagios y muertes a diario. La falta de camas de Terapia Intensiva, la falta de insumos, la lista de espera a UTI que superaban los 200 y los contagios diarios pusieron al sistema de salud en un drama único. A 2.813 llegaba la cantidad de contagiados a diario cuando cerraba el quinto mes. Al culminar junio dicha cifra diaria había descendido a 1.667. El 31 de mayo terminó con 2.696 casos en dicho día, mientras que el sexto mes del año cerró con 1.693 contagios. La actual ola que se inició a finales de diciembre ha batido récords en cuanto a la cantidad de contagios diarios. Entre dicho mes y enero, se tuvieron días en que fácilmente se superaban los 4.000 y 5.000 contagiados confirmados. La mayor cantidad fue de 6.853. Los nuevos casos cuadruplicaban y hasta triplicaban el promedio que se dio durante la segunda ola.MuertesEste es el

del país. La tercera tuvo un poco la combinación de ambas, iniciándose en el Este, llegando poco después al área metropolitana y expandirse. Cuando los números de los contagios superaban por lejos lo visto anteriormente, se temió que la cantidad de fallecidos superara a lo ocurrido entre mayo y junio.En esos meses, la cifra iba subiendo cada día, siendo más de 100. El 27 de julio se registró la mayor cantidad de decesos Covid, llegando a 152. Ya en abril el promedio estaba entre 70 y 80 decesos a causa del virus y sus complicaciones. Al panorama se sumaba la demora en la entrega de las vacunas que se habían adquirido de Covax. En una entrevista que había tenido con ÚH, el ex director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, había admitido que si los biológicos anti-Covid llegaban antes, podrían haberse salvado más vidas de pacientes.La inmunización de la población, que aún sigue siendo baja para las expectativas que se tuvieron, más la presencia de una variante menos agresiva permiten que el número de muertes sea mucho menor. El número oscila entre cifras cercanas a los 40 y 50, generalmente.

Virus persistente

Retrospectiva. Hace un año se empezaba a vislumbrar la segunda ola.

6.853
es el número más alto de contagios que registra Paraguay en casi dos años de la pandemia, el 31 de enero pasado.

152
fue la cantidad más alta de muertes a causa del Covid, que se registró en un día en el país, el 27 de junio.

Te puede interesar

PAÍS

Tras confinamiento, se dispara el flujo de pasajeros en días santos

PAÍS

La Semana Santa también se podrá sentir con ÚH Podcast

PAÍS

María Serrana: Plantean que

PAÍS

Comuna recibe multa millonaria por

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00006041

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000834

OBRA: Penitenciaria Guboseada Lote 01
UBICACIÓN: Guboseada
FECHA: 1º / 01 / 2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

1er día del año nuevo
Sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982972372, 05 Tel. 5043, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

0000040

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000835

OBRA: Penitenciaria Encarnada lote 01
UBICACIÓN: Encarnada
FECHA: 2/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Domingo sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tel. 503 NE711, 980. 082021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moremondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000039

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000836

OBRA: Penitenciaria Emboscada lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 3/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso. 29 mm caidos

INFORME DIARIO:

Sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0[illegible]772372, 05 Tel. 50[illegible] N[illegible]730-880, 06/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mopyrondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000837

A: Penitenciaria Emboscada Lote 01

ACIÓN: Emboscada

A: 4/01/2022

DO DEL TIEMPO: Soleado

ORME DIARIO:

- Coloc. de Cableado y marco para spot (int electrico) fachada Celda 8
- Celda 7: arreglo de muros c/enduido cementicio
- P.T.E.: armadura de muros.
- Celda 3: plomería baño de celda
- Coloc. de chapas metálicas techo Pasillo de Interconexión
- Celda 6: arreglo de muros y base de pintura

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moromondcha
Ministerio de JUSTICIA

00006037

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000838

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 5/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Semisoleado

INFORME DIARIO:

- Armadura de muros de PTE.
- Pintura base y enduido cementicio p/ aneglo en Celda 6 PB
- Celda 7: Pintura base de muros PB
- Prep. y carga de cuneta entre Celdas 6 y 2
- Pintura base de Bigiuetas PA Celda 8
- Plomería Celdas 3 y 7
- Prep. y carga de cuneta paralela a muro perimetral protem.
- Color. de picapate en Taller 4 PB y PA

OBSERVACIONES: Reducción personal albañilería y falta de herrero por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 770312, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Monopolio
Ministerio de JUSTICIA

00000036

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000839

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 6/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Armadura de muros de PTE.
- Celdas PB y PA Celdas 6 y 7
- Celda 7 cableado p/ puntos de celda
- Plomería: colocación blíster Celda 7

OBSERVACIONES: Falta de personal pintores, pausa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 723 205 Tel. Asu. 021 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Monomondeia
Ministerio de JUSTICIA

00000035

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000840

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 7/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Semisoleado

INFORME DIARIO:

- Cableado p/ puertas Celda 6
- Prep. y armadura p/ registro pluvial lado izquierdo frente
- Celda 8: pintura de pared PB y PA
- Celda 6 y 7: base de pintura de muros
- PTE: armadura de muros

OBSERVACIONES: La armadura del muro 2 de la PTE debe ser reforzado, pues el solape quedó de 60cm entre los "bigotes" que emergen de la platea, y los hierros verticales de 16 del muro. / Falta personal albañilería COVID causa

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]2, 05 Tel.: 50[illegible] NT01 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moremondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000034

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000841

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01

UBICACIÓN: Encarnación

FECHA: 8/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

INFORME DIARIO:

- Armadura de muros PTE. (interno placa ancl)
- Limpieza general, remoción de tierra desechable

OBSERVACIONES: Falta de personal pintor y electro por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moroinondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000033

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000842

OBRA: Penitenciaria Encarnación
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 9/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: lluvia - 42 ml.

INFORME DIARIO:

Domingo sin actividades.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 372, 05 Tel. 503 N°731-980 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mokoitenondeguia
Ministerio de JUSTICIA

00000032

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000843

OBRA: Penitenciaria Guboseada Lote 01
UBICACIÓN: Guboseada
FECHA: 10/01/2022.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado – mucho barro debe llovió de domingo

INFORME DIARIO:

- Coloc. de armadura en Celdas 8, puerta
- Plomería: Celdas 6 y 7, sistema de acometida de agua
- PTE: armadura y placa de encofrado
- Celdas 6 PA: enlucido cementicio y aneglo de viguetas.
- Aneglo de piso y limpieza Pasillo de hotel conexion PA
- Falta y disminución de personal causa COVID 19

OBSERVACIONES: Sobre la armadura del muro 2, la Fiscalización ha remitido el detalle al Ing. S. Garilan, especialista estructural a fin de que se pronuncie sobre la manera de subsanar el inconveniente. Ya ha enviado los detalles con las directivas a ser implementadas, los refuerzos.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05 Tal. 50-3, N°721, 980, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moroniondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000031

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000844

OBRA: Penitenciaria Encoseada lote 04
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 11/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- P.T.E: encofrado con placas, en la parte interior de la caja, esperando subsanar el inconveniente del solape, conforme a la directiva del Ing. Sergio Barilari; se están completando con refuerzos de ø1/6 de 1m, y estribos de ø de 1/8 acorde a los detalles recibidos del Ing. Barilari, especialista de la Fiscalización.
- Celda 6: Coloc. de cerradura de puerta. - Pintura base de muros y angeles c/ enduido cementicio. -
- Plomería interior: prep. de cañería p/ Celdas 6 y 7.
- La Fiscalización ha aprobado la ubicación de los accesorios de baño (Jabonera, toallero y portarrollo de la celda.
- Falta de personal pintor por causa COVID 19

OBSERVACIONES: La Fiscalización ha observado a la Contratista sobre la necesidad de que estén en obra los residentes encargados del cargamento de la PTE. Uno está de vacaciones, otro está ausente por problemas personales. Solo está a cargo un arquitecto, p/ toda la obra.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0981 172372; 26 Tel. 601 N°731-080, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mororomdeha
Ministerio de JUSTICIA

00000030

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000845

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 12/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Coloc. de jaboneras y accesorios Celdas 8 PA.
- Celdas 7: armado de muros y viguetas PA-base de pintura y enlucido cementicio.
- Pabellón de interconexión: coloc. de canaletas en base d. limahoyas.
- Celdas 6: plomería externa acomet. desague.
- " : cunetas perimetrales
- PTE: completando armadura y refuerzos adicionales del encofrado parcial interior de la Capilla.

El Ing. Sergio Carilán, esp. estructural de la Fiscalización, estará en Obra, el 14 de Enero ameritado su presencia, para explicar in situ, la mejor manera para encarar el cargamento parcial de los muros, sobre la adherencia en el corte p/el sgte cargamento, la aislación entre la platea y el muro (ya considerada con la aislación de goma) etc.

- Falta de personal electro por causa COVID 19.

OBSERVACIONES: La Contratista se compromete a que el Ing. Residente a cargo, esté presente para las directivas y el cargamento.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 099 172372, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mororomiña
Ministerio de JUSTICIA 00000029

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000846

OBRA: Penitenciaria Curoseada Lote 01
UBICACIÓN: Curoseada
FECHA: 13/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

INFORME DIARIO:

- Prep. cureta entre Celdas 4 y muro de seguridad.
- Desagote de aguas acumuladas en patio.
- Pasillo de interconexión: alzado de chapas metálicas sobre estructura de techo.
- Plomería externa Celdas 6.
- PTE: siguen los trabajos de color. de refuerzos en muro 2.
- Las placas p/ encofrado ya están estocadas en obra. Pero no se va a continuar hasta después de la directiva del Ing Carlos.
- Falta de personal electro y pintor causa COVID 19

OBSERVACIONES: La Fiscalización ha observado que en una parte de piso de hormigón, hay algunas fisuras, que serían porque no se hicieron las juntas de dilatación que la Contratista explicó al hacerlo con unos corte. Ahora han contratado para hacer lo necesario p/ subsanar el inconveniente

Lilia Filartiga

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 372372, 05 Tel. 50x3, N°731- 980, 08/2024

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moromondeha
Ministerio de JUSTICIA 00000028

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000847

OBRA: Penitenciaria Guboseada Lote 01

UBICACIÓN: Guboseada

FECHA: 14/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: semi soleado

INFORME DIARIO:

- Visita del especialista en estructuras de la Fiscalización: Ing. Sergio Gavilan, para dar algunas directivas sobre el cargamento y detalles de la Planta de Tratamiento de Efluentes PTE.
- Colocación de vidrio templado en PB Administración en puerta de entrada y ventana grande.
- Colocación de placa c/puerta en Consultorio de PB Administración.
- Preparación y carga de viga de fundación de muro de seguridad entre Administración y patio de Visita
- Falta de personal pintores, electricos y plomero a causa COVID 19

OBSERVACIONES: La Fiscalización ha observado que las chapas transparentes de plastico, del techo de Celda 4 ha volado c/ el viento, inclusive trozos han caido en la PA la Contratista debe de hacer ajustar y mejorar la colocación a fin de q' no suceda de nuevo.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moroondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000027

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000848

OBRA: Penitenciaria Encarnada Lote 01
UBICACIÓN: Encarnada
FECHA: 15/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Limpieza de patios

OBSERVACIONES: Falta de personales por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]72, 05 Talcos3 - [illegible] 989-08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mororomdeha
Ministerio de JUSTICIA

00000026

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000849

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 16/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Domingo sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez

Lilia Filartiga
FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Constructora Aponte Latorre S.A.
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982/17[illegible], 05 Ta[illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mokomondicha
Ministerio de JUSTICIA

00000025

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000850

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 17/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Picado de base de muros laterales en planta, para mejor adherencia, mayor rugosidad!
- Coloc. de accesorios de baño Celda 4 PB.
- Pintura de base y arreglo de muros Celda 6 y 7 PA
- Prep. para registro pluvial frente a Celda 5 MS
- Plomería externa salida cloacal PB Celda 4
- Herrería: coloc. de armaduras en Taller.
- Falta de personal hecho causa COVID 19

OBSERVACIONES: En el registro pluvial frente a Celda 5, se hará un pequeño desvío de la cuneta y el registro, a fin de evitar el dado de cimiento del muro de seguridad, para luego conectar la cañería de 300 mm

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Contratista: Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0981-772372/0981-641 704 - 0981-177 591 - 0985 [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000851

: Penitenciaria Encoseada Lote 01

CIÓN: Encoseada

: 18/01/2022

DO DEL TIEMPO: semi soleado

RME DIARIO:

- Siguen los trabajos previos para el encofrado de muros de la P.T.E.: Picado de base, ajuste de goma aislante.
- Pintura de abertura ventana metálica de fachada de Celda 8
- Plomería: Caños de desagüe cloacal salida interior de Celda 4
- Remoción de tierra desechable en frente a Celda 4 y muro de seguridad.
- Rellenos y nivelación de alisado de baños en Celda 8 PA
- A probación de los trabajos previos (picado y goma del muro 2 de la P.T.E. para empezar a colocar encofrado.

Falta de personal y disminución laboral COVID 19

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000023

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000852

OBRA: Penitenciaria Emboscada lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 19/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado.

INFORME DIARIO:

- Encofrado del muro 2 de la P.T.E. y sigue para el cargamento parcial
- También ya fueron aprobados los trabajos previos de los muros 6, 13 y 14 para poder encofrar.
- Cuneta frente a celdas 6, prep. y cargamento.
- Prep. de muro de seguridad entre Administración y patio de visitas.

OBSERVACIONES: Falta de personal plomero y electro por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 098[illegible]72372, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moromondicha
Ministerio de JUSTICIA

00000022

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000853

OBRA: Penitenciaria Guboseada Lote 01

UBICACIÓN: Guboseada

FECHA: 20/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- P.T.E.: cerramiento de encofrado
- Muro de seguridad entre Administración y patio de Visitas: armaduras
- Celdas 4: Cableado eléctrico
- Celdas 6: cargamento de cumbrera facha.
- Celdas 1 PB: amegh de puerta y muros
- Celdas 8 PB: amegh de piso de baños

OBSERVACIONES: Falta de personal pintor causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible] 05 Talleres [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moromondeha
Ministerio de JUSTICIA
00000021

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000854

OBRA: Penitenciaria Guboseada Lote 01
UBICACIÓN: Guboseada
FECHA: 21/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

- Ejecución de mampostería de P.T.E
- Armadura de muro de seguridad entre Administ y Patio de Visitas
- Celdas 8 PB: arreglo de piso de baño
- Taller 4 PA: coloc. de puerta
- Preparación de cunetas Celdas 6
- Celdas 6 PB: cableado eléctrico
- Celda 4 PB: coloc. de jabonera y accesorios
- Celdas 1 PB: arreglo de muros - relleno piso baño
- Celdas 6 y 7: pintura base PA.

OBSERVACIONES: Disminución de personal por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]372, 05 Tel. 50x3, N731, 010, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000020

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000855

OBRA: Penitenciaria Cubosecada Lote 01
UBICACIÓN: Cubosecada
FECHA: 22/01/2022.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Preparación de cunetas externas.
- Limpieza de patios

OBSERVACIONES: Falta de personales por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]72, 05[illegible] Timbrado: [illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000019

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000856

OBRA: Penitenciaria Cuboseada Lote 01
UBICACIÓN: Cuboseada
FECHA: 23/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Domingo: sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]2, 05 Tel.: 594 [illegible] 980 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moroondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000018

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000857

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 24/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: Semi nublado

INFORME DIARIO:

- Armadura de muro de seguridad entre Administración y patio de Visita
- Prep. de cunetas y anegl de registros cloacales Celda 3
- Celdas 8: reparación de pisos de baños
- Pasillo del interconsumo PA: coloc. de chapas metálicas en ochava.
- Celdas 5 PA: coloc. de rejas de seguridad
- Coloc. de persianas metálicas p/ celdas 8
- Celdas 3 PA: cableado eléctrico.

OBSERVACIONES: Disminución de personal de herrería y pintor por causa COVID 19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]72, 05 Tel. 523-N°731-930, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000858

A: Penitenciaria Encarnación Lote 01

ACIÓN: Encarnación

A: 25/01/2022

DO DEL TIEMPO: Soleado

ORME DIARIO:

- Celdas 8: colocc. de persianas en ventanas PA.
- Celdas 6: pintura de siguetas y enrodado.
- Celdas 3: Cableado eléctrico PA.
- Celdas 1 PB: relleno de sanitario de baños
- Celdas 4 PB: colocc. de cerraduras eléctricas en puertas
- Armadura de muro de seguridad todo alrededor
- Anegado y preparación de piso de baño en celdas 8 PB

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000016

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000859

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 26/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: nublado

INFORME DIARIO:

PTE: Cargamento de muros: 2, 6, 13 y 14. Se comenzó a las 6 y 30 de la mañana. En el ultimo mixer se agregó hielo al agua para la temperatura del ambiente elevada. No hubo inconvenientes.
- Armadura de muro de seguridad lado Visita
- Amurado y preparación de pisos de baño Celdas 8 PB
- Relleno sanitario de baños Celdas 1 PB.

OBSERVACIONES: Falta de personal herrero y pruebas por causa COVID-19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 7[illegible]72, 05 Tel. 50[illegible] N°[illegible] - 030-08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000860

A: Penitenciaria Encarnación Lote 01

ACIÓN: Encarnación

A: 27/01/2022

DO DEL TIEMPO: Semi Soleado

ORME DIARIO:

- Revoque de mochetas de paredes PA Pasillo de Interconexión.
- Celda 4: prep. de cunetas pluviales
- Cableado eléctrico Celda 3PA
- Coloc. de cerradura eléctrica puerta Celda 4
- Relleno sanitario baños Celda 1 PB.
- Plomería: exterior Celda 3 PB
- Coloc. de rejas de seguridad Celda 5 PB
- Techo de chapa metálica en Vestíbulo de entrada principal a Administración.
-

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mokomondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000014

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000861

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 28/01/2022.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Desencofrado de PTE.
- Conformado de cuneta Celda 4
- Relleno sanitario baños Celda 1 PB
- Plomería esterior de acometida de agua y salidad cloacal. Celda 3
- Pared de cerramiento PA pase de techo Celda 4
- Relleno de hormigón en artefactos de baño Celdas 3 PA
- Coloc. de cenicaros Celdas 2 PA.

OBSERVACIONES: Falta de personal electros causa COVID 19.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 05-Tel.-503, N°751- 980, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mozponderia
Ministerio de
JUSTICIA

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000862

A: Penitenciario Encarnación lote 01

ACIÓN: Encarnación

A: 29/01/2022

DO DEL TIEMPO: Soleado

ORME DIARIO:

- Limpieza de patios
- Plomería exterior Celdas 7 PB

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000012

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000863

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 30/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Domingo: sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 778372, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021
APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000011

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000864

OBRA: Penitenciaria Cmbaseada Lote 01
UBICACIÓN: Cmbaseada
FECHA: 31/01/2022

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

INFORME DIARIO:

- Reunión en el MOPC, entre la directora de Obra del MOPC, representante de la Contratista Aponte Latorre del Lote 1 Residente; Supervisor del MOPC p/el Lote 1; la Fiscalización: Residente y Representante Técnico.
- En Obra: Desencofrado de PTC
- También a la tardecita reunión en Obra entre la Fiscal, Residente de la Contratista y Director Técnico de la Contratista Ing. Idris: se consideró un Cronograma de trabajos, para encarar los trabajos q' faltan p/ la terminación de la Obra, en el Plazo del Convenio 4
- Armado y encofrado de registro pluvial en patio frente a Casa de máquina.

OBSERVACIONES: Falta de personal planero y electro por causa COVID-19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0983 [illegible]372, 05 Tel. 50x3-N791-990, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Motenondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000010

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000865

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01

UBICACIÓN: Emboscada

FECHA: 01/02/2022.

ESTADO DEL TIEMPO: Semisolado

INFORME DIARIO:

- P.T.E. Coloc. de encofrado parcial muros 2, 6, 17 y 19.
- Registro pluvial de hormigón en patio frente a Casa de máquina: Cargamento.
- Plomería interior; ensamble de acometida de agua, interior Celda 8.
- Coloc. de persianas en ventanas de Celd. 8 Pa
- Celdas 6, 7, 2 y 4 PA pintura de muro base, y enlucido cementicio.

OBSERVACIONES: Disminución de personal razón COVID19

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Laterre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0983 [illegible]2372, 05[illegible]

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

ORRE
TORA

TEKOJOJ/
Moronondcha
Ministerio de
JUSTICIA

	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000866

ıa Embaseada Lote 01
eada

leado

de vidrio templado en Garita en lado izquierdo
le cunetas costado de Celda 3
vería exterior en Celda 2
heta de muros y vigas en Pasillo de interconexión
.. de cerradura eléctrica Celda 1 PA PA
amento de hormigón en artefactos sanitarios
las 2 y 7 PB
.. de accesorios de baño Celda 7 PB
ina de persiana metálica de ventana
Celda 8

0000866

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Moroni ndeha
Ministerio de JUSTICIA
0000008

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000867

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 03-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia madrugada 23 hs. Seminublado de mañana de noche comienzo a llover

INFORME DIARIO:

- Cargamento de losa de PTE
- " " cunetas, cortados Celdas 3 y 4
- " " HO en artefactos de baño inodoro y lavatorio Celdas 2 y 3
- Coloc. de Jabonera y papelera Celdas 7 PB
- Reparación de varios registros cloacales rotos
- Coloc. de hojas de puertas Taller 1 PA.
- Revoque de mochetas Pasillo de intersección PA
-

OBSERVACIONES: Falta de personal electro por causa COVID19

ING. RESIDENTE
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
Constructora Aponte Latorre S.A.

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0983 222372, Ruta Nº 6 Km 175 | 20/08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mororomiñoha
Ministerio de JUSTICIA 00006007

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000868

OBRA: Penitenciaria Encoseada Lote 01
UBICACIÓN: Encoseada
FECHA: 04-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: Amaneció con sol, soleado a la mañana luego a la tarde comenzó a nublar

INFORME DIARIO: 44 mm. caídos

- Desagote de agua en los patios por lluvia de la noche anterior
- Carga de Hº en artefactos de Celda 2 PA
- Reparación de registros cloacales
- Encofrado de muros de PTE
- Coloc. de hoja de reja en puertas detalles y
- Plomería exterior en Celda 1 (Salida)
- Coloc. de accesorios (Jabs y papel) en Celda 7 PB
- " " " " " " Celda 3 PB
- Disminución de personal por causa COVID 19

OBSERVACIONES: Hoy se ha recibido la visita en Obra de la Arq. Duarte, directora de Obra del MOPC. Se realizó 30' un recorrido con Residencia de la Const., la Fisc. y con los supervisores Arq. Martínez y Arq. Rolón del MOPC.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982-772372, 05 Tal. 50x3, NZ31-980, 08/2021
APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mocoondicha
Ministerio de JUSTICIA

00000006

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000869

OBRA: Penitenciaria Emboscada Lote 01
UBICACIÓN: Emboscada
FECHA: 05-02-22

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso : madrugada y todo el día

INFORME DIARIO:

Sin actividades por lluvia.

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo A... ...rguez
Repres. ...gal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0962 172372, 05 Tel. 504 N°731-980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mokomondicha
Ministerio de JUSTICIA

00006005

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000870

OBRA: Penitenciaria Emboseada Lote 01
UBICACIÓN: Emboseada
FECHA: 06-02-2022

ESTADO DEL TIEMPO:

INFORME DIARIO:

Domingo sin actividades

OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982 [illegible]72, 05 Tal. 50x3, N°731- 980, 08/2021

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mororomdeha
Ministerio de JUSTICIA

00006004

CONTRATISTA APONTE LATORRE S.A.	FISCALIZACION CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000871

OBRA: Penitenciaria Encarnación Lote 01
UBICACIÓN: Encarnación
FECHA: 07-02-2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Desencofrado de muros de PTE.
- Carga de Hº en artefactos de baño Celda 7 PB
- Colocac. de hojas de puertas en Talleres
- Prep. p/ Colocac. de falsoraso en Celda 2 PB
- Revoque de mochetas en Pasillo de Inter Consumo PA.

Falta de personal electro por causa COVID 19

OBSERVACIONES: La Fiscalización insta a la Contratista a aumentar la cantidad de personal en Obra, a fin de adelantar los trabajos en todos los rubros, en la necesidad de llegar a tiempo para la finalización de las obras, conforme al Convenio 4 presentado.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 0982/772372, 05 Tal. 50x3, N°731- 960, 08/2021

APONTE LATORRE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TEKOJOJA
Mokomondeha
Ministerio de JUSTICIA

00000002

CONTRATISTA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS DEL MTESS
APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	

CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AD REFEREDUM AL PGN 2019
LOTE 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0000873

OBRA: Penitenciaria Guaboreado Lote 01
UBICACIÓN: Guaboreado
FECHA: 09-02-2022

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

INFORME DIARIO:

- Revoque de mocheta de paredes de Pasillo de Interconexión PA
- Azulejado en baños de Pab. de Cocina y Servicios en PA
- Coloc. de estructura de techo metálico en el Pasillo de Interconexión de PA.
- Encofrado de muro de PTE.
- Reparación de registros cloacales
- Parapetos levantados, de terminación en duchero de baños de PB Celda 8
- Comenzaron los trabajos de PCI en PB del Pasillo de Interconexión
- Falta de personal de plomería causa covid 19

OBSERVACIONES: Conforme a las directivas de la Asesora Ducto directivas de Obras MOPC, se procedió a agregar un parapeto de 5cm, de terminación del duchero de baño de Celda 8, que no estaba previsto original mente en planos.

ING. RESIDENTE
Constructora Aponte Latorre S.A.
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

FISCALIZACION
Lilia Filartiga
Arquitecta

Original: Contratista
Duplicado: Fiscalización
Triplicado: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Trabajo

JE Impresiones, Cel.: 098[illegible]2372, 05 T.L 50x3, N°731, 380, 08/2021

APONTE LATORRE
