CONSORCIO

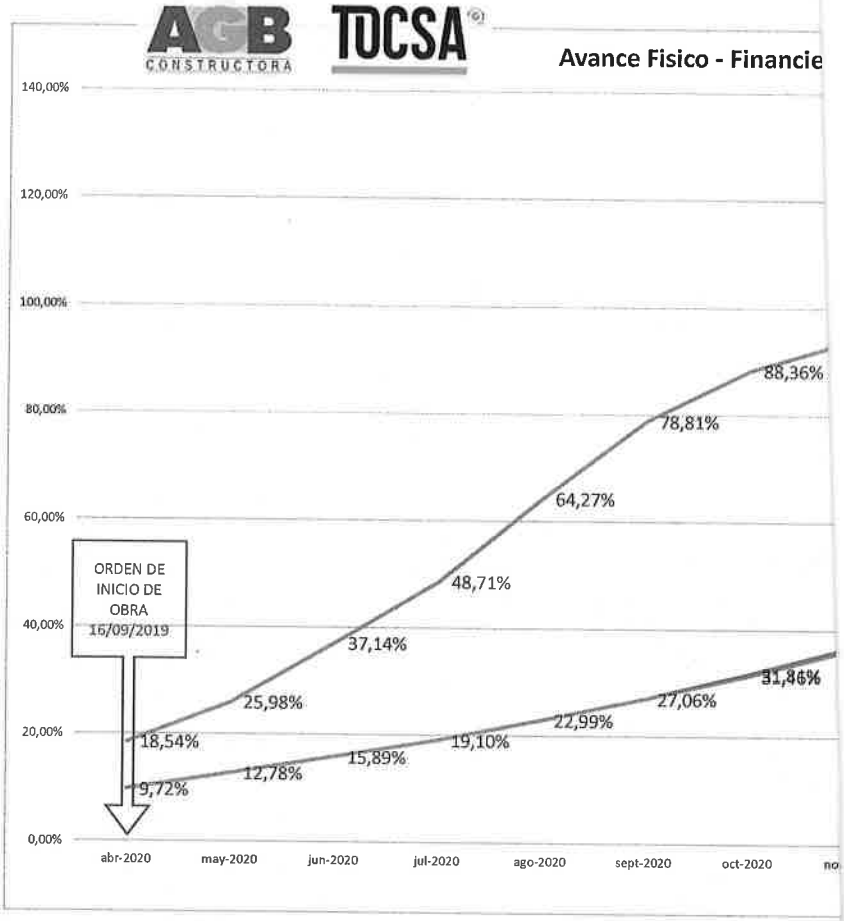

	Fecha Mes	abr-2020 9	may-2020 10	jun-2020 11	jul-2020 12	ago-2020 13	sept-2020 14	oct-2020 15	nov-2020 16
CRONOGRAMA CONTRACTUAL	Avance Mensual	4,06%	7,44%	11,16%	11,57%	15,56%	14,54%	9,55%	5,85%
	Avance Acumulado Contractual	**18,54%**	**25,98%**	**37,14%**	**48,71%**	**64,27%**	**78,81%**	**88,36%**	**94,21%**
CRONOGRAMA CONVENIO MODIFICATORIO Nº2	Avance Mensual	2,10%	3,06%	3,11%	3,21%	3,89%	4,07%	4,75%	5,16%
	Avance Acumulado CM Nº2	**9,72%**	**12,78%**	**15,89%**	**19,10%**	**22,99%**	**27,06%**	**31,81%**	**36,97%**
CRONOGRAMA CONVENIO MODIFICATORIO Nº3	Avance Mensual	2,10%	3,06%	3,11%	3,21%	3,89%	4,07%	4,40%	5,01%
	Avance Acumulado CM Nº 3	**9,72%**	**12,78%**	**15,89%**	**19,10%**	**22,99%**	**27,06%**	**31,46%**	**36,47%**

0000060

sesenta

ro - Penitenciaría Minga Guazú - CONSORCIO AGB-TOCSA - Convenio Modificatorio Nro 3

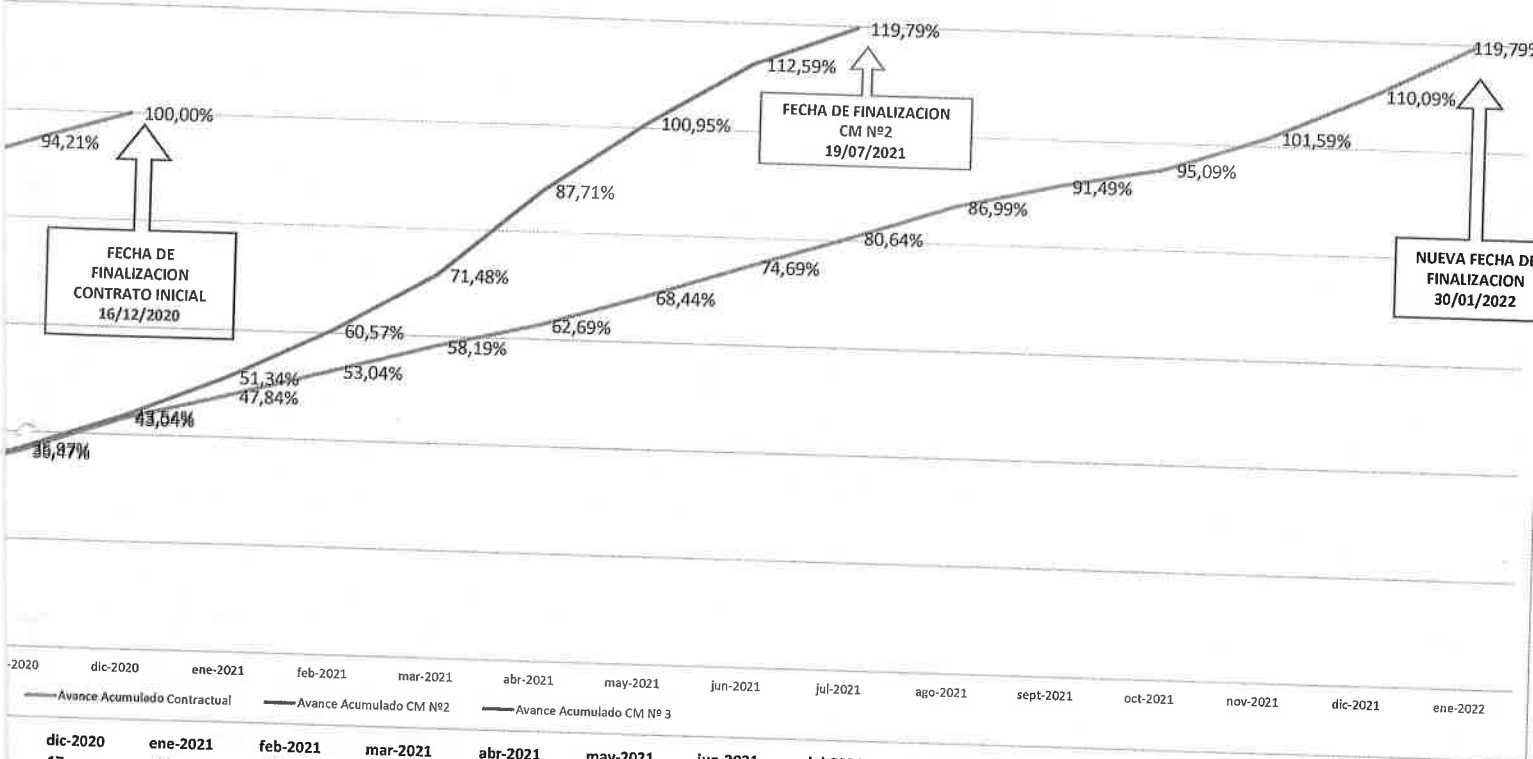

	dic-2020 17	ene-2021 18	feb-2021 19	mar-2021 20	abr-2021 21	may-2021 22	jun-2021 23	jul-2021 24	ago-2021 25	sept-2021 26	oct-2021 27	nov-2021 28	dic-2021 29	ene-20 30
	5,79%													
	100,00%													
	6,57%	7,80%	9,23%	10,91%	16,23%	13,24%	11,64%	7,20%						
	43,54%	**51,34%**	**60,57%**	**71,48%**	**87,71%**	**100,95%**	**112,59%**	**119,79%**						
	6,57%	4,80%	5,20%	5,15%	4,50%	5,75%	6,25%	5,95%	6,35%	4,50%	3,60%	6,50%	8,50%	9,7
	43,04%	**47,84%**	**53,04%**	**58,19%**	**62,69%**	**68,44%**	**74,69%**	**80,64%**	**86,99%**	**91,49%**	**95,09%**	**101,59%**	**110,09%**	**119,7**

Sara Blanco
Representante Legal

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	**LPN 131/2019 - CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - MINGA GUAZU**	**jue 21/11/19**	**dom 30/1/22**
2	1. Trabajos Preliminares Generales	jue 21/11/19	mié 18/12/19
3	1.1 Movimiento de Suelo	lun 27/1/20	dom 22/3/20
4	2. Limpieza final de obra	mié 13/10/21	dom 30/1/22
5	3. Facilidades para la supervision	jue 21/11/19	mié 18/12/19
6	Aprobacion Impacto Ambiental	jue 21/11/19	jue 21/11/19
7	LLEGADA DE ENCOFRADOS DE FORSA	sáb 6/6/20	sáb 6/6/20
8	**4. PABELLÓN CELDA DE INTERNOS - PLANTA BAJA (Cantidades establecidas para 7 pabellones)**	**lun 27/1/20**	**jue 23/12/21**
9	4.1. Trabajos Preliminares	lun 27/1/20	dom 23/2/20
10	4.1. Trabajos Preliminares	lun 27/1/20	dom 23/2/20
11	4.1.1. Regularización de Suelo para sello	lun 27/1/20	mié 19/2/20
12	4.2. Estructuras de HºAº	jue 30/1/20	mié 24/3/21
13	4.2.1. Sello de Hormigón	jue 30/1/20	vie 6/3/20
14	4.2.2. Platea de Hormigón Armado	jue 13/2/20	sáb 9/5/20
15	4.2.3. Celdas de Hormigón Armado	lun 15/6/20	mié 24/3/21
16	Guarda obra	dom 4/10/20	mar 29/12/20
17	4.3. Albañilería	dom 9/8/20	dom 11/7/21
18	4.3.1 Contrapiso en baño celdas	dom 9/8/20	mar 18/5/21
19	Carpeta base de piso	dom 4/10/20	dom 11/7/21
20	Aislación de baños	dom 6/9/20	lun 14/6/21
21	4.3.2 Revoque base de azulejo en baño guardias	dom 6/9/20	lun 14/6/21
22	4.3.3 Colocacion de Revestimiento de Baños guardias	dom 20/9/20	lun 28/6/21
23	4.4. Instalaciones Sanitarias	jue 13/2/20	mié 23/6/21
24	4.4.1. Cañerías previo a la estructura de H°A°	jue 13/2/20	mar 15/9/20
25	Instalación agua corriente	mar 15/9/20	mié 23/6/21
26	Instalación desague cloacal	mar 15/9/20	mié 23/6/21
27	Instalación desague pluvial	mar 15/9/20	mié 23/6/21
28	4.4.3 Colocacion de Artefactos Sanitarios	mar 15/9/20	mar 18/5/21
29	4.5. Carpintería de Madera y Metálicas	lun 15/6/20	lun 11/10/21
30	4.5.1. Provision de Marcos Metalicos de Puertas	lun 15/6/20	jue 29/4/21
31	4.5.2. Rejas	sáb 28/11/20	lun 11/10/21
32	4.5.3. Baranda para escalera	sáb 28/11/20	lun 11/10/21
33	4.5.4. Ventanas Metalicas	sáb 28/11/20	lun 11/10/21
34	4.5.5. Colocacion de Hojas de Puertas Metalicas	sáb 28/11/20	lun 11/10/21
35	4.6. Pinturas	sáb 6/3/21	jue 23/12/21
36	4.7. Combate Contra Incendio	sáb 6/3/21	jue 23/12/21
37	4.8. Instalaciones Eléctricas	dom 4/10/20	vie 30/7/21
38	4.9. Instalaciones Señales débiles	dom 4/10/20	vie 30/7/21
39	4.10 Instalaciones de Aire Acondicionado	dom 4/10/20	vie 30/7/21
40	**5. PABELLÓN CELDA DE INTERNOS - PLANTA ALTA (Cantidades establecidas para 7 pabellones)**	**mar 23/6/20**	**mar 25/1/22**
41	5.1. Trabajos Preliminares	lun 29/6/20	lun 6/7/20
42	5.2. Estructuras de HºAº	lun 29/6/20	mié 7/4/21
43	5.2.1. Celdas de Hormigón Armado	lun 29/6/20	mié 7/4/21
44	5.3. Albañilería	lun 24/8/20	sáb 15/1/22

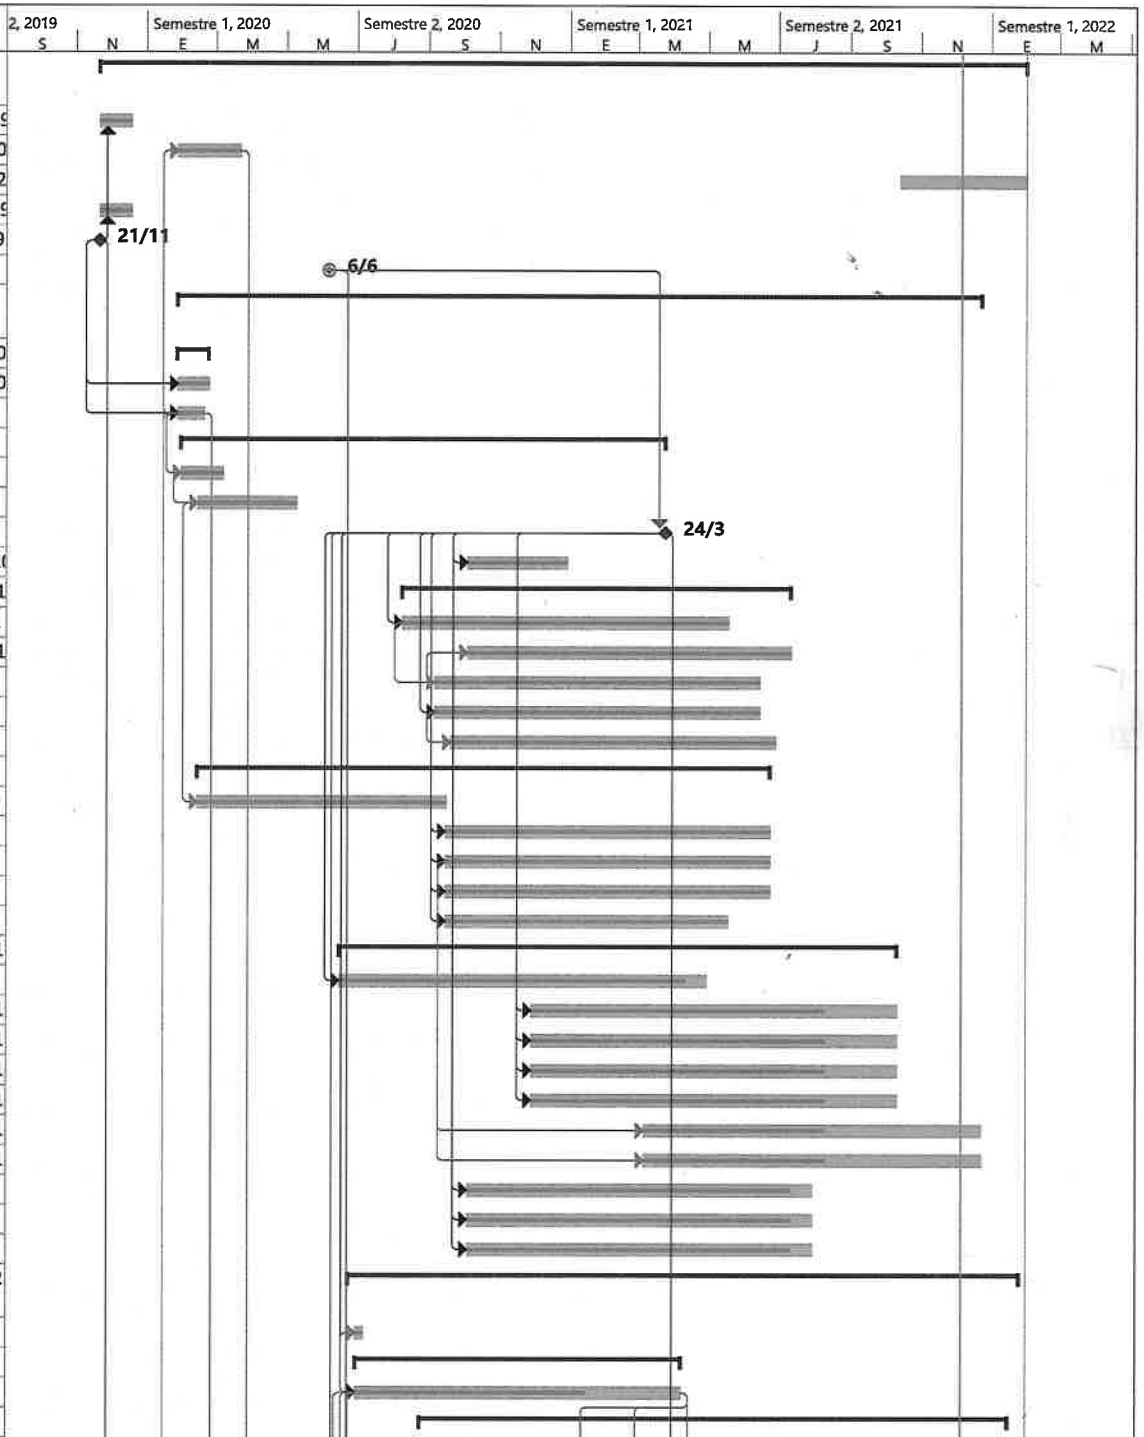

46	Aislacion de baños	lun 19/10/20	mar 31/8/21
47	Carpeta base de piso	lun 14/12/20	lun 25/10/21
48	Mampostería de elevación	lun 21/9/20	mié 4/8/21
49	Revoque de mampostería	lun 14/12/20	lun 25/10/21
50	Colocacion de pisos y azulejos en baños guardias	jue 11/3/21	sáb 15/1/22
51	5.4. Instalaciones Sanitarias	mar 23/6/20	mar 25/1/22
52	Instalaciones previas a la estructura de H°A°	mar 23/6/20	mar 23/3/21
53	Instalación agua corriente	lun 19/10/20	lun 26/7/21
54	Instalación desague cloacal	lun 19/10/20	lun 26/7/21
55	Colocacion de artefactos sanitarios	lun 26/7/21	mar 25/1/22
56	5.5. Carpintería de Madera y Metálicas	lun 29/6/20	mié 1/12/21
57	Provision de marcos metalicos para puertas	lun 29/6/20	mié 30/12/20
58	Rejas	lun 14/12/20	mié 1/12/21
59	Ventanas metalicas	lun 14/12/20	mié 1/12/21
60	Colocacion de hojas para puertas metalicas	lun 14/12/20	mié 1/12/21
61	5.6. Pinturas	jue 11/2/21	mar 25/1/22
62	5.7. Combate Contra Incendio	jue 11/2/21	mar 25/1/22
63	5.8. Instalaciones Eléctricas	mar 13/10/2(	vie 1/10/21
64	5.9. Techo	jue 14/1/21	mar 28/12/2
65	5.10. Instalaciones Señales débiles	jue 4/2/21	mar 18/1/22
66	5.11 Instalacion de Aire Acondicionado	jue 4/2/21	mar 18/1/22
67	**6. PABELLÓN CELDA DE MÁXIMA SEGURIDAD - PLANTA BAJA**	**mié 19/2/20**	**jue 22/7/21**
68	6.1. Trabajos Preliminares	mié 19/2/20	dom 23/2/20
69	6.1.1 Regularizacion de suelo para sello	mié 19/2/20	dom 23/2/20
70	6.2. Estructuras de HºAº	lun 24/2/20	sáb 3/4/21
71	6.2.1 Sello de Hormigon	lun 24/2/20	dom 1/3/20
72	6.2.2 Platea de Hormigon Armado	dom 1/3/20	mar 10/3/20
73	6.2.3 Celdas de Hormigo Armado	sáb 23/1/21	sáb 20/3/21
74	Guarda obra	sáb 20/3/21	sáb 3/4/21
75	6.3. Albañilería	lun 22/3/21	vie 7/5/21
76	Contrapiso en baño celdas	lun 22/3/21	dom 2/5/21
77	Aislacion de baños	lun 5/4/21	dom 2/5/21
78	Revoque base de azulejos en baños guardias	sáb 27/3/21	vie 23/4/21
79	Colocacion de pisos y azulejos en baños guardias	vie 23/4/21	vie 7/5/21
80	6.4. Instalaciones Sanitarias	sáb 23/1/21	jue 22/7/21
81	6.4.1 Instalaciones previas a la Estructura de H°A°	sáb 23/1/21	sáb 20/3/21
82	Instalación agua Corriente	sáb 20/3/21	vie 14/5/21
83	Instalación desague cloacal	vie 9/4/21	vie 18/6/21
84	Instalación desague pluvial	jue 29/4/21	jue 22/7/21
85	6.4.3 Colocacion de artefactos sanitarios	sáb 6/2/21	sáb 6/3/21
86	6.5. Carpintería de Madera y Metálicas	sáb 23/1/21	jue 22/4/21
87	6.5.1. Provision de Marcos Metalicos de Puertas	sáb 23/1/21	jue 11/2/21
88	6.5.2. Rejas	sáb 27/3/21	jue 15/4/21
89	6.5.3. Baranda para escalera	sáb 6/2/21	lun 15/2/21
90	6.5.4. Ventanas Metalicas	sáb 23/1/21	jue 11/2/21
91	6.5.5. Colocacion de Hojas de Puertas Metalicas	sáb 3/4/21	jue 22/4/21
92	6.6. Pinturas	sáb 17/4/21	jue 10/6/21
93	6.7. Combate Contra Incendio	sáb 27/3/21	mié 21/4/21
94	6.8. Instalaciones Eléctricas	sáb 20/3/21	jue 15/4/21

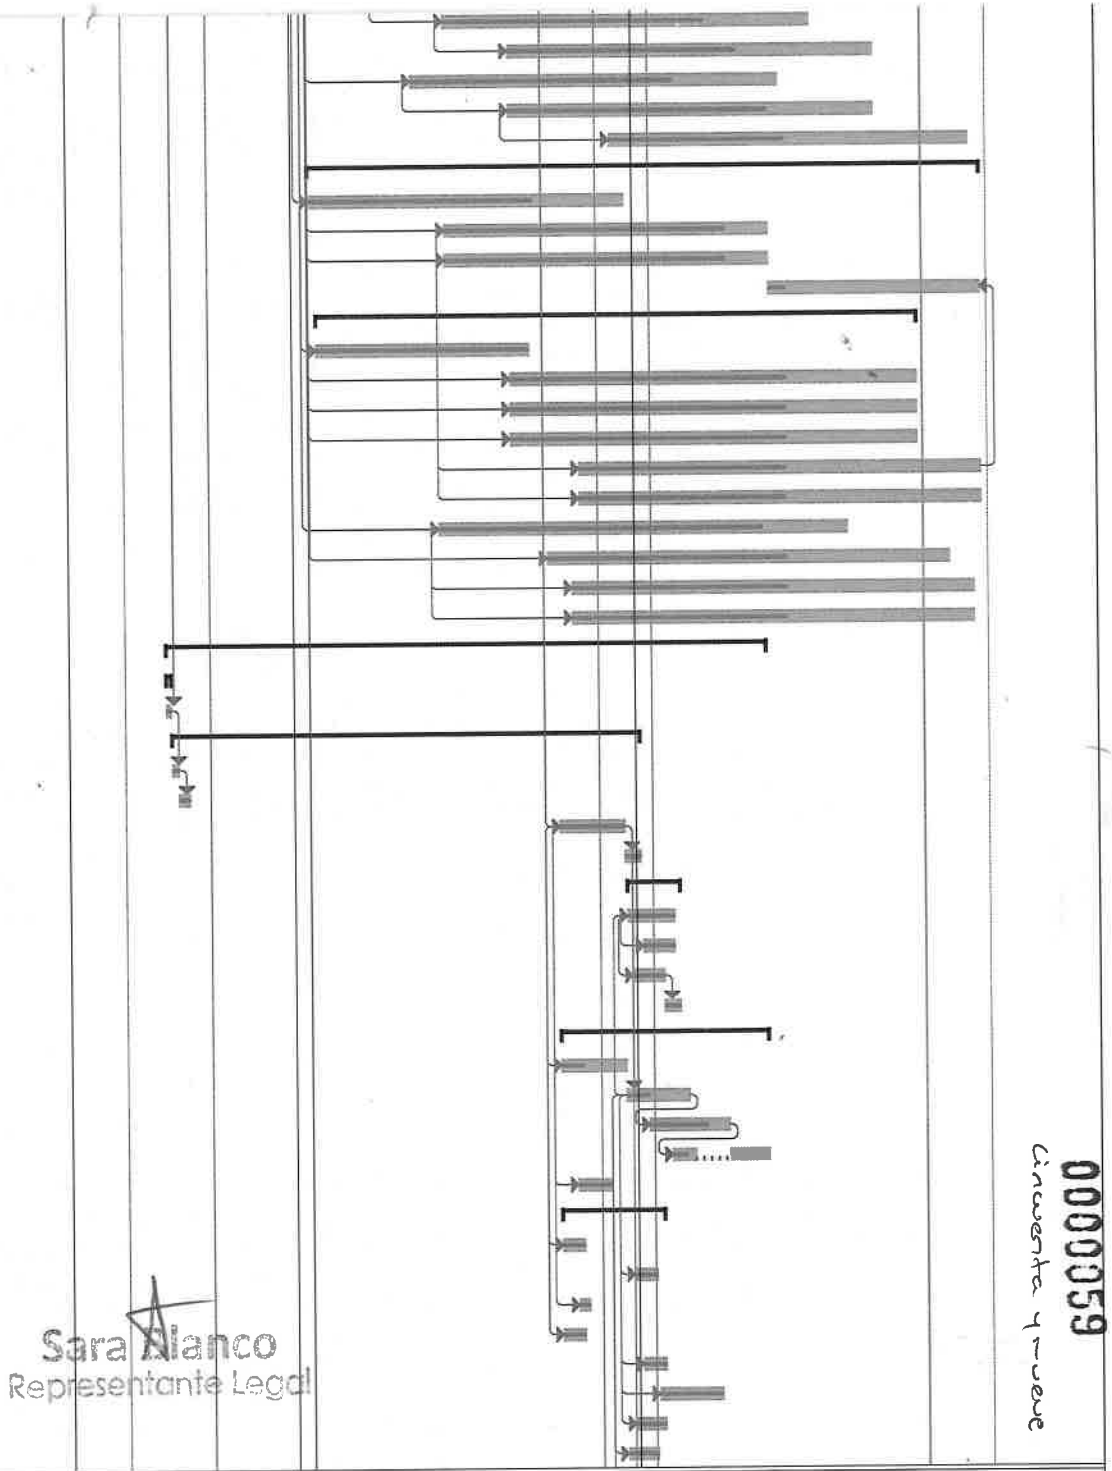

Sara Blanco
Representante Legal

00000059
cincuenta y nueve

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
95	6.9. Instalaciones Señales débiles	sáb 20/3/21	jue 15/4/21
96	6.10 Instalación AA	sáb 20/3/21	jue 15/4/21
97	**7. PABELLÓN CELDA DE MÁXIMA SEGURIDAD - PLANTA ALTA**	**sáb 20/3/21**	**mié 21/7/21**
98	7.1. Trabajos Preliminares	sáb 20/3/21	vie 26/3/21
99	7.2 Estructura de H°A°	sáb 20/3/21	vie 30/4/21
100	Celdas de Hormigon armado	sáb 20/3/21	vie 30/4/21
101	7.3. Albañilería	lun 22/3/21	lun 28/6/21
102	Contrapiso y Carpeta base de aislacion	lun 22/3/21	dom 4/4/21
103	Mampostería de elevación	vie 30/4/21	mié 19/5/21
104	Revoque	vie 7/5/21	jue 20/5/21
105	Aislacion de baños	mié 7/4/21	lun 31/5/21
106	Relleno de zona baños de celdas	mié 24/3/21	mar 18/5/21
107	Carpeta base de piso	mar 4/5/21	lun 28/6/21
108	Revoque base de azulejos en baños guardias	dom 4/4/21	sáb 17/4/21
109	Colocacion de pisos y azulejos en baños guardias	mié 7/4/21	lun 31/5/21
110	7.4. Instalaciones Sanitarias	sáb 20/3/21	jue 17/6/21
111	Instalaciones previas a la estructura de H°A°	sáb 20/3/21	mié 7/4/21
112	Instalación agua corriente	jue 25/3/21	mar 15/6/21
113	Instalación desague cloacal	jue 25/3/21	mar 15/6/21
114	Colocacion de artefactos sanitarios	sáb 27/3/21	jue 17/6/21
115	7.5. Carpintería de Madera y Metálicas	sáb 20/3/21	mar 13/4/21
116	Provision de marcos metalicos para puertas	sáb 20/3/21	mié 7/4/21
117	Rejas	jue 25/3/21	lun 12/4/21
118	Ventanas metalicas	sáb 20/3/21	mié 7/4/21
119	Colocacion de hojas para puertas metalicas	jue 25/3/21	mar 13/4/21
120	7.6. Pinturas	mié 7/4/21	mar 29/6/21
121	7.7. Combate Contra Incendio	mié 31/3/21	lun 21/6/21
122	7.8. Instalaciones Eléctricas	jue 25/3/21	mar 15/6/21
123	7.9. Techo	sáb 3/4/21	mié 21/7/21
124	7.10. Instalaciones Señales débiles	jue 25/3/21	mar 15/6/21
125	7.11 Instalación AA	jue 25/3/21	mar 15/6/21
126	**8. PABELLÓN TALLERES - PLANTA BAJA (Cantidades establecidas para 4 pabellones)**	**lun 27/1/20**	**mar 29/6/21**
127	8.1. Trabajos Preliminares	lun 27/1/20	dom 23/2/20
128	8.1.1 Trabajos preliminares	lun 27/1/20	dom 23/2/20
129	8.1.2 Regularizacion de suelo para sello	lun 27/1/20	dom 23/2/20
130	8.2. Estructuras de H°A°	sáb 1/2/20	lun 5/4/21
131	8.2.1 Sello de Hormigon	sáb 1/2/20	dom 23/2/20
132	8.2.2 Platea de Hormigon Armado	lun 24/2/20	mar 19/5/20
133	8.2.3 Tabiques y Losa de Hormigon Armado	lun 22/6/20	lun 22/2/21
134	Guarda obra	lun 22/2/21	lun 5/4/21
135	8.3. Albañilería	lun 17/8/20	mar 25/5/21
136	Contrapiso	lun 17/8/20	jue 4/3/21
137	Aislacion de baños	dom 13/9/20	mié 31/3/21
138	Revoque base de azulejos	dom 13/9/20	mié 31/3/21
139	Carpeta base de piso	lun 12/10/20	mar 27/4/21

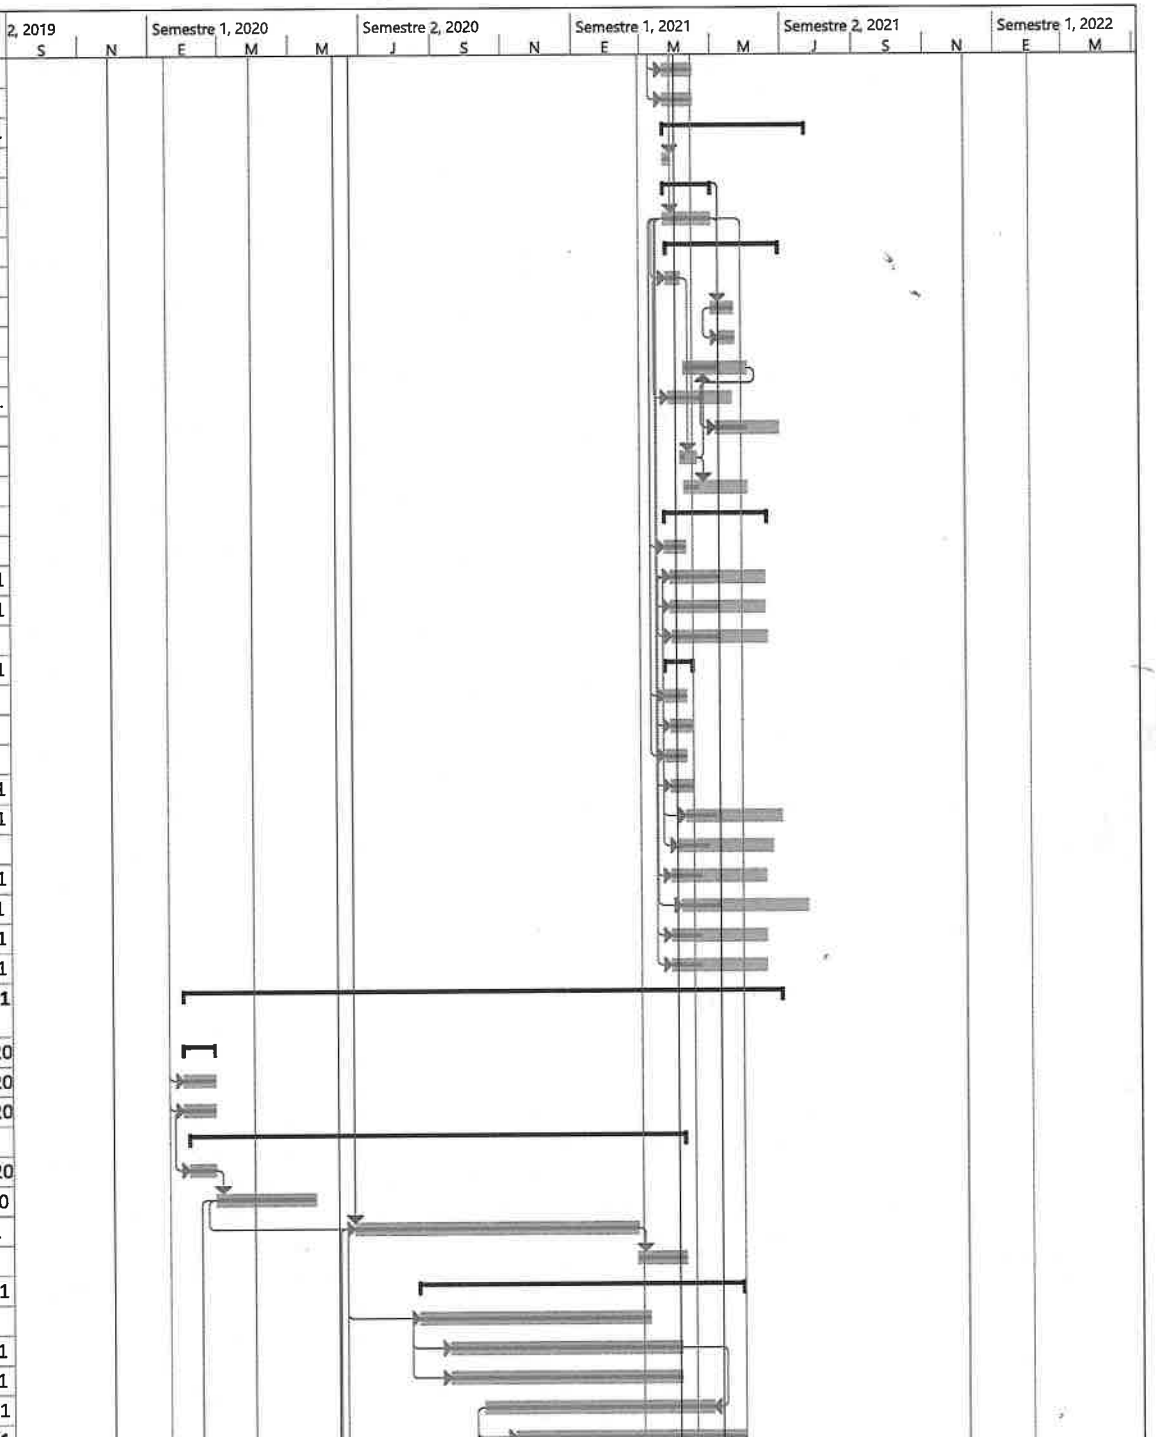

142	8.4. Instalaciones Sanitarias	lun 24/2/20	vie 16/4/21
143	Instalaciones previas a la estructura de H°A°	lun 24/2/20	mié 15/7/20
144	Instalación agua Corriente	sáb 18/7/20	mié 23/12/2(
145	Instalación desague Cloacal	sáb 18/7/20	mié 23/12/2(
146	Instalación desague pluvial	sáb 18/7/20	mié 23/12/2(
147	Colocacion de artefactos sanitarios	jue 19/11/20	vie 16/4/21
148	8.5. Carpintería de Madera y Metálicas	lun 22/6/20	mar 29/6/21
149	8.5.1. Provision de Marcos Metalicos de Puertas	lun 22/6/20	vie 7/5/21
150	8.5.2. Rejas	vie 14/8/20	mar 29/6/21
151	8.5.3. Baranda para escalera	vie 14/8/20	mar 29/6/21
152	8.5.4. Ventanas Metalicas	lun 22/6/20	vie 7/5/21
153	8.5.5. Colocacion de Hojas de Puertas Metalicas	vie 14/8/20	mar 29/6/21
154	8.6. Pinturas	vie 14/8/20	mar 29/6/21
155	8.7. Combate Contra Incendio	vie 14/8/20	mar 29/6/21
156	8.8. Instalaciones Eléctricas	vie 14/8/20	mar 29/6/21
157	8.9. Instalaciones Señales débiles	vie 14/8/20	mar 29/6/21
158	8.10 Instalación AA	vie 14/8/20	mar 29/6/21
159	**9. PABELLÓN TALLERES Y AULAS - PLANTA ALTA (Cantidades establecidas para 4 pabellones)**	**mié 15/7/20**	**vie 28/1/22**
160	9.1. Trabajos Preliminares	mié 15/7/20	mar 21/7/20
161	9.2 Estructura de Hormigon Armado	mar 21/7/20	mié 24/3/21
162	Tabiques y losas de hormigon armado	mar 21/7/20	mié 24/3/21
163	9.3. Albañilería	mar 1/9/20	dom 21/11/2
164	Contrapiso	mar 1/9/20	mar 3/8/21
165	Mampostería de elevación	mar 1/9/20	mar 3/8/21
166	Revoque	mar 1/9/20	mar 3/8/21
167	Carpeta base de aislacion	mié 30/9/20	mar 31/8/21
168	Aislacion de baños	mar 27/10/2(	lun 27/9/21
169	Carpeta base de piso	mar 24/11/2(	dom 24/10/2
170	Colocacion de pisos y azulejos	mar 22/12/2(	dom 21/11/2
171	Mesada de granito	mar 22/12/2(	dom 21/11/2
172	9.4. Instalaciones Sanitarias	mar 21/7/20	sáb 27/11/21
173	Instalaciones previas a la estructura de H°A°	mar 21/7/20	mar 29/12/2(
174	Instalaciones finales	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
175	Instalación agua corriente	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
176	Instalación desague cloacaal	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
177	Colocacion de artefactos sanitarios	mié 30/12/2(	sáb 27/11/21
178	9.5. Carpintería de Madera y Metálicas	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
179	Provision de marcos metalicos para puertas	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
180	Rejas	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
181	Baranda galería	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
182	Ventanas metalicas	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
183	Colocacion de hojas para puertas metalicas	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
184	9.6. Pinturas	sáb 6/3/21	vie 28/1/22
185	9.7. Combate Contra Incendio	sáb 6/3/21	vie 28/1/22
186	9.8. Instalaciones Eléctricas	sáb 6/3/21	vie 28/1/22
187	9.9. Techo	vie 5/2/21	sáb 1/1/22
188	9.10. Instalaciones Señales débiles	mar 10/11/2(	lun 11/10/21

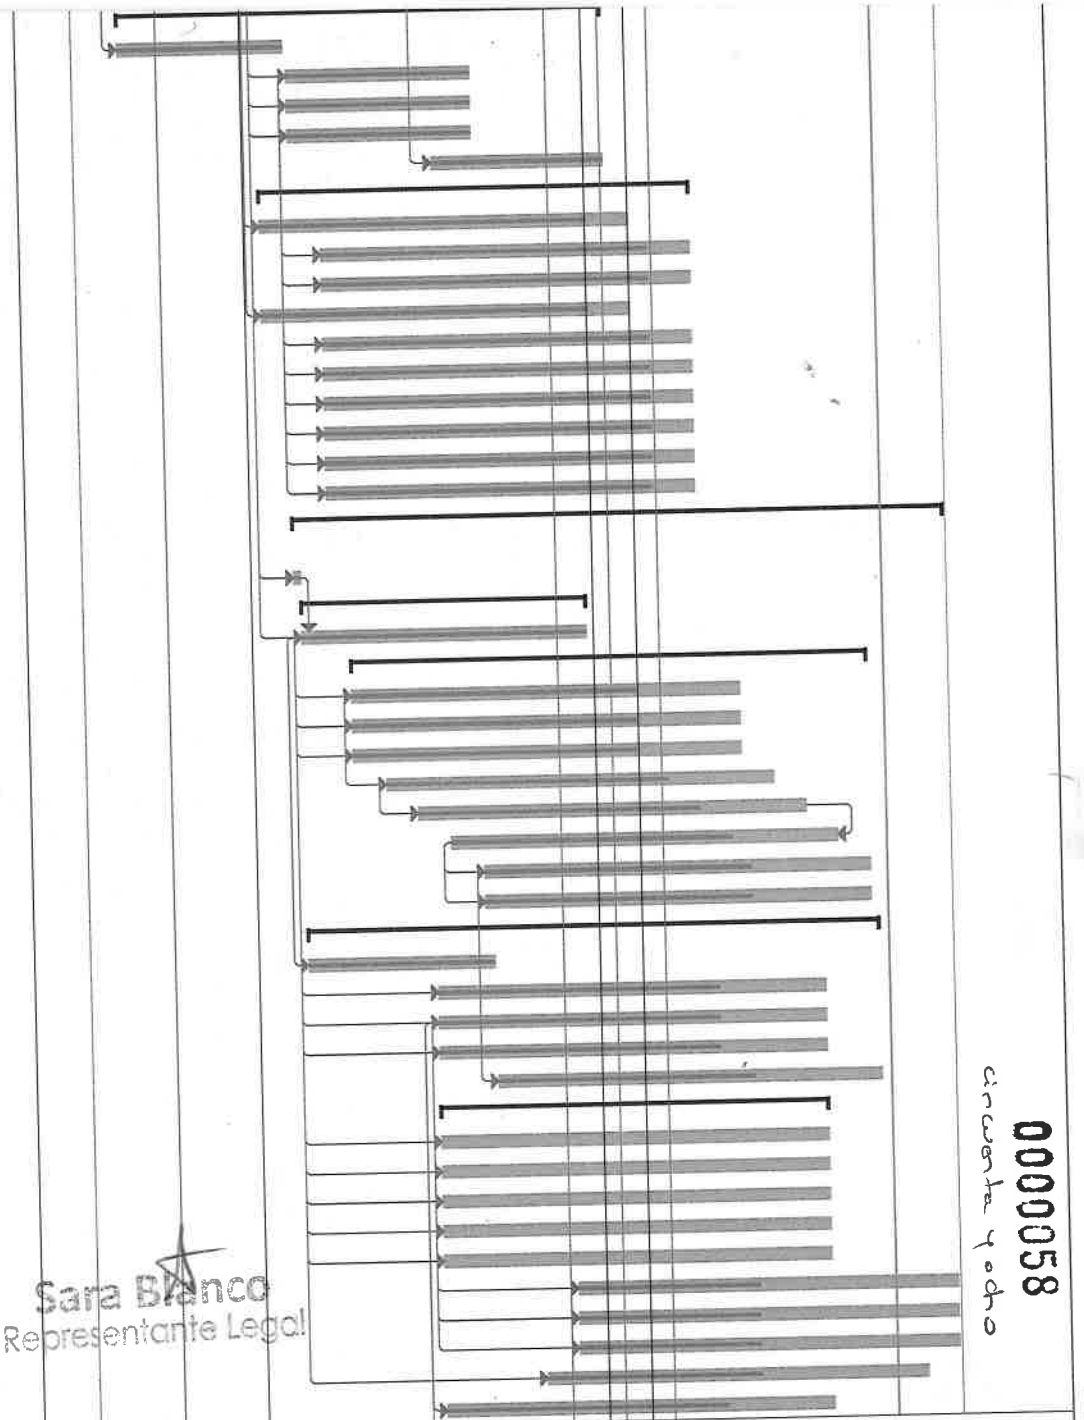

Sara Blanco
Representante Legal

000058
Cincuenta y ocho

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
189	9.11 Instalación AA	mar 10/11/2(	lun 11/10/21
190	**10. COMEDOR CON ÁREA DE DEPORTES (Cantidades establecidas para 7 pabellones)**	**lun 21/12/20**	**jue 11/11/21**
191	10.1. Trabajos Preliminares	lun 21/12/20	vie 8/1/21
192	Trabajos Preliminares	mié 30/12/2(	vie 8/1/21
193	Regularizacion de suelo	lun 21/12/20	vie 8/1/21
194	10.2. Estructuras de HºAº	vie 8/1/21	dom 12/9/21
195	Sello de Hormigon	vie 8/1/21	jue 18/2/21
196	Zapatas de hormigon armado	jue 18/2/21	jue 15/4/21
197	Vigas de fundacion	jue 15/4/21	mié 26/5/21
198	Pilares	mié 26/5/21	mar 20/7/21
199	Guarda obra	mar 20/7/21	dom 12/9/21
200	10.3. Albañilería	mar 20/7/21	jue 11/11/21
201	Piso de H°A°	mar 20/7/21	dom 12/9/21
202	Aislación	mar 14/9/21	lun 8/11/21
203	Mampostería de elevación	dom 12/9/21	sáb 6/11/21
204	Revoque	vie 17/9/21	jue 11/11/21
205	**10.4 Instalaciones Sanitarias**	**mié 15/9/21**	**mar 5/10/21**
206	10.4.1 Instalación desague pluvial	mié 15/9/21	mar 5/10/21
207	10.5. Pinturas	vie 1/10/21	jue 28/10/21
208	10.7. Instalaciones Eléctricas	vie 17/9/21	jue 28/10/21
209	10.8. Techo	vie 4/6/21	mar 20/7/21
210	10.9. Instalaciones Señales débiles	vie 17/9/21	jue 28/10/21
211	10.10 Combate contra Incendio	vie 17/9/21	jue 14/10/21
212	**11. ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y COBERTURA EN MÁXIMA SEGURIDAD**	**lun 16/11/20**	**jue 11/2/21**
213	11.1. Trabajos Preliminares	vie 8/1/21	jue 14/1/21
214	11.2. Estructuras de HºAº	lun 16/11/20	mié 23/12/2(
215	Fundaciones	lun 16/11/20	sáb 12/12/20
216	Pilares	dom 22/11/2	mar 1/12/20
217	Losas y Vigas	vie 27/11/20	mié 23/12/2(
218	11.3. Albañilería	mié 23/12/2(	sáb 30/1/21
219	Mamposterias	mié 23/12/2(	dom 10/1/21
220	Revoques	dom 10/1/21	mar 19/1/21
221	Piso de H°A°	mar 19/1/21	sáb 30/1/21
222	11.4. Instalaciones Sanitarias	dom 10/1/21	sáb 6/2/21
223	11.5. Carpintería de Madera y Metálicas	dom 10/1/21	dom 24/1/21
224	11.5.1. Carpintería Metálica	dom 10/1/21	dom 24/1/21
225	11.6. Pinturas	mar 19/1/21	jue 11/2/21
226	11.7. Combate Contra Incendio	dom 10/1/21	sáb 6/2/21
227	11.8. Instalaciones Eléctricas	dom 10/1/21	sáb 6/2/21
228	11.9. Techo	mié 23/12/2(	jue 14/1/21
229	11.10. Instalaciones Señales débiles	dom 10/1/21	sáb 6/2/21
230	**12. PABELLÓN DE VISITAS PRIVADAS - PLANTA BAJA**	**dom 26/4/2(**	**sáb 23/1/21**
231	12.1. Trabajos Preliminares	dom 26/4/20	sáb 2/5/20
		dom 26/4/20	sáb 2/5/20

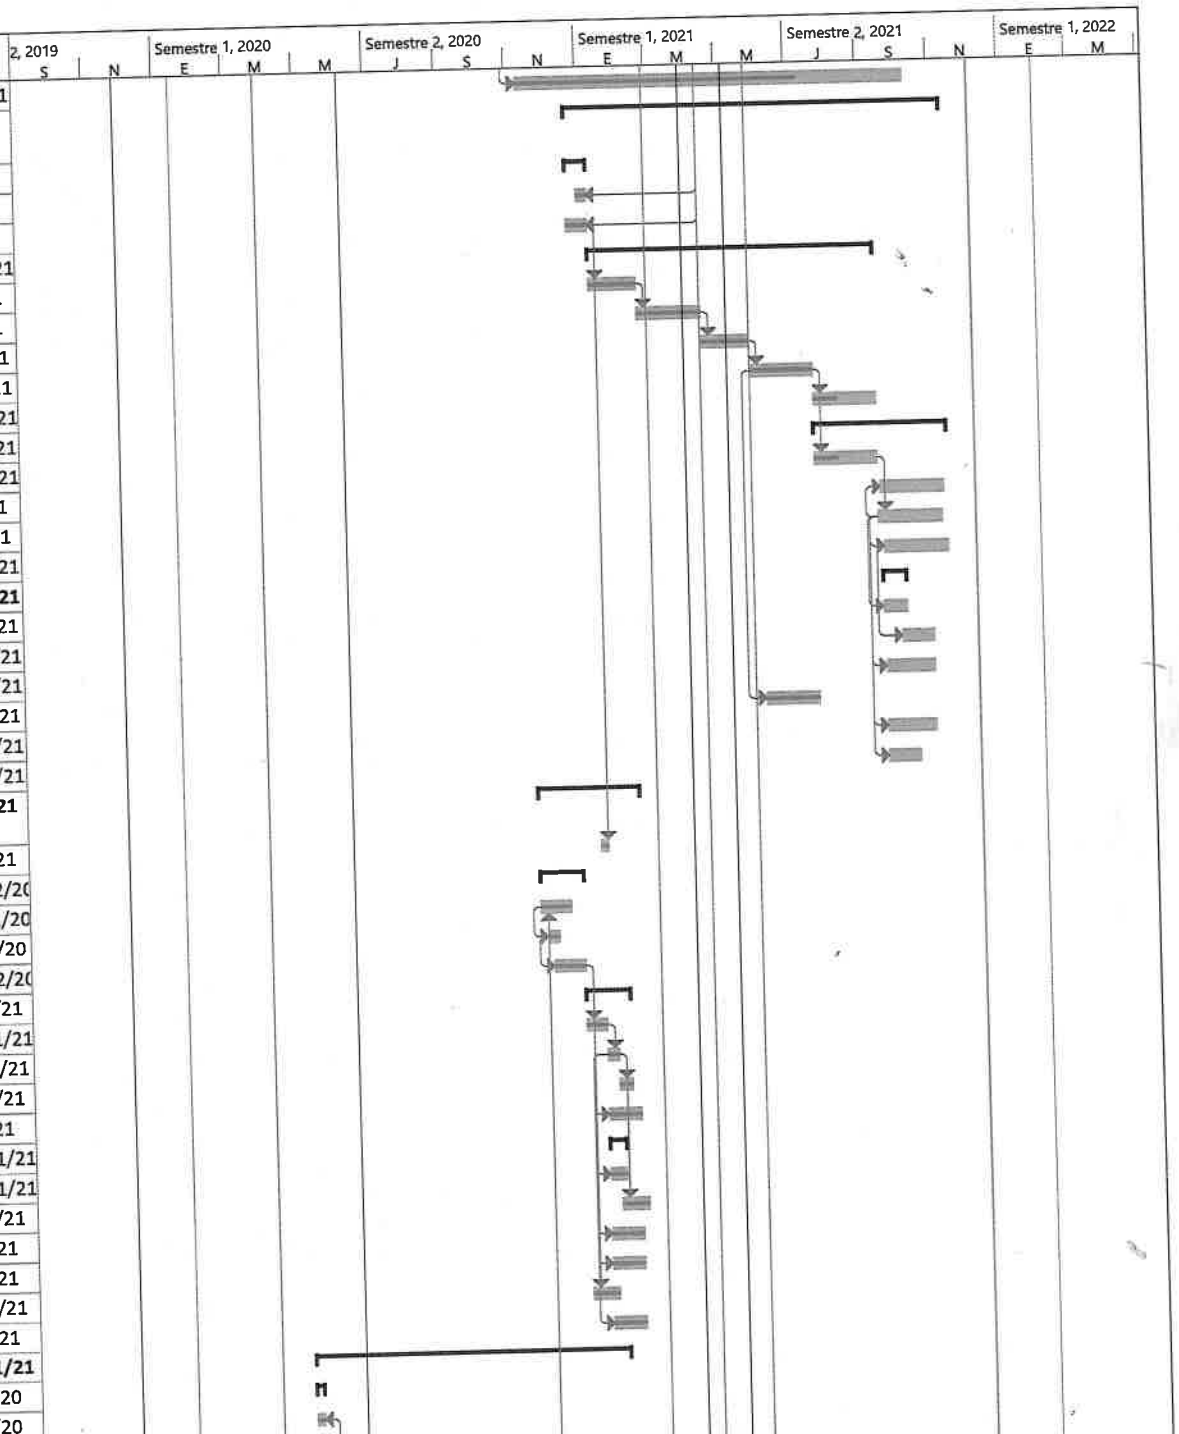

234	12.2. Estructuras de H°A		
235	Pilotes	sáb 2/5/20	dom 17/5/20
236	Cabezales y Vigas de Fundacion	jue 13/8/20	jue 3/9/20
237	Pilares	jue 27/8/20	lun 7/9/20
238	Vigas	vie 4/9/20	mié 30/9/20
239	Losas	vie 4/9/20	mié 30/9/20
240	Rampa de hormigon	mié 30/9/20	lun 26/10/20
241	12.3. Albañilería	lun 26/10/20	sáb 23/1/21
242	Mamposterias	lun 26/10/20	vie 6/11/20
243	Aislacion horizontal	lun 26/10/20	dom 1/11/20
244	Revoque interno de paredes	vie 6/11/20	dom 15/11/2
245	Revoque de losa	dom 15/11/2	vie 4/12/20
246	Revoque Exterior	dom 15/11/2	sáb 21/11/20
247	Contrapiso sobre terreno natural	dom 15/11/2	mié 18/11/20
248	Carpeta base de piso	mié 18/11/2	sáb 21/11/20
249	Pisos y zocalos	sáb 21/11/20	vie 27/11/20
250	Revestimientos	sáb 21/11/20	vie 27/11/20
251	Piso de H°A°	vie 4/12/20	sáb 26/12/20
252	Mesada de H sobre mamposteria	sáb 26/12/20	sáb 23/1/21
253	Terminación de escalera con endurecedor y rodillado	lun 26/10/20	dom 22/11/2
254	12.4. Instalaciones Sanitarias	vie 6/11/20	jue 3/12/20
255	12.5. Carpintería de Madera y Metálicas	dom 15/11/2	vie 4/12/20
256	12.5.1. Carpintería de Madera	dom 15/11/2	vie 4/12/20
257	12.5.2. Carpintería Metálica	dom 15/11/2	vie 4/12/20
258	12.6. Pinturas	dom 15/11/2	lun 4/1/21
259	12.7. Combate contra incendio	vie 6/11/20	jue 19/11/20
260	12.8. Instalaciones Eléctricas	vie 6/11/20	jue 3/12/20
261	12.9. Instalaciones Señales débiles	vie 6/11/20	jue 3/12/20
262	**13. PABELLÓN DE VISITAS PRIVADAS - PLANTA ALTA**	**mié 23/9/20**	**mié 10/2/21**
263	Trabajos preliminares	mié 23/9/20	mié 30/9/20
264	13.1. Estructura de H°A°	mié 30/9/20	mar 27/10/2
265	Pilares	mié 30/9/20	mié 7/10/20
266	Vigas	mié 7/10/20	mar 27/10/2
267	Losas	mié 7/10/20	mar 27/10/2
268	Guarda obra	mié 7/10/20	mar 27/10/2
269	13.2. Albañilería	dom 15/11/2	lun 1/2/21
270	Mamposterias	dom 15/11/2	vie 18/12/20
271	Aislaciones de baños	sáb 2/1/21	sáb 9/1/21
272	Revoque interno de paredes	mar 1/12/20	jue 7/1/21
273	Revoque de losa	jue 7/1/21	lun 1/2/21
274	Revoque exterior	vie 18/12/20	sáb 16/1/21
275	Contrapiso	mar 29/12/2	vie 8/1/21
276	Carpeta base de piso	lun 4/1/21	dom 10/1/21
277	Pisos y zocalos	dom 10/1/21	dom 24/1/21
278	13.3. Instalaciones Sanitarias	mar 1/12/20	lun 8/2/21
279	13.4. Carpintería de Madera y Metálicas	mar 1/12/20	sáb 16/1/21
280	13.4.1. Carpintería Metálica	mar 1/12/20	sáb 16/1/21
281	13.4.2. Carpinteria de Madera	mar 1/12/20	sáb 16/1/21
282	13.5. Pinturas	mar 29/12/2	mié 10/2/21

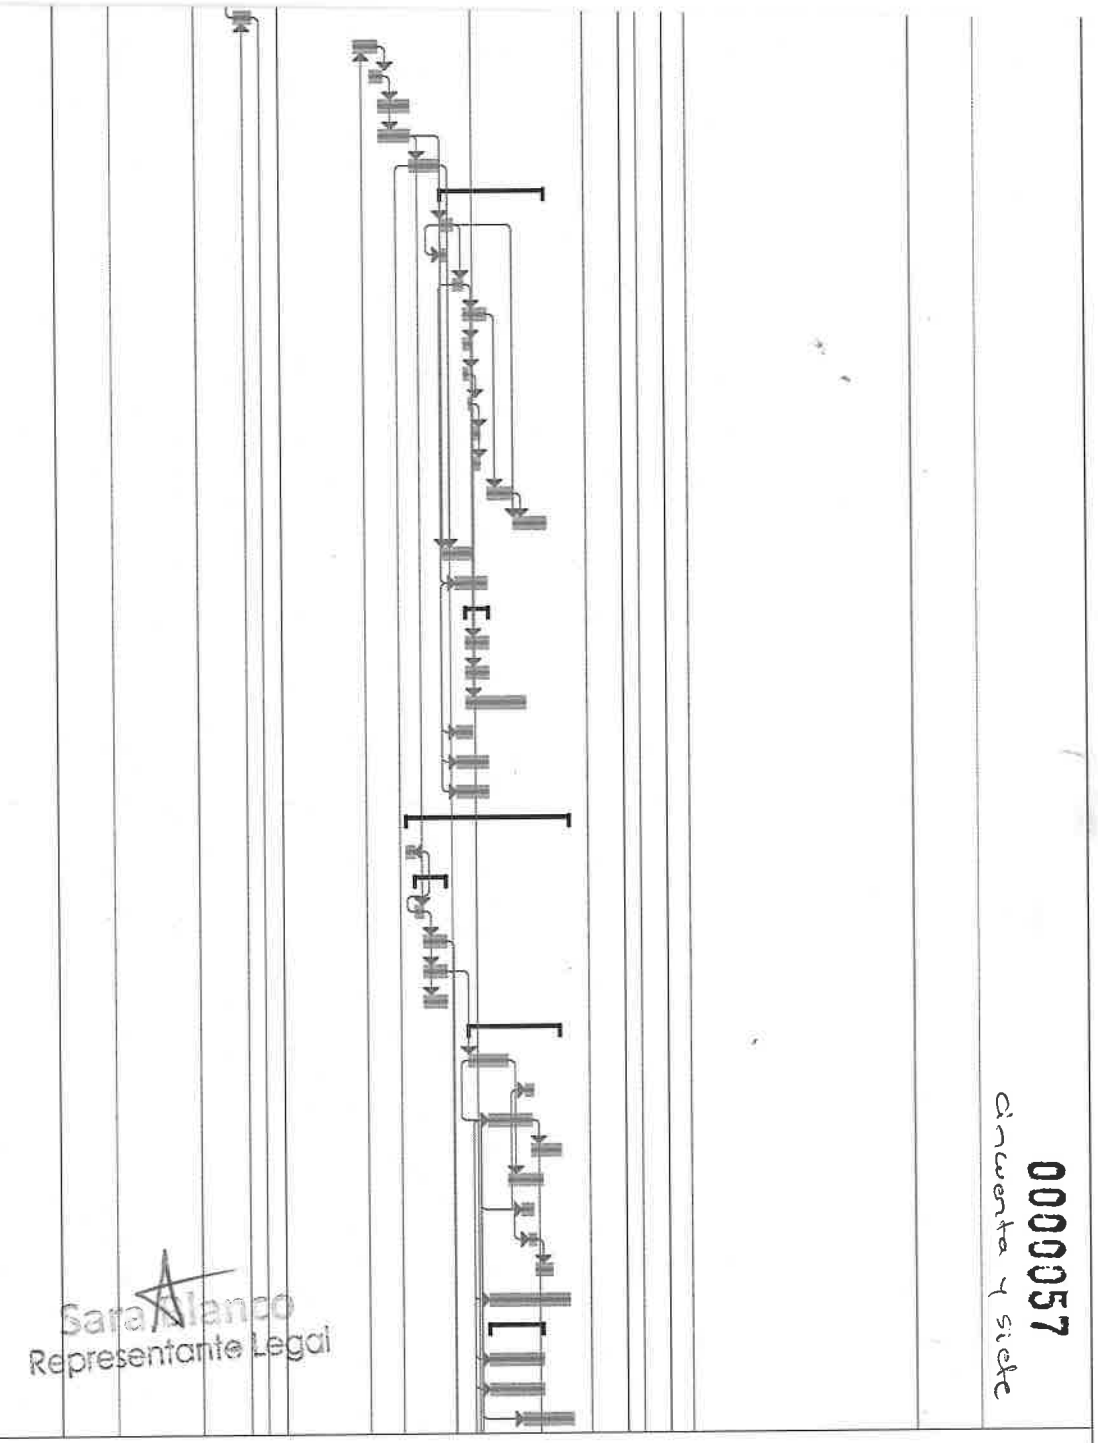

Sara Alanso
Representante Legal

00000057
Cincuenta y siete

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
283	13.6. Combate Contra Incendio	jue 7/1/21	lun 8/2/21
284	13.7. Instalaciones Eléctricas	mar 1/12/20	lun 8/2/21
285	13.8. Techo	mar 27/10/2(	sáb 21/11/20
286	13.9. Instalaciones Señales débiles	mar 1/12/20	lun 8/2/21
287	**14. PABELLÓN DE COCINA Y LAVANDERÍA - PLANTA BAJA**	**vie 17/4/20**	**mié 23/12/2(**
288	14.1. Trabajos Preliminares	vie 17/4/20	vie 24/4/20
289	Trabajos Preliminares	vie 17/4/20	vie 24/4/20
290	Regularizacion de suelo	vie 17/4/20	vie 24/4/20
291	14.2. Estructuras de HºAº	vie 24/4/20	lun 24/8/20
292	Pilotes	vie 24/4/20	sáb 2/5/20
293	Cabezales y Vigas de Fundacion	sáb 2/5/20	dom 17/5/20
294	Pilares	dom 17/5/20	sáb 23/5/20
295	Vigas	sáb 23/5/20	lun 15/6/20
296	Losas	sáb 23/5/20	lun 15/6/20
297	Piso de H°A°	lun 29/6/20	lun 24/8/20
298	Rampa de hormigón	lun 29/6/20	dom 26/7/20
299	14.3. Albañilería	sáb 11/7/20	jue 15/10/20
300	Mamposterias	sáb 11/7/20	dom 2/8/20
301	Aislacion horizontal	sáb 11/7/20	lun 20/7/20
302	Revoque interno de paredes	mié 29/7/20	sáb 22/8/20
303	Revoque de losa	sáb 22/8/20	mié 9/9/20
304	Revoque Exterior	sáb 22/8/20	mié 9/9/20
305	Contrapiso sobre terreno natural	lun 17/8/20	sáb 5/9/20
306	Carpeta base de piso	sáb 5/9/20	vie 18/9/20
307	Pisos y zocalos	vie 18/9/20	jue 15/10/20
308	Revestimientos	vie 18/9/20	jue 15/10/20
309	14.4. Instalaciones Sanitarias	mié 29/7/20	mié 16/12/2(
310	14.5. Carpintería de Madera y Metálicas	sáb 22/8/20	sáb 3/10/20
311	14.5.1. Carpintería de Madera	sáb 22/8/20	sáb 3/10/20
312	14.5.2. Carpintería Metálica	sáb 22/8/20	sáb 3/10/20
313	14.6. Pinturas	sáb 5/9/20	mié 23/12/2(
314	14.7. Combate Contra Incendio	mié 29/7/20	mié 23/9/20
315	14.8. Instalaciones Eléctricas	mié 29/7/20	mié 16/12/2(
316	14.9. Instalaciones Señales débiles	mié 29/7/20	mié 16/12/2(
317	14.10. Instalaciones de Aire Acondicionado	mié 9/9/20	mié 4/11/20
318	14.11 Granitos y marmoles	vie 30/10/20	jue 26/11/20
319	14.12. Camara de frio	vie 18/9/20	vie 30/10/20
320	**15. PABELLÓN DE GUARDIAS - PLANTA ALTA**	**lun 8/6/20**	**mar 12/1/21**
321	Trabajos Preliminares	lun 8/6/20	lun 15/6/20
322	15.1. Estructura de Hormigon Armado	lun 15/6/20	mié 8/7/20
323	15.1.1. Pilares	lun 15/6/20	dom 21/6/20
324	15.1.2. Vigas	lun 22/6/20	mié 8/7/20
325	15.1.3. Losas	lun 22/6/20	mié 8/7/20
326	15.2. Albañilería	dom 26/7/20	mié 4/11/20
327	Mamposterias	dom 26/7/20	mié 19/8/20

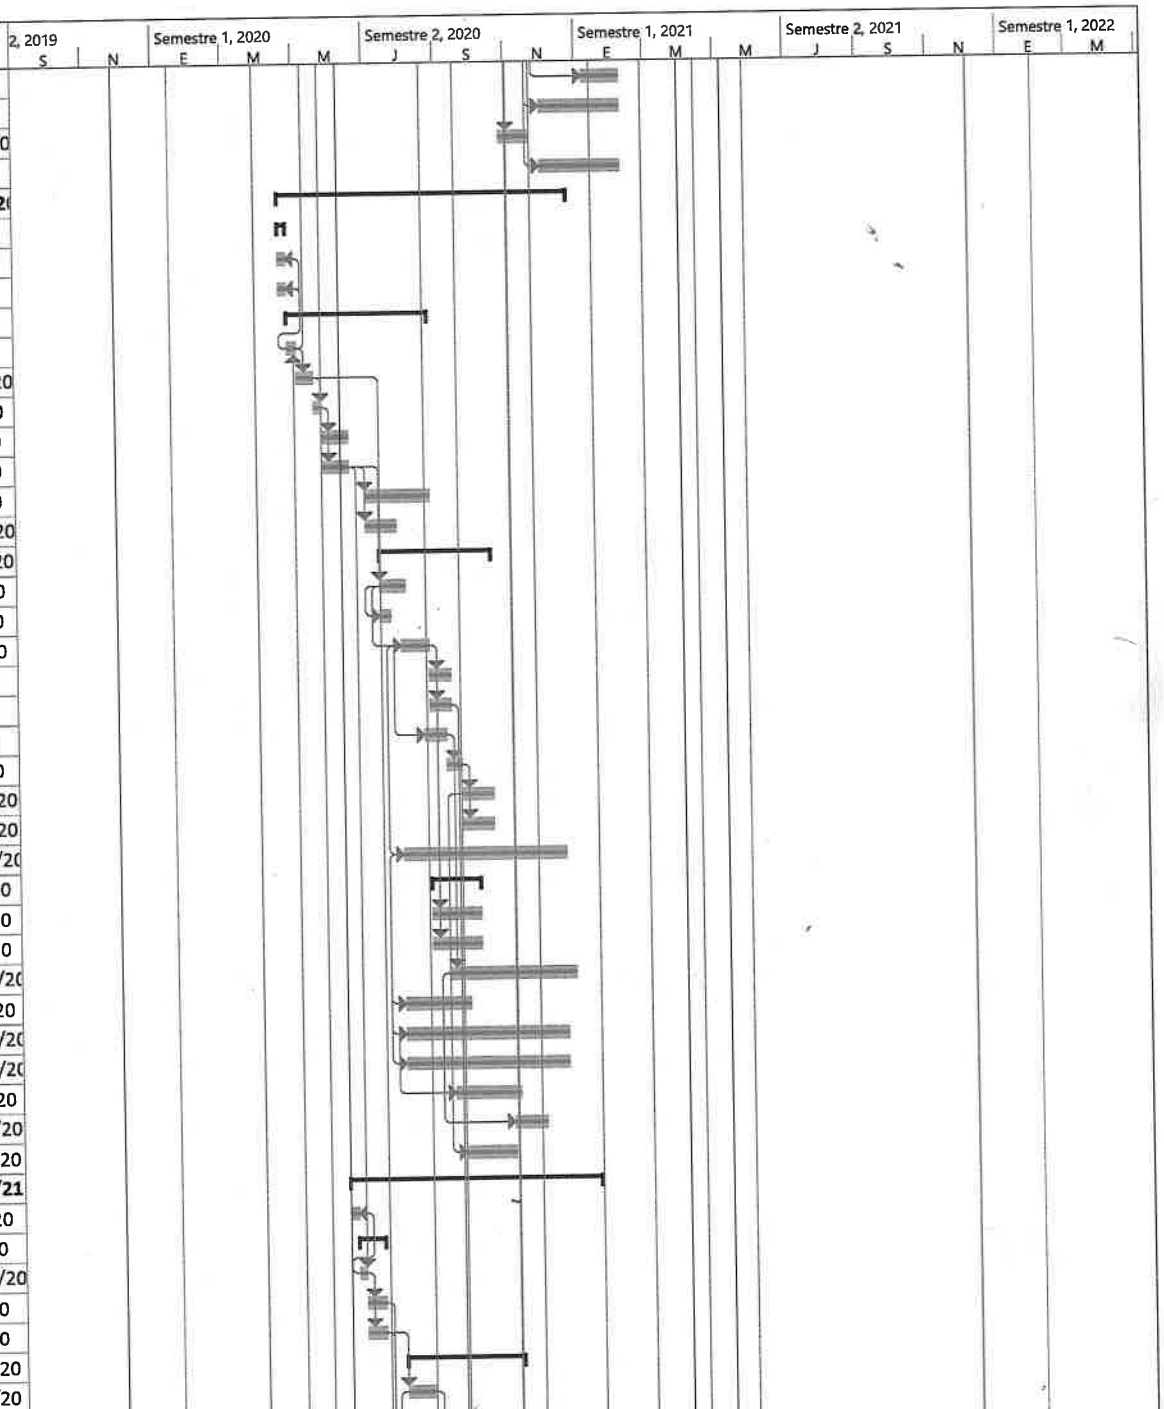

330	Revoque de losa	dom 6/9/20	jue 24/9/20
331	Revoque exterior	mié 9/9/20	dom 27/9/20
332	Contrapiso	dom 6/9/20	vie 25/9/20
333	Carpeta base de piso	vie 25/9/20	vie 9/10/20
334	Pisos y zocalos	vie 9/10/20	mié 4/11/20
335	Revestimientos	vie 9/10/20	mié 4/11/20
336	15.3. Instalaciones Sanitarias	jue 13/8/20	lun 4/1/21
337	15.4. Carpintería de Madera y Metálicas	dom 6/9/20	dom 18/10/2
338	15.4.1. Carpintería de Madera	dom 6/9/20	dom 18/10/2
339	15.4.2. Carpintería Metálica	dom 6/9/20	dom 18/10/2
340	15.5. Pinturas	vie 25/9/20	mar 12/1/21
341	15.6. Combate Contra Incendio	vie 23/10/20	jue 19/11/20
342	15.7. Instalaciones Eléctricas	jue 13/8/20	lun 4/1/21
343	15.8. Techo	mar 14/7/20	mar 25/8/20
344	15.9. Instalaciones Señales débiles	jue 13/8/20	lun 4/1/21
345	15.10. Granitos y marmoles	mar 17/11/2(	mar 15/12/2(
346	15.11. Instalacione de Aire Acondicionado	vie 25/9/20	jue 19/11/20
347	**16. PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANTA BAJA**	**vie 3/4/20**	**mar 15/12/2**
348	16.1. Trabajos Preliminares	vie 3/4/20	vie 24/4/20
349	Trabajos Preliminares	vie 3/4/20	sáb 11/4/20
350	Regularizacion de suelo	sáb 4/4/20	vie 24/4/20
351	16.2. Estructuras de H°A°	sáb 11/4/20	mié 30/9/20
352	Pilotes	sáb 11/4/20	vie 24/4/20
353	Cabezales y Vigas de Fundacion	vie 24/4/20	vie 22/5/20
354	Pilares	vie 22/5/20	dom 31/5/20
355	Vigas	dom 31/5/20	mié 8/7/20
356	Losas	dom 31/5/20	mié 8/7/20
357	Piso de H°A°	mié 8/7/20	mié 2/9/20
358	Guarda obra	mié 2/9/20	mié 30/9/20
359	16.3. Albañilería	lun 3/8/20	jue 12/11/20
360	Mamposterias	lun 3/8/20	vie 4/9/20
361	Aislacion horizontal	vie 4/9/20	vie 18/9/20
362	Revoque interno de paredes	mié 19/8/20	lun 14/9/20
363	Revoque de losa	dom 27/9/20	vie 16/10/20
364	Revoque Exterior	lun 14/9/20	mar 29/9/20
365	Contrapiso sobre terreno natural	mar 1/9/20	dom 27/9/20
366	Carpeta base de piso	dom 27/9/20	sáb 17/10/20
367	Pisos y zocalos	sáb 17/10/20	jue 12/11/20
368	Revestimientos	sáb 17/10/20	jue 12/11/20
369	Pared de yeso acartonado	lun 14/9/20	lun 9/11/20
370	16.4. Instalaciones Sanitarias	lun 3/8/20	dom 22/11/2
371	16.5. Carpintería de Madera, Metálicas y de Aluminio	lun 14/9/20	lun 9/11/20
372	16.5.1. Carpintería de Madera	lun 14/9/20	lun 9/11/20
373	16.5.2. Carpintería Metálica	lun 14/9/20	lun 9/11/20
374	16.6. Pinturas	dom 27/9/20	mar 15/12/2(
375	16.7. Combate Contra Incendio	mié 19/8/20	mié 16/9/20
376	16.8. Instalaciones Eléctricas	lun 3/8/20	dom 22/11/2
377	16.9. Instalaciones Señales débiles	lun 3/8/20	dom 22/11/2
378	16.10 Instalaciones de Aire Acondicionado	mié 19/8/20	mié 14/10/20

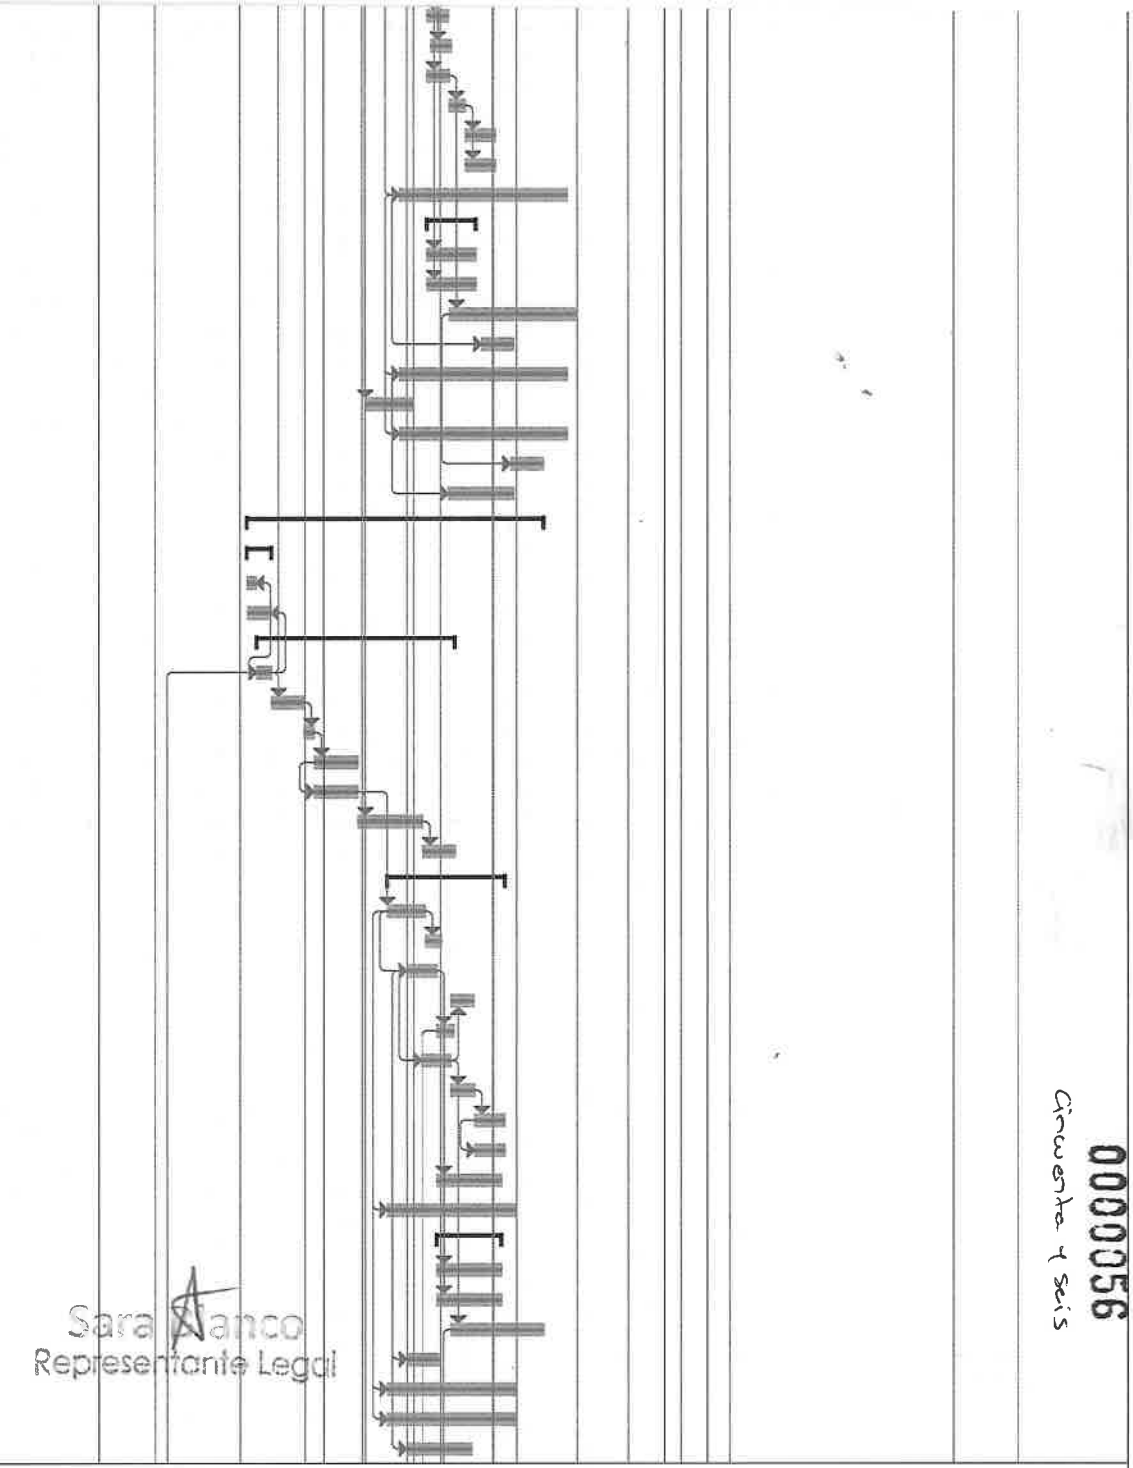

Sara Blanco
Representante Legal

000056
Cincuenta y seis

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
379	16.11 Granitos y marmoles	vie 6/11/20	jue 3/12/20
380	**17. PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN - PLANTA ALTA**	**jue 2/7/20**	**mar 19/1/21**
381	Trabajos Preliminares	jue 2/7/20	mié 8/7/20
382	17.1 Estructura de Hormigon Armado	mié 8/7/20	jue 13/8/20
383	Pilares	mié 8/7/20	dom 19/7/20
384	Vigas	dom 19/7/20	jue 13/8/20
385	Losas	dom 19/7/20	jue 13/8/20
386	17.2. Albañilería	mié 9/9/20	mié 9/12/20
387	Mamposterias	mié 9/9/20	lun 12/10/20
388	Aislaciones de baños	vie 2/10/20	vie 9/10/20
389	Revoque interno de paredes	vie 25/9/20	jue 22/10/20
390	Revoque de losa	jue 22/10/20	lun 9/11/20
391	Revoque exterior	lun 14/9/20	sáb 3/10/20
392	Contrapiso	vie 9/10/20	mar 3/11/20
393	Carpeta base de piso	mar 3/11/20	lun 23/11/20
394	Pisos y zocalos	vie 13/11/20	mié 9/12/20
395	Revestimientos	vie 13/11/20	mié 9/12/20
396	17.3. Instalaciones Sanitarias	vie 25/9/20	mar 19/1/21
397	17.4. Carpintería de Madera, Metálicas y de Aluminio	jue 22/10/20	mié 16/12/20
398	17.4.1. Carpintería de Madera	jue 22/10/20	mié 16/12/20
399	17.4.2. Carpintería Metálica	jue 22/10/20	mié 16/12/20
400	17.5. Pinturas	mar 3/11/20	lun 11/1/21
401	17.6. Combate Contra Incendio	jue 22/10/20	mié 18/11/20
402	17.7. Instalaciones Eléctricas	vie 25/9/20	mar 19/1/21
403	17.8. Techo	vie 21/8/20	vie 16/10/20
404	17.9. Instalaciones Señales débiles	vie 25/9/20	mar 19/1/21
405	17.10. Instalaciones de Aire Acondicionado	mar 3/11/20	sáb 2/1/21
406	17.11 Granitos y marmoles	sáb 5/12/20	jue 7/1/21
407	**18. PORTERÍA DE ACCESO PRINCIPAL PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA**	**lun 1/6/20**	**mar 6/10/20**
408	18.1. Trabajos Preliminares	lun 1/6/20	mié 3/6/20
409	18.2. Estructuras de H°A°	mié 3/6/20	mar 25/8/20
410	Pilotes	mié 3/6/20	vie 5/6/20
411	Cabezales y Vigas de Fundacion	vie 19/6/20	jue 25/6/20
412	Pilares PB	mié 8/7/20	mar 14/7/20
413	Vigas y Losas Techo PB	mar 14/7/20	jue 23/7/20
414	Pilares 1P	jue 23/7/20	jue 30/7/20
415	Vigas y losas Techo 1P	jue 30/7/20	lun 10/8/20
416	Piso de H°A°	mar 14/7/20	mar 11/8/20
417	Guarda obra	mar 11/8/20	mar 25/8/20
418	18.3. Albañilería	mié 12/8/20	lun 14/9/20
419	Planta Baja	mié 12/8/20	sáb 22/8/20
420	Mamposterias	mié 12/8/20	vie 14/8/20
421	Revoques	vie 14/8/20	lun 17/8/20
422	Contrapisos y Carpetas	lun 17/8/20	mié 19/8/20

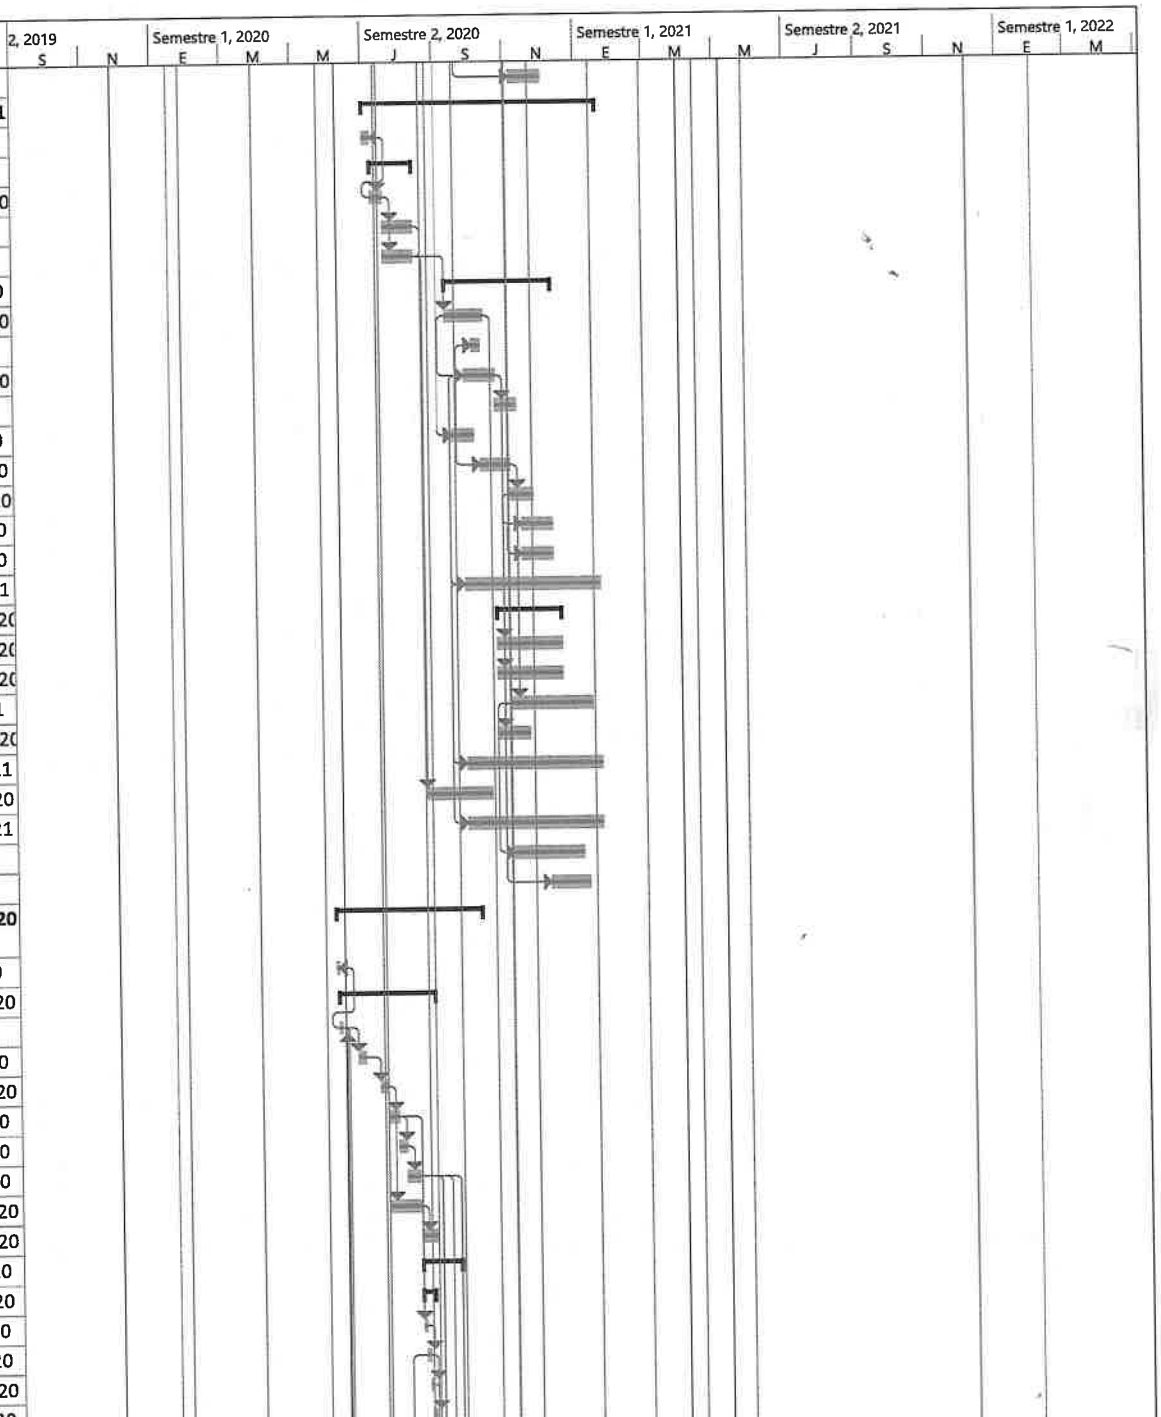

425	Mamposterías	[illegible]	[illegible]
426	Revoques	mié 2/9/20	jue 3/9/20
427	Contrapisos y Carpetas	vie 4/9/20	sáb 5/9/20
428	Pisos y Revestimientos	sáb 5/9/20	mar 8/9/20
429	Techo	sáb 5/9/20	lun 14/9/20
430	Aislacion de losa	sáb 5/9/20	vie 11/9/20
431	Proteccion mecanica	vie 11/9/20	lun 14/9/20
432	18.4. Instalaciones Sanitarias	vie 14/8/20	sáb 29/8/20
433	18.5. Carpintería Metálica y Madera	lun 17/8/20	lun 31/8/20
434	18.5.1. Carpintería de Madera	lun 17/8/20	lun 31/8/20
435	18.5.2. Carpintería Metálica	lun 17/8/20	lun 31/8/20
436	18.5.3. Rejas	lun 17/8/20	lun 31/8/20
437	18.6. Pinturas	sáb 22/8/20	mié 9/9/20
438	18.7. Combate Contra Incendio	vie 14/8/20	sáb 29/8/20
439	18.8. Instalaciones Eléctricas	vie 14/8/20	lun 7/9/20
440	18.10. Instalaciones Señales débiles	vie 14/8/20	lun 7/9/20
441	Techo	mar 15/9/20	mar 6/10/20
442	**19. SALA DE MÁQUINAS, INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y LÍNEA DE MT**	**jue 14/5/20**	**mar 25/1/22**
443	19.1. Sala de Maquinas	jue 14/5/20	mar 25/1/22
444	19.1.1. Trabajos Preliminares	jue 14/5/20	dom 17/5/20
445	Trabajos.Preliminares	sáb 16/5/20	dom 17/5/20
446	Regularizacion de suelo	jue 14/5/20	dom 17/5/20
447	19.1.2. Estructuras de HºAº	dom 17/5/20	jue 10/9/20
448	Pilotes	dom 17/5/20	jue 21/5/20
449	Cabezales y Vigas de Fundacion	mié 8/7/20	mié 15/7/20
450	Pilares	mié 15/7/20	mié 22/7/20
451	Vigas	jue 23/7/20	jue 30/7/20
452	Guarda obra	jue 27/8/20	jue 10/9/20
453	19.1.3. Albañilería	jue 27/8/20	mar 18/1/22
454	Mamposterias	jue 27/8/20	jue 24/9/20
455	Revoque interno de paredes	lun 19/10/20	lun 14/12/20
456	Revoque exterior	lun 14/12/20	mié 30/12/20
457	Aislación	mar 29/9/20	lun 19/10/20
458	Contrapisos y Carpetas	jue 24/9/20	jue 15/10/20
459	Piso de H°A°	mié 29/12/20	mar 18/1/22
460	Impermeabilización tanque inferior y superior	mié 30/12/20	jue 28/1/21
461	19.1.4. Instalaciones Sanitarias	lun 19/10/20	dom 1/11/20
462	19.1.5. Carpintería de Madera y Metálicas	lun 14/12/20	mié 23/12/20
463	19.1.5.1. Carpintería de Madera	lun 14/12/20	mié 23/12/20
464	19.1.5.2. Carpintería Metálica	lun 14/12/20	mié 23/12/20
465	19.1.6. Pinturas	mié 23/12/20	jue 7/1/21
466	19.1.7. Combate Contra Incendio	jue 4/11/21	mar 25/1/22
467	19.1.8. Instalaciones Eléctricas	jue 3/9/20	jue 4/11/21
468	Instalaciones electricas	jue 3/9/20	mié 23/12/20
469	Provision y montaje de Generador	mié 23/12/20	jue 4/11/21
470	Provision y montaje de Transformador	mié 23/12/20	jue 4/11/21
471	19.1.9. Techo	jue 30/7/20	jue 27/8/20
472	19.1.10. Instalaciones Señales débiles	jue 4/11/21	mié 1/12/21

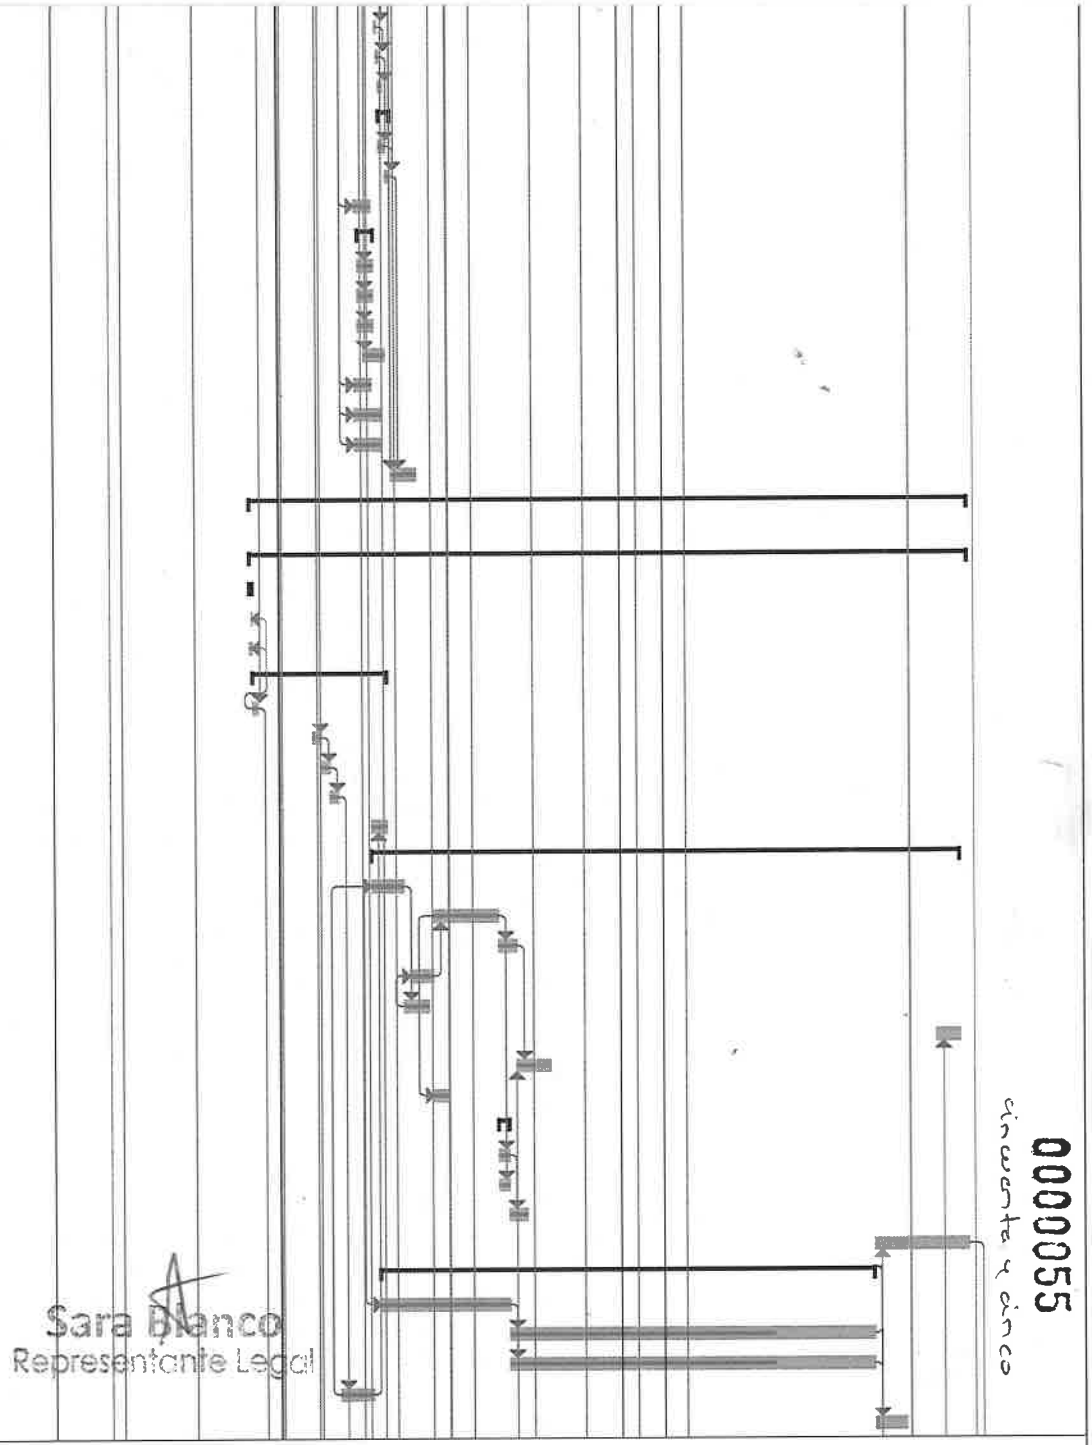

Sara Blanco
Representante Legal

0000055
cincuenta y cinco

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
473	19.2. Provisión e instalación Extensión de Linea de Media Tensión	jue 4/11/21	mar 28/12/21
474	19.2.1. Instalaciones Eléctricas	jue 4/11/21	mar 28/12/21
475	**20. RAMPA DE SERVICIO COCINA Y ENFERMERIA**	**vie 15/5/20**	**sáb 26/12/20**
476	20.1. Trabajos Preliminares	vie 15/5/20	jue 21/5/20
477	Regularizacion de suelo	vie 15/5/20	jue 21/5/20
478	20.2. Estructuras de HºAº	jue 21/5/20	vie 4/12/20
479	Pilotes	jue 21/5/20	lun 25/5/20
480	Cabezales y Vigas de Fundacion	mar 27/10/20	mié 4/11/20
481	Cabezales y Vigas de Fundacion para tanque	mié 4/11/20	mar 17/11/20
482	Pilares	mié 4/11/20	dom 15/11/2
483	Losas	dom 15/11/2	vie 4/12/20
484	Vigas	dom 15/11/2	vie 4/12/20
485	20.3. Techo	vie 4/12/20	sáb 26/12/20
486	**21. GALERÍA DE INTERCONEXIÓN - ESTRUCTURA**	**mar 19/5/20**	**vie 22/1/21**
487	Trabajos preliminares	mar 19/5/20	lun 25/5/20
488	21.1. Estructura de H°A° Planta Baja	lun 25/5/20	vie 22/1/21
489	Pilotes	lun 25/5/20	mié 3/6/20
490	Cabezales y Vigas de Fundacion	jue 30/7/20	lun 14/9/20
491	Pilares	lun 3/8/20	mar 29/9/20
492	Vigas	vie 7/8/20	mié 21/10/20
493	Losas	vie 7/8/20	mié 21/10/20
494	Piso de H°A°	mar 29/9/20	vie 22/1/21
495	Rampa de H°A°	mar 29/9/20	mar 27/10/20
496	21.2. Estructura de H°A° Planta Alta	jue 27/8/20	lun 16/11/20
497	Pilares	jue 27/8/20	mar 27/10/20
498	Vigas	jue 3/9/20	lun 16/11/20
499	Losas	jue 3/9/20	lun 16/11/20
500	**22. GALERÍA DE INTERCONEXION - ARQUITECTURA**	**jue 3/9/20**	**jue 21/1/21**
501	22.1. GALERÍA DE CIRCULACIÓN - PLANTA BAJA - MÓDULOS INTERNAMIENTO	jue 3/9/20	jue 21/1/21
502	22.1.2. Instalaciones Eléctricas	mié 9/9/20	vie 13/11/20
503	22.1.3. Albañileria	jue 3/9/20	jue 21/1/21
504	Mamposterias	jue 3/9/20	dom 8/11/20
505	Revoque interno de paredes	mié 9/9/20	dom 15/11/2
506	Revoque exterior	mar 6/10/20	mié 25/11/20
507	Revoque de losa	vie 18/9/20	dom 22/11/2
508	Carpeta	dom 8/11/20	dom 20/12/2
509	Pisos y zocalos	dom 6/12/20	jue 21/1/21
510	22.1.4. Instalaciones Sanitarias	mié 9/9/20	mar 17/11/20
511	22.1.5. Carpintería Metálica	mié 9/9/20	mar 17/11/20
512	22.1.6. Pinturas	mié 23/9/20	mar 1/12/20
513	22.1.7. Combate Contra Incendio	mié 9/9/20	vie 13/11/20
514	**23. GALERÍA DE CIRCULACIÓN - PLANTA ALTA - MÓDULOS INTERNAMIENTO**	**mar 22/9/20**	**mié 16/12/20**

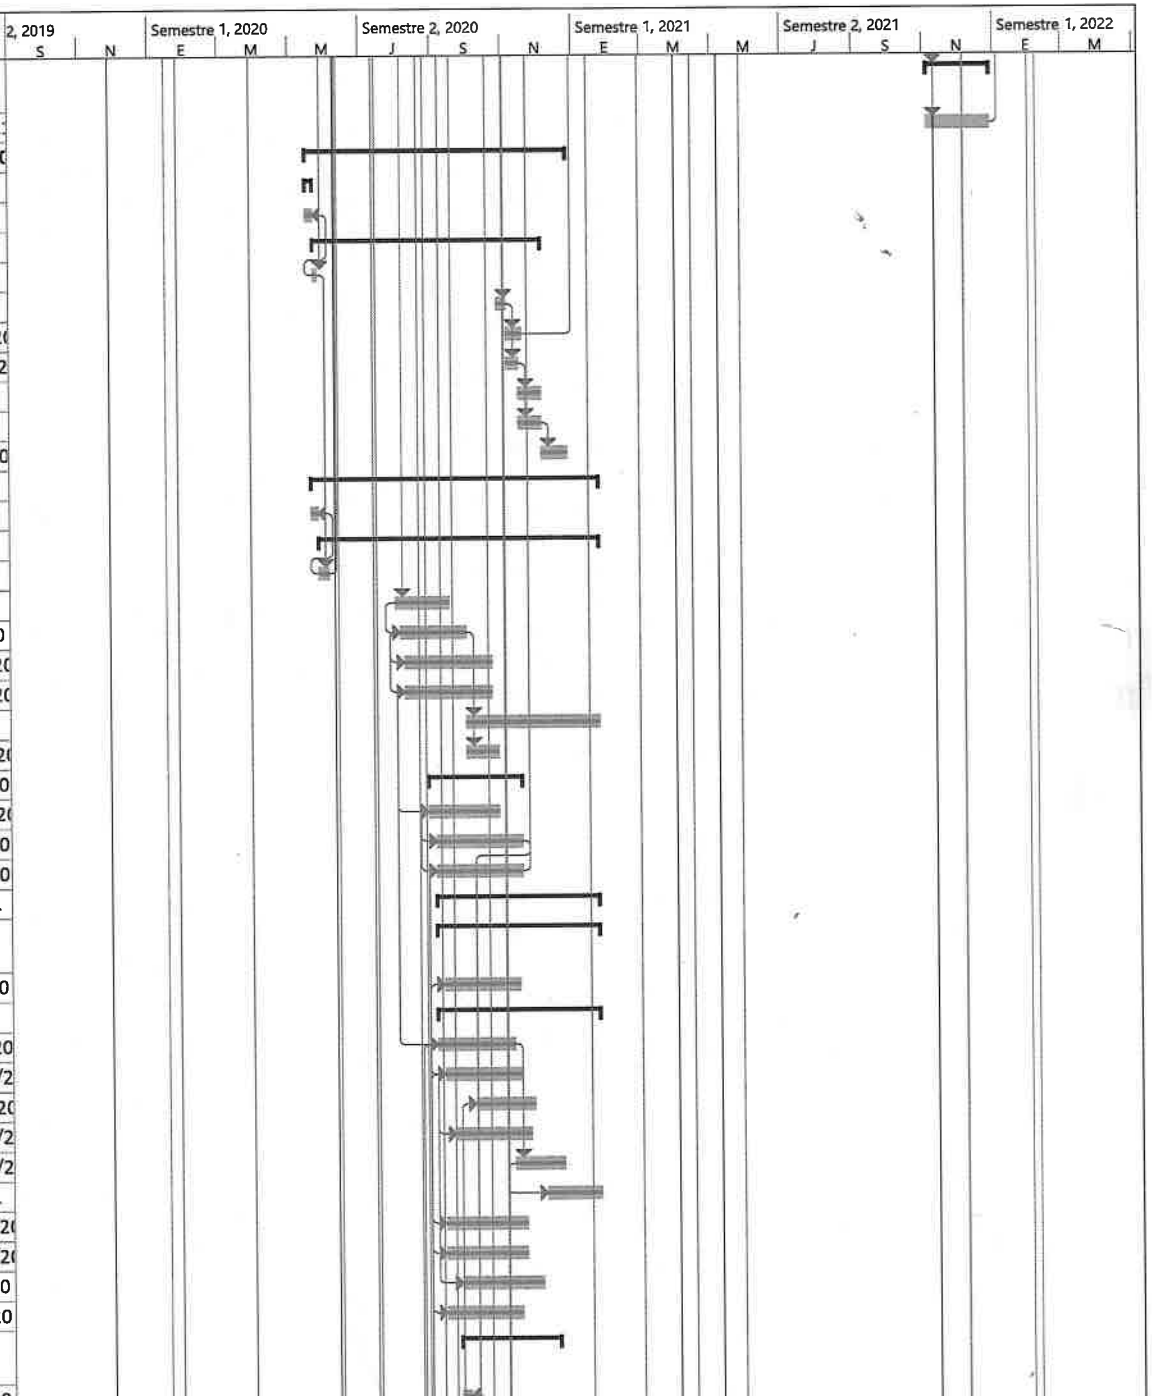

518	Revoque interno de paredes	mar 6/10/20	dom 6/12/20
519	Revoque exterior	mar 6/10/20	vie 11/12/20
520	Revoque de losa	jue 15/10/20	lun 14/12/20
521	23.3. Carpintería Metálica	mar 6/10/20	mié 9/12/20
522	23.4. Pinturas	lun 12/10/20	mié 16/12/20
523	23.5. Combate Contra Incendio	dom 25/10/2	jue 10/12/20
524	23.6. Instalaciones Eléctricas	mar 6/10/20	lun 14/12/20
525	23.7. Techo	mar 6/10/20	lun 14/12/20
526	23.8. Instalaciones Señales débiles	mar 6/10/20	lun 14/12/20
527	**24. GALERÍA DE CIRCULACIÓN - COMEDOR - PLANTA BAJA**	**lun 31/8/20**	**mar 1/12/20**
528	Trabajos Preliminares	lun 31/8/20	dom 6/9/20
529	24.2. Albañileria	jue 3/9/20	mié 25/11/20
530	Mamposterias	jue 3/9/20	dom 8/11/20
531	Revoque interno de paredes	mié 9/9/20	dom 15/11/2
532	Revoque exterior	mar 6/10/20	mié 25/11/20
533	Revoque de losa	vie 18/9/20	dom 22/11/2
534	24.3. Pinturas	mié 23/9/20	mar 1/12/20
535	24.4. Combate Contra Incendio	mié 9/9/20	vie 13/11/20
536	24.5. Instalaciones Eléctricas	mié 9/9/20	mar 17/11/20
537	24.6. Carpinteria Metalica	mié 9/9/20	mar 17/11/20
538	**25. GALERÍA DE CIRCULACIÓN - ADMINISTRACIÓN, COCINA Y VISITAS - PLANTA BAJA**	**lun 2/11/20**	**dom 27/12/20**
539	Trabajos Preliminares	lun 2/11/20	dom 8/11/20
540	25.2. Albañileria	dom 8/11/20	sáb 26/12/20
541	Mamposterias	dom 8/11/20	jue 19/11/20
542	Revoque interno de paredes	jue 19/11/20	sáb 28/11/20
543	Revoque exterior	lun 7/12/20	sáb 26/12/20
544	Revoque de losa	sáb 28/11/20	sáb 5/12/20
545	25.3. Instalaciones Sanitarias	jue 19/11/20	mié 9/12/20
546	25.4. Carpintería Metálica	jue 19/11/20	jue 3/12/20
547	25.5. Pinturas	sáb 28/11/20	dom 27/12/2
548	25.6. Combate Contra Incendio	jue 19/11/20	mié 9/12/20
549	25.7. Instalaciones Eléctricas	jue 19/11/20	mar 22/12/20
550	25.8. Instalaciones Señales débiles	jue 19/11/20	mar 22/12/20
551	**26. GALERÍA DE CIRCULACIÓN - PLANTA ALTA - ADMINISTRACIÓN, COCINA Y VISITAS**	**lun 19/10/20**	**vie 15/1/21**
552	Trabajos Preliminares	jue 19/11/20	jue 26/11/20
553	26.2. Albañileria	jue 26/11/20	sáb 26/12/20
554	Mamposterias	jue 26/11/20	lun 7/12/20
555	Revoque interno de paredes	lun 7/12/20	jue 17/12/20
556	Revoque exterior	lun 7/12/20	sáb 26/12/20
557	Revoque de losa	jue 17/12/20	mié 23/12/20
558	26.3. Carpintería Metálica	jue 17/12/20	lun 4/1/21
559	26.4. Pinturas	jue 17/12/20	vie 15/1/21
560	26.5. Combate Contra Incendio	lun 7/12/20	mar 29/12/20
561	26.6. Instalaciones Eléctricas	lun 7/12/20	mié 13/1/21
562	26.7. Techo	lun 19/10/20	vie 6/11/20
563	26.8. Instalaciones Señales débiles	lun 7/12/20	mié 13/1/21
564	**27. CASETA DE GUARDIA - ACCESO EN PERIMETRO**	**vie 5/6/20**	**mié 7/10/20**

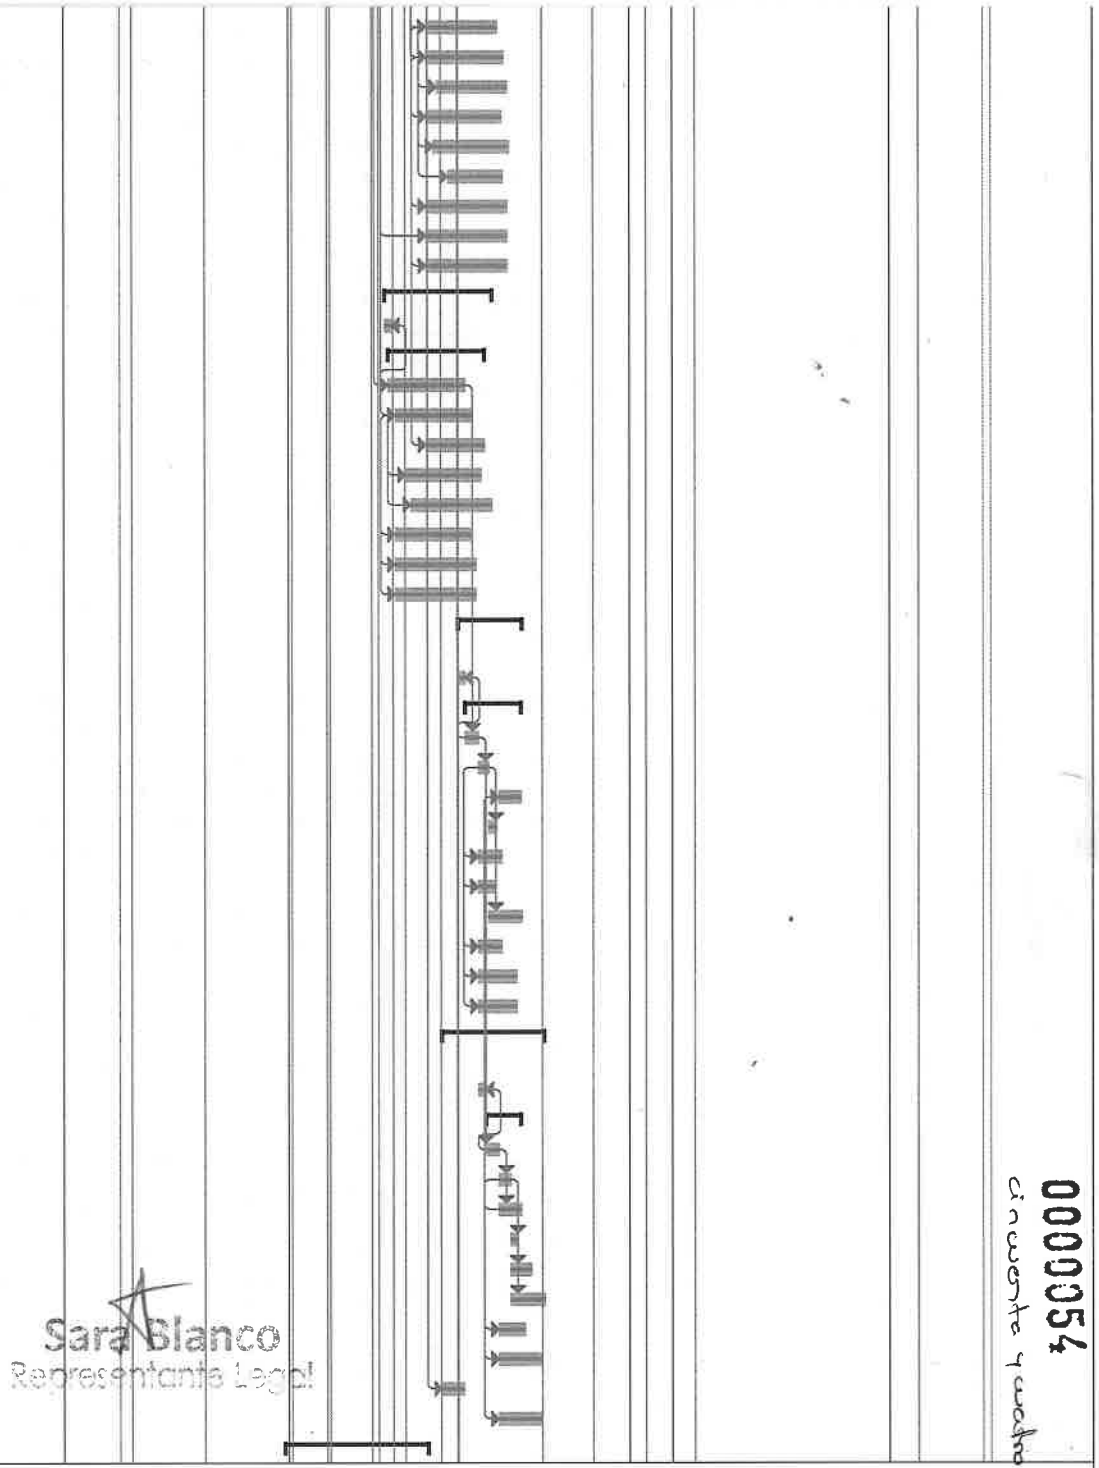

Sara Blanco
Representante Legal

0000054
cincuenta y cuatro

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
565	27.1. Estructura de H°A°	vie 5/6/20	lun 21/9/20
566	Pilotes	vie 5/6/20	dom 7/6/20
567	Cabezales y Vigas de Fundacion	lun 7/9/20	sáb 12/9/20
568	Pilares	sáb 12/9/20	lun 14/9/20
569	Vigas y Losas	mar 15/9/20	lun 21/9/20
570	27.2. Albañilería	mar 15/9/20	sáb 3/10/20
571	Cimiento de piedra	mar 15/9/20	lun 21/9/20
572	Mamposterias	lun 21/9/20	jue 24/9/20
573	Revoques	vie 25/9/20	dom 27/9/20
574	Contrapisos y Carpetas	dom 27/9/20	mié 30/9/20
575	Pisos y Revestimientos	mié 30/9/20	sáb 3/10/20
576	27.3. Instalaciones Sanitarias	vie 25/9/20	lun 5/10/20
577	27.4. Carpintería de Madera y Metálicas	mié 30/9/20	vie 2/10/20
578	27.5. Pinturas	sáb 3/10/20	mié 7/10/20
579	27.6. Instalaciones Eléctricas	vie 25/9/20	lun 5/10/20
580	27.7. Techo	jue 1/10/20	mié 7/10/20
581	27.8. Instalaciones Señales débiles	vie 25/9/20	lun 5/10/20
582	**28. OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNAS**	**lun 27/1/20**	**vie 24/12/21**
583	28.1. Trabajos Preliminares	lun 27/1/20	dom 23/2/20
584	28.2. Cercado Interno de Malla Tejida	sáb 25/9/21	vie 17/12/21
585	28.3. MURO PERIMETRAL DE HORMIGÓN EXTERIOR Y GARITA	lun 27/1/20	vie 10/12/21
586	28.3.1. Trabajos Preliminares	lun 27/1/20	dom 23/2/20
587	28.3.2. Estructuras de HºAº	sáb 1/2/20	vie 10/12/21
588	Pilotes	sáb 1/2/20	sáb 23/5/20
589	Cabezales y Vigas de Fundacion	jue 26/3/20	sáb 18/7/20
590	Muro Pantalla	dom 21/6/20	vie 10/12/21
591	Viga de Coronamiento	dom 21/6/20	vie 10/12/21
592	Pilares	dom 21/6/20	vie 10/12/21
593	Vigas y Losas	dom 21/6/20	vie 10/12/21
594	**28.3.3 Albañilería**	**jue 1/10/20**	**sáb 20/3/21**
595	Contrapiso	jue 1/10/20	mié 23/12/20
596	Aislación en baños	mié 23/12/20	sáb 20/3/21
597	28.3.4. Instalaciones Sanitarias	dom 20/6/21	vie 10/12/21
598	28.3.4.1. Agua corriente general	sáb 16/10/21	vie 10/12/21
599	28.3.4.2. Pluvial General	dom 20/6/21	vie 10/12/21
600	28.3.4.3 Cloacal General	jue 9/12/21	vie 10/12/21
601	28.3.5. Combate Contra Incendio	sáb 18/7/20	vie 24/12/21
602	28.3.5.1. Instalación de cañerias para el sistema contra incendio desde la caseta a las B.I.E y B.I.S	sáb 13/11/21	mié 1/12/21
603	28.3.5.2 Combate contra incendios interno	sáb 13/11/21	vie 10/12/21
604	28.3.5.2. Instalación de cañeria del Pozo al Reservorio	mar 26/10/2	sáb 13/11/21
605	28.3.6. Instalaciones Señales débiles	sáb 18/7/20	jue 11/3/21
606	28.3.7. Pinturas	sáb 31/7/21	vie 24/12/21
607	**29. ITEMS CONVENIO MODIF. 1**	**jue 21/11/19**	**lun 14/6/21**
608	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	dom 22/3/20	lun 13/7/20
609	Pozo artesiano	jue 21/11/19	lun 25/11/19

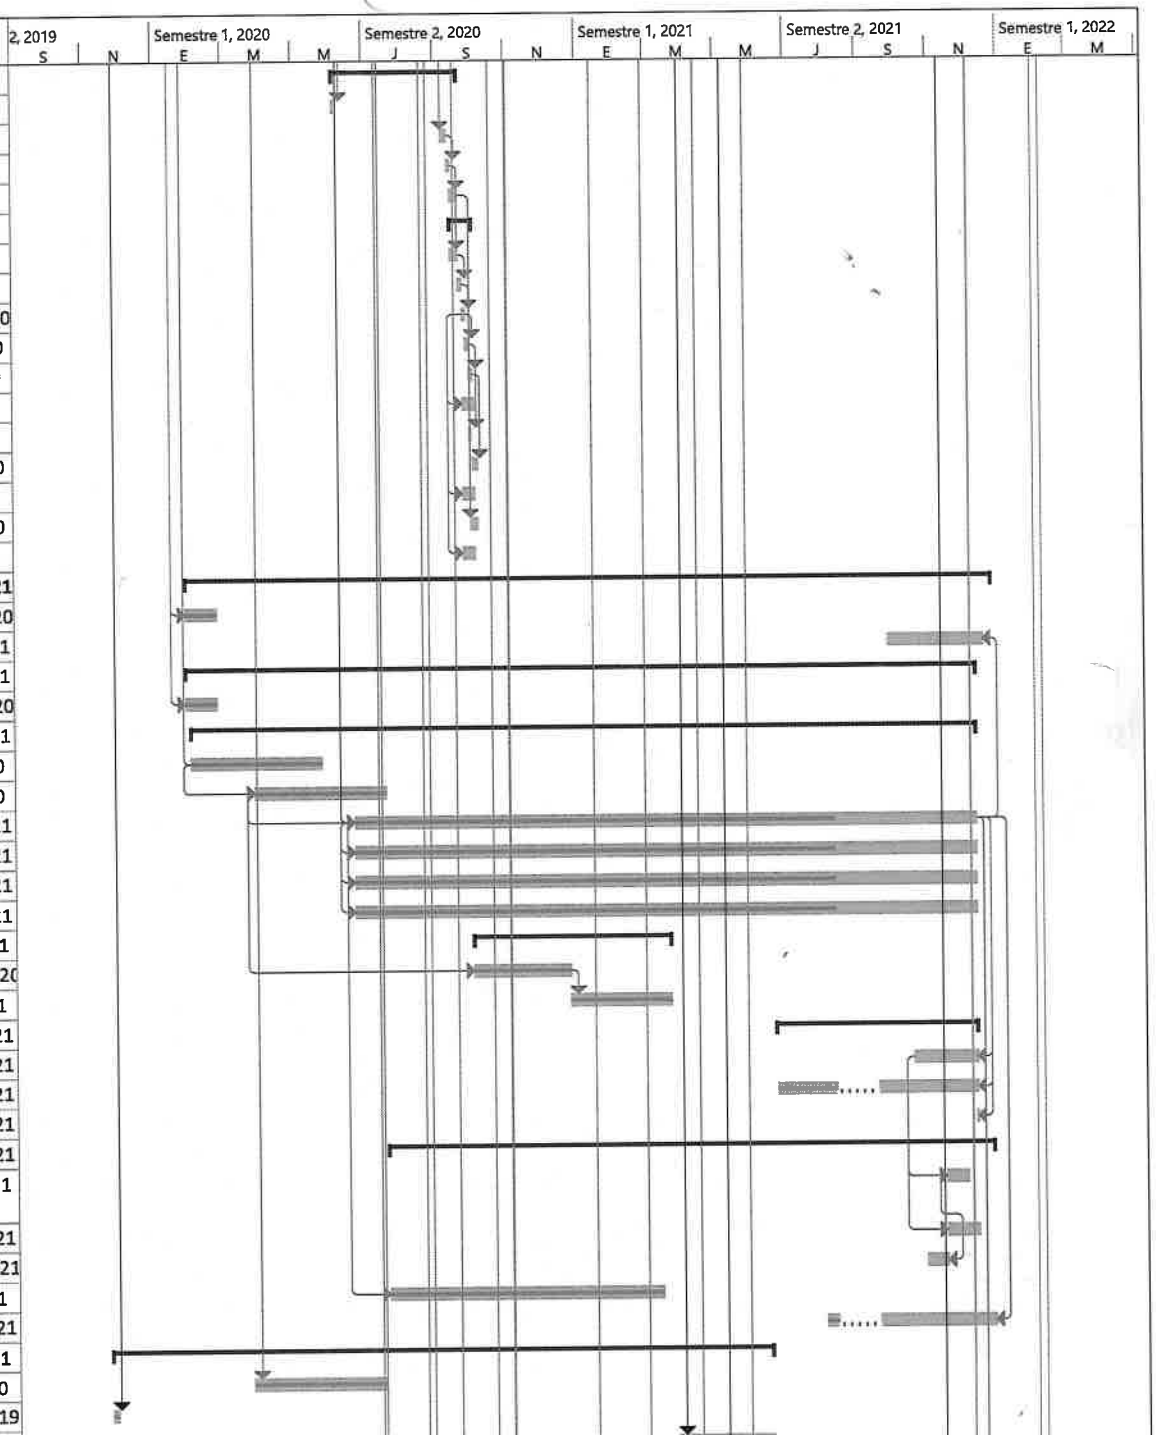

612	**30. ITEMS CONVENIO MODIF. 2**	**mié 8/7/20**	**dom 30/1/22**
613	**Contrapisos**	**mié 19/8/20**	**mié 17/2/21**
614	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Visitas Planta Alta	jue 7/1/21	mié 17/2/21
615	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Administracion Planta Alta	lun 12/10/20	dom 6/12/20
616	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Cocina Planta Alta	mié 19/8/20	mié 14/10/20
617	**Garitas de guardia**	**dom 6/6/21**	**dom 30/1/22**
618	Estructura de H°A° para Garitas de Vigilancia. Fck:250Kg/cm2. Losa de piso, Muros y Losa de Techo. 13 Unidades (Garita)	dom 6/6/21	sáb 30/10/21
619	VG1_Ventana de vidrio templado de 8mm con carpinteria de aluminio DE 1,10X1,00 mts (Garita)	sáb 30/10/21	vie 24/12/21
620	PMG1_Puerta metalica con visor de vidrio para acceso a garita. 0,70x2,10 (Garita)	sáb 30/10/21	vie 24/12/21
621	Pintura de paredes al látex (Garita)	vie 24/12/21	dom 30/1/22
622	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta, incluye instalaciones de cañerias.	sáb 30/10/21	vie 24/12/21
623	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	sáb 30/10/21	vie 24/12/21
624	Instalacion electrica. Incluye; ductos, cableados, artefactos de iluminacion tipo LED de 18W	sáb 30/10/21	vie 24/12/21
625	Escalera metalica de acceso a Garita tipo caracol. Huella; ancho 1,10 mts. Altura total: 6 mts. Sistema de barandas, rodapie, fundaciones, estructura metálica independiente. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	sáb 30/10/21	vie 24/12/21
626	Puente de acceso metalico de union entre escalera y garita. Incluye pasamanos metalicos. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	sáb 30/10/21	vie 26/11/21
627	**Planta de Tratamiento**	**lun 14/9/20**	**mié 17/2/21**
628	Obras civiles Preliminares	dom 20/12/2	mié 17/2/21
629	Provisión y Montaje de Planta de Tratamiento de Efluentes	lun 14/9/20	mié 3/2/21
630	Aductora de impulsión de efluentes (incluye sistema de impulsion)	jue 21/1/21	mié 17/2/21
631	**Tanque elevado**	**dom 12/7/20**	**sáb 12/12/20**
632	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	sáb 25/7/20	dom 23/8/20
633	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	dom 23/8/20	sáb 19/9/20
634	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	sáb 19/9/20	sáb 12/12/20
635	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 (Tanque)	dom 12/7/20	sáb 25/7/20
636	**Hormigon - ADMINISTRACION**	**mié 8/7/20**	**dom 6/12/20**
637	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Rampa de Visitas)	lun 26/10/20	dom 8/11/20
638	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Rampa de Visitas)	dom 8/11/20	dom 22/11/2
639	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Rampa Visitas)	dom 22/11/20	dom 6/12/20
640	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Visitas	mar 27/10/20	sáb 21/11/20
641	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Administracion	jue 13/8/20	jue 24/9/20
642	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Cocina	mié 8/7/20	mar 4/8/20
643	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) PABELLON COCINA Y LAVANDERIA	mar 4/8/20	mié 2/9/20
644	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 (RAMPA VISITAS)	mié 30/9/20	mar 6/10/20
645	**Techo**	**lun 12/10/20**	**dom 21/2/21**
646	Techo con estructura metálica (RAMPA VISITAS)	dom 22/11/2	dom 20/12/2
647	Cierre triangular testero para techo	lun 12/10/20	mié 3/2/21
648	Ajustes de cantidades de techos en gral	lun 12/10/20	dom 21/2/21

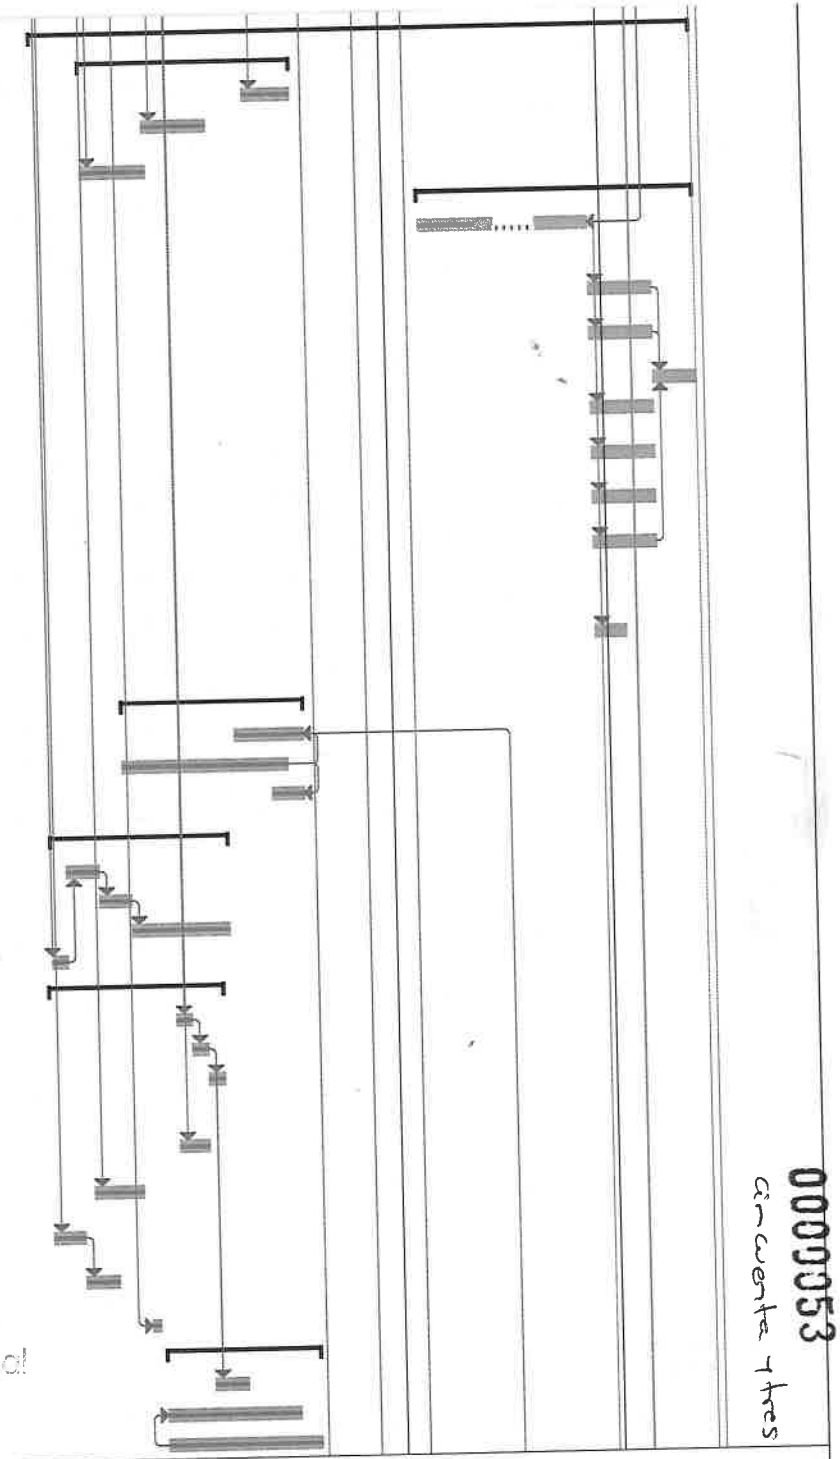

Sara Blanco
Representante Legal

00000053
Cincuenta y tres
