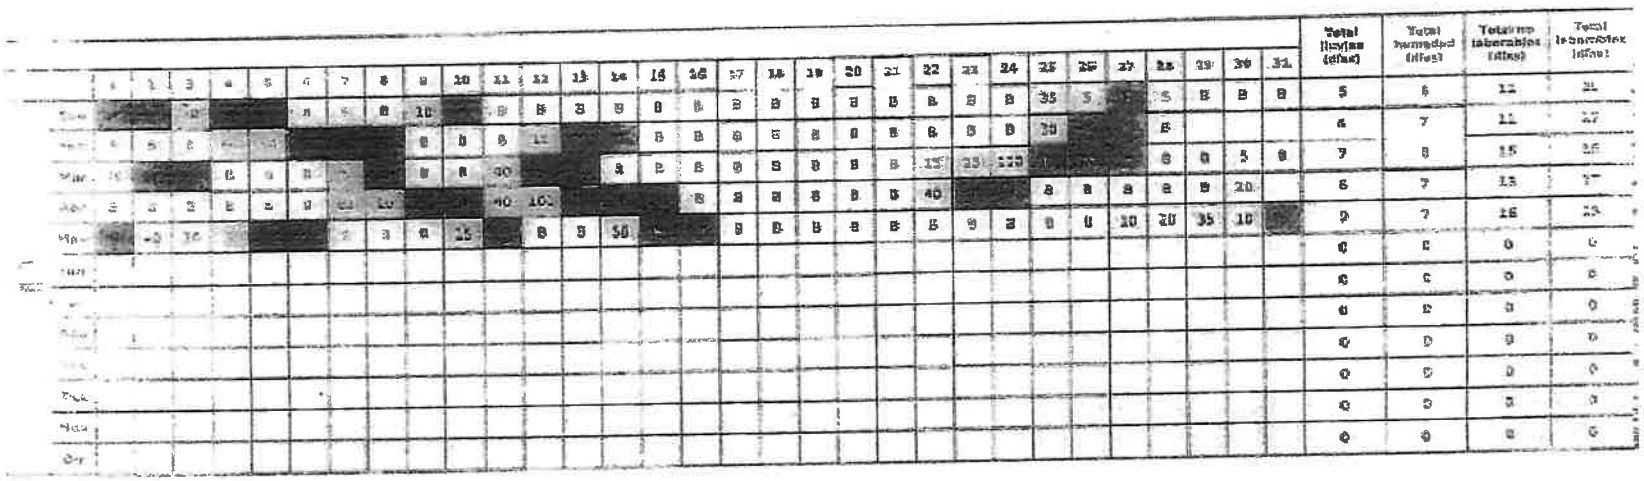

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total horadas (días)	Total trabajos laborables (días)	Total no laborables (días)
Ene																																5	6	11	31
Feb																																6	7	11	27
Mar																																7	8	15	26
Abr																																6	7	13	27
May																																9	7	16	23
Jun																																0	0	0	0
Jul																																0	0	0	0
Ago																																0	0	0	0
Sep																																0	0	0	0
Oct																																0	0	0	0
Nov																																0	0	0	0
Dic																																0	0	0	0

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ING. JESÚS MARÍA DUQUETTE ORTIZ
FISCALIZADORA DE OBRA
MOPC

ING. JESÚS M. DUQUETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GMANS - MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. Rolando Rios Tombolly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

31 (Treinta y uno)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total horas (día)	Total personas (día)	Total horas (mes)	Total horas (año)
2021	Ene	8	8	8	48	H	H	80	H	H	8	8	32	20	H	H	8	80	H	40	8	H	H	8	8	8	H	10	16	20	H	8	32	14	23	8
	Feb	30	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8					7	1	8	16
	Mar	8	8	16	56	20	H	H	8	8	8	8	8	8	8	8	30	H	8	8	8	30	10	H	H	8	8	8	8	8	8		9	5	12	19
	Abr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	25	H	8	8	8	8	8	20	12	H	8	8	8	8			3	2	5	25
	May	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	35	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	1	8	28
	Jun	8	8	8	8	8	45	20	H	H	50	H	H	8	8	8	8	8	20	8	H	H	8	8	8	8	8	20	H	H	8		7	8	15	15
	Jul	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	25	8	H	8	10	3	3	8	25
	Ago	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	H	H	8	8	8	8	1	3	4	32
	Sep	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	1	8	20
	Oct	20	115	20	H	8	H	40	H	30	8	H	8	8	8	25	H	H	8	8	8	8	8	80	H	H	8	8	8	8	8	8	9	11	38	71
	Nov	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	H		2	2	8	25
	Dec	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	0	1	30

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ING. JESUS MARIA DUETTE ORTIZ
FISCALIZADORA DE OBRAS
MOPC

ING. JESUS M. DUETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GHANIS - MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNODIESEL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal

30 (Treinta)

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

Contratación de Empresas **Constructoras Especializadas en obras viales para la ejecución de las obras de Rehabilitación a precios unitarios y Mantenimiento por estándares del Tramo Curuguaty - Saltos del Guairá (164,70 km).**

Certificado de Trabajo Nº: 13 - Julio/2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
020	Jul	B	B	B	B	B	5	25	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	1	3	28
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	[illegible]	73	[illegible]	[illegible]	65	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	5	8	23
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	10	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	1	2	28
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	19	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	42	[illegible]	[illegible]	B	B	2	3	5	26
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	30	[illegible]	[illegible]	B	B	B	15	[illegible]	[illegible]	55	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10		4	6	10	20
	Dic	[illegible]	B	70	55	25	[illegible]	[illegible]	B	B	B	B	B	B	40	[illegible]	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	8	23

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ING. JESÚS MARÍA OYETTE ORTIZ
FISCALIZADOR DE LA OBRA
ING. JESÚS M. OYETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GMANS - MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

E-0031

29 (veintinueve)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

28 (Veintiocho)

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de ruta. Cruce Carolina.

Por la presente, la empresa contratista comunica por este medio a la Fiscalización que desde la fecha 28/07/21 se iniciaron paro de transportistas a nivel nacional. obstaculizando la circulación de vehículos pesados en el cruce Carolina y en la entrada de la ciudad de Curuguaty (principio del tramo), impidiendo así el transporte de materiales a los distintos puntos del tramo.

ANEXO:

Fecha: 02/08/21

Por la Fiscalización

ING. JESÚS M. DUETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GMANS - MOPC

Por el Contratista

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

27 (Veintisiete)

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de ruta - nuevo Plan de Trabajo

La empresa contratista comunica la fiscalización que el paro de transportistas mencionado anteriormente se intensificó en los últimos dias, bloqueando por completo la circulacion de vehículos pesados por los distintos puntos de la RUTA PY03 (Calle 6000, Curuguaty; Cruce Carolina).

A consecuencia de ello no estamos pudiendo recibir materiales para continuar con los trabajos previstos según el plan de trabajo vigente, perjudicando los avances programados.

La empresa contratista ameritara una notificacion de un nuevo plan de trabajo considerando estas inconvenientes.

ANEXO:

Fecha: 05 | 08 | 21

Por la Fiscalización

ING. JESUS M. DUETTE O.
FISCAL DE OBRAS
UE - GMANS - MOPC

ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Por el Contratista

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

26 (veintiseis)

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Escasez de CAP c/ polimero

La empresa contratista informa por este medio a la fiscalizacion la escasez de provision de CAP con polimero. desde el mes de Junio del año 2021. provenientes de Brasil y otros paises proveedores a raiz de la bajante del rio. Motivos por los cuales tuvimos atrasos en la ejecucion de la obra. de puesta a punto.

ANEXO:

Fecha: 10 / 11 / 2021

Por la fiscalización

Por el Contratista

Ing. ROLANDO RIOS YOMBOLY

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

25 (Veinticinco)

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de ruta por motivos de paro de transportistas

La empresa contratista comunica que desde el dia Lunes 14/03 la ruta PY 03 y otros distintos puntos del pais se encuentran bloqueadas por motivos del paro de transportistas, imposibilitando la libre circulación de vehiculos de gran porte y de vehiculos livianos.

Por el momento no se conoce alguna noticia sobre el levantamiento de dicho paros.

ANEXO:

Fecha: 17 | 03 | 22

Por la Fiscalización

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Por el Contratista

24 (Veinticuatro)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 40273/2022

TITULAR:
TECNOEDIL S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Diego García

TELEFONO:
0961722612

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. LLAMADO MOPC Nº 39/2019. REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO OPP.

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 14643
Fecha 06 SEP 2022 Hora 8:20
Iván
Firma

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 05/09/2022 13:48:39

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullia Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 06 SEP 2022

☐ VMAF	☑ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RU/BTR	☐ UGPAS	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEP IP
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 11679 (mev 40273)
Fecha 07/09/22
Firma:

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.09.05 14:01:02 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMAF ☐ DGV
☐ ATD ☐ DPV
☐ DC

UE Gmans

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

23 (Veintitres)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN

0000036

OBRA: 'CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA' ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Cierre de ruta por paro de transportistas y otros antes.

La empresa contratista comunica a la fiscalización que continúan los paros de transportistas por todo el trayecto de la ruta PY03 lo cual nos sigue generando problemas para la continuación de nuestros trabajos, ya que paralizan la circulación de los vehículos de gran porte y a consecuencia de ello tenemos falta de de insumos en obra. como Filler, Gas oil, Fuel Oil entre otros.

ANEXO:

Fecha: 20 | 03 | 22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

FOR-FIS-LDF-01-04

22 (Veintidos)

LIBRO DE FISCALIZACIÓN 0000037

OBRA: "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS TRAMO: CURUGUATY-SALTO DEL GUAIRA" ID: 366301

Comitente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Fiscalización: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: Tecnoedil S.A. Contructora

ASUNTO: Continuación de cierre de rutas por paro de transportistas y campesinos

la empresa contratista comunica a la fiscalizacion que continúan el cierre de ruta en varios puntos de la ruta PY 03 por motivos de paro de transportistas y tambien de campesinos lo cual no permiten circular vehiculos de gran porte y los vehiculos livianos solamente liberan en determinados horarios

Los trabajos en pista no se pueden avanzar por falta de los insumos que son provistos por dichos vehiculos de gran porte, insumos como filler, CAP, Gasoil, Fuel oil, emulsión imprima, entre otros

El cierre de ruta se registra desde el lunes 14/03 hasta la fecha, y no se tiene noticias sobre el levantamiento de las mismas

ANEXO:

Fecha: 23/03/22

Por la Fiscalización

Por el Contratista

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

FOR-FIS-LDF-01-04
