17 (diecisiete)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DCV N° 2491/2022

Asunción, 8 de agosto de 2022

CONSORCIO SAN JORGE
Itá Ybate 1907 c/José Félix Bogado, Asunción.
Teléfono: (+595 21) 302 – 470
Correo: caldetec@rieder.net.py;
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 39/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPÁ, GUAIRÁ Y MISIONES. LOTE 4. ID N° 364.659. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 460/2019.**
Obj.: Aprobación prorroga por lluvias y sus consecuencias.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato de la referencia, en respuesta a la Nota con Exp. MEU Nº 32582 de fecha 19/07/2022 por medio de la cual solicitan prórroga de plazos por el evento de lluvias y sus consecuencias para las obras correspondientes al Lote 4-Contrato S.G. MINISTRO Nº 460/19.

Al respecto, luego del análisis de lo solicitado y en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, libros de obras, planilla de lluvias del SICOE y contando con el parecer favorable del supervisor de obras, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2.2), no presenta objeciones a la prórroga del plazo en quince días calendarios (15), por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el mes de Junio 2022, no se deducen los días de inclemencia previsibles en las CEC, pues corresponden a inclemencias ocurridas fuera del plazo contractual, quedando como nueva fecha de terminación de obras el 8 de agosto de 2022.

Se adjunta el Cronograma de Trabajo y la Curva de Avance Físico Financiero aprobado y firmado por las partes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

MOP y C * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales

CURVA DE AVANCE F
Consorcio

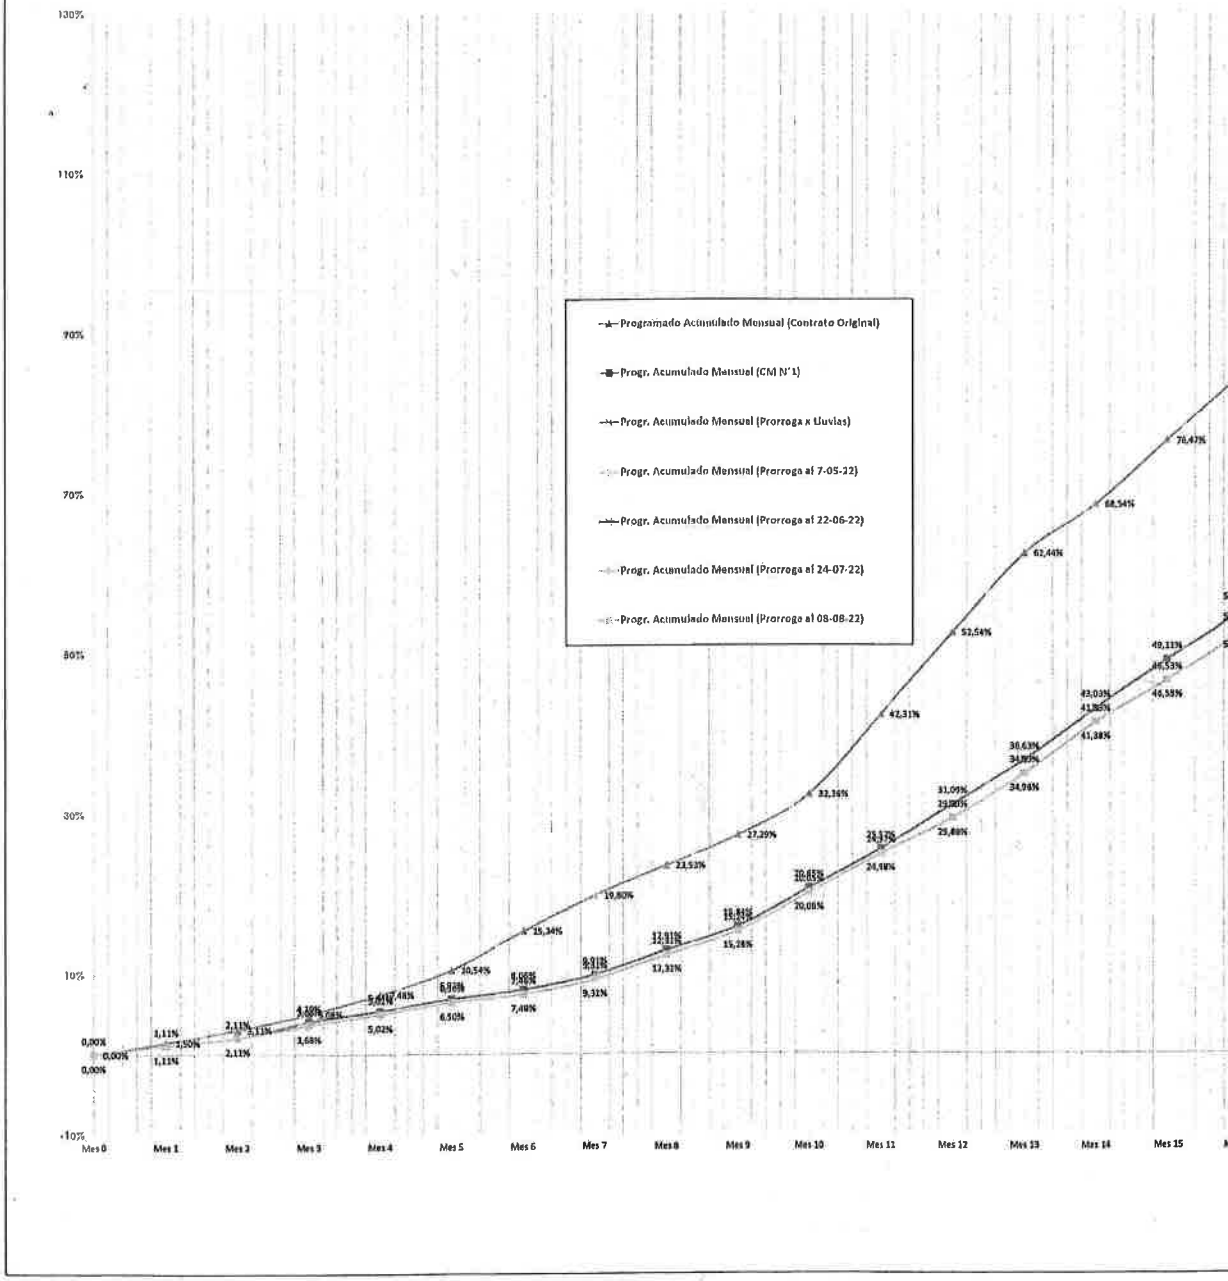

MES	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sept-20	oct-20	nov-20	dic-20
	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Programado Mensual-(Prorroga al 08-08-22)	0,00%	1,11%	1,00%	1,57%	1,34%	1,48%	0,97%	1,85%	3,00%	2,93%	4,81%
Progr. Acumulado Mensual (Prorroga al 08-08-22)	0,00%	1,11%	2,11%	3,68%	5,02%	6,50%	7,47%	9,32%	12,32%	15,25%	20,06%
Programado Mensual-(Prorroga al 24-07-22)	0,00%	1,11%	1,00%	1,57%	1,34%	1,48%	0,97%	1,85%	3,00%	2,93%	4,81%
Progr. Acumulado Mensual (Prorroga al 24-07-22)	0,00%	1,11%	2,11%	3,68%	5,02%	6,50%	7,47%	9,32%	12,32%	15,25%	20,06%
Programado Mensual-(Prorroga al 22-06-22)	0,00%	1,11%	1,00%	1,57%	1,34%	1,48%	0,96%	1,85%	3,00%	2,93%	4,81%
Progr. Acumulado Mensual (Prorroga al 22-06-22)	0,00%	1,11%	2,11%	3,68%	5,02%	6,50%	7,46%	9,31%	12,31%	15,24%	20,05%
Programado Mensual-(Prorroga al 7-05-22)	0,00%	1,11%	1,00%	1,57%	1,34%	1,48%	0,96%	1,85%	3,00%	2,93%	4,81%
Progr. Acumulado Mensual (Prorroga al 7-05-22)	0,00%	1,11%	2,11%	3,68%	5,02%	6,50%	7,46%	9,31%	12,31%	15,24%	20,05%
Programado Mensual-(Prorroga x Lluvias)	0,00%	1,11%	1,00%	1,57%	1,34%	1,48%	0,96%	1,85%	3,00%	2,93%	4,81%
Progr. Acumulado Mensual (Prorroga x Lluvias)	0,00%	1,11%	2,11%	3,68%	5,02%	6,50%	7,46%	9,31%	12,31%	15,24%	20,05%
Programado Mensual- (CM N°1)	0,00%	1,11%	1,00%	1,99%	1,34%	1,48%	1,14%	1,85%	3,00%	2,93%	4,81%
Progr. Acumulado Mensual (CM N°1)	0,00%	1,11%	2,11%	4,10%	5,44%	6,92%	8,06%	9,91%	12,91%	15,84%	20,65%
Programado Mensual (Contrato Original)	0,00%	1,50%	1,61%	1,97%	2,40%	3,06%	4,80%	4,46%	3,73%	3,76%	5,07%
Programado Acumulado Mensual (Contrato Original)	0,00%	1,50%	3,11%	5,08%	7,48%	10,54%	15,34%	19,80%	23,53%	27,29%	32,36%
Ejecutado Mensual	0,00%	1,38%	1,32%	1,59%	1,86%	1,90%	5,53%	5,12%	3,29%	5,14%	2,82%
Ejecutado Acumulado Mensual	0,00%	1,38%	2,70%	4,29%	6,15%	8,05%	13,58%	18,70%	21,99%	27,13%	29,95%
DIAS DE LLUVIAS (> A 10 MM) acumuladas por mes		6	12	19	16	12	4	4	7	3	9

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN JORGE

Consorcio San Jorge
Ing. Jorge H. Ozuna
Representante Legal

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

16 (dieciseis)

CO - FINANCIERO
Jorge

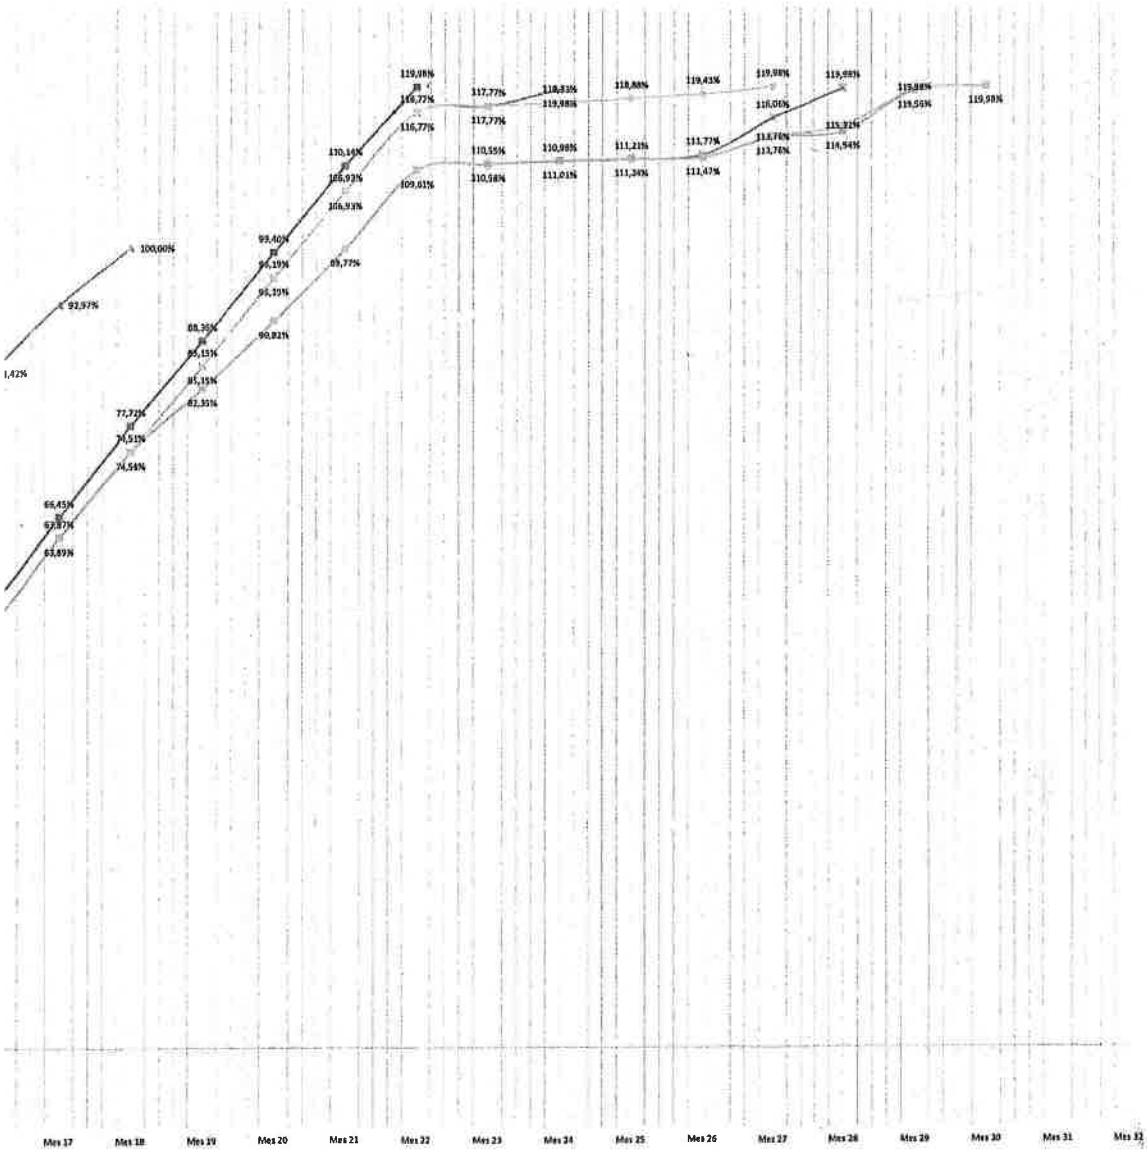

	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30
%	4,42%	5,54%	6,40%	5,21%	6,14%	11,20%	10,65%	7,81%	8,47%	8,95%	9,84%	0,97%	0,43%	0,23%	0,23%	2,29%	0,78%	5,02%	0,42%
%	29,40%	34,94%	41,34%	46,55%	52,69%	63,89%	74,54%	82,35%	90,82%	99,77%	109,61%	110,58%	111,01%	111,24%	111,47%	113,76%	114,54%	119,56%	119,98%
%	4,42%	5,54%	6,40%	5,21%	6,14%	11,20%	10,65%	7,81%	8,47%	8,95%	9,84%	0,97%	0,43%	0,23%	0,23%	2,29%	1,56%	4,65%	
%	29,40%	34,94%	41,34%	46,55%	52,69%	63,89%	74,54%	82,35%	90,82%	99,77%	109,61%	110,58%	111,01%	111,24%	111,47%	113,76%	115,32%	119,98%	
%	4,42%	5,54%	6,40%	5,20%	6,14%	11,20%	10,64%	7,81%	8,47%	8,95%	9,84%	0,97%	0,43%	0,23%	0,56%	4,29%	3,92%		
%	29,39%	34,93%	41,33%	46,53%	52,67%	63,87%	74,51%	82,32%	90,79%	99,74%	109,58%	110,55%	110,98%	111,21%	111,77%	116,06%	119,98%		
%	4,42%	5,54%	6,40%	5,20%	6,14%	11,20%	10,64%	10,64%	11,04%	10,74%	9,84%	1,00%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%			
%	29,39%	34,93%	41,33%	46,53%	52,67%	63,87%	74,51%	85,15%	96,19%	106,93%	116,77%	117,77%	118,33%	118,88%	119,43%	119,98%			
%	4,42%	5,54%	6,40%	5,20%	6,14%	11,20%	10,64%	10,64%	11,04%	10,74%	9,84%	1,00%	2,21%						
%	29,39%	34,93%	41,33%	46,53%	52,67%	63,87%	74,51%	85,15%	96,19%	106,93%	116,77%	117,77%	119,98%						
%	5,52%	5,54%	6,40%	6,08%	6,14%	11,20%	11,27%	10,64%	11,04%	10,74%	9,84%								
%	31,09%	36,63%	43,03%	49,11%	55,25%	66,45%	77,72%	88,36%	99,40%	110,14%	119,98%								
%	10,23%	9,90%	6,10%	7,93%	7,95%	8,55%	7,03%												
%	52,54%	62,44%	60,54%	76,47%	84,42%	92,97%	100,00%												
%	6,71%	7,65%	5,92%	8,53%	17,69%	13,70%	7,29%	5,97%	2,47%	3,80%	0,66%								
%	41,31%	48,96%	54,88%	63,41%	81,10%	94,80%	102,09%	108,06%	110,53%	114,33%	114,99%								
	10	16	10	5	15	4	4	8	7	5	0	1	7	8	18	14	15		

Ing. Oswaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Ing. Mieszko Tyrakowski
Supervisor de Obra
MOPC
