CONSORCIO TBI

Juan de Salazar 795 y Washington - Edificio Torre Itasa
2do piso Teléfono: (021) 232-858
Asunción - Paraguay

Asunción, 26 de Mayo de 2.021.-

CONSORCIO EDIFICACIONES
Recibido
Fecha 26/5/21.

NOTA TBI 1.597/21

Señores
CONSORCIO DE EDIFICACIONES
Ing. Alcides Bustos Núñez
Director de Fiscalización.

REF: LPI Nro. 118/2.016 "Diseño y Construcción de Oficinas de Gobierno" - Programa de Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno – I.D.: 304.820. **Asunto: Complemento Programación de Ejecución.**

De nuestra consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., en representación del CONSORCIO TBI, a fin de remitir un complemento a la Nota TBI 1.573./21por la cual enviamos las Programaciones de Ejecución de ODG y Eje Cívico hasta el mes de Diciembre del presente año(Adjunto archivo Digital).

Sin otro particular le saludo atentamente.

Ing. Rubén Darío Galeano
CONSORCIO T.B.I.
R.U.C. 80098590-7

OFICINAS DE GOBIERNO

fin 9/12/21

PROGRAMACION A DIC/2021

	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Certificado del mes N°	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**19**	**50**
Reprogramado Contractual Nro.2	2,00%	4,00%	6,00%	6,00%	3,00%						
Contractual Acumulado	81,00%	85,00%	91,00%	97,00%	100,00%						
Ejecutado	1,27%	1,77%	1,73%								
Ejecutado Acumulado	82,16%	83,93%	85,66%								
Dias de Lluvia	0,0	0,0	0,0								
Ajustado por lluvia	82,16%	83,93%	85,66%								

Reprogramado Contractual Propuesto	2,00%	4,00%	85,66%	1,97%	1,97%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,50%
Contractual Acumulado	81,00%	85,00%	85,66%	87,63%	89,60%	91,58%	93,56%	95,54%	97,52%	99,50%	100,00%

Curva reprogramada en Project	80%	82%	82%	82%	83%	86%	91%	96%	98%	99%	100%

EJE CIVICO

PROGRAMACION A DIC/2021

	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Certificado del mes N°	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Reprogramado Contractual Nro.2	6,00%	10,00%	10,00%	4,00%	3,00%						
Contractual Acumulado	73,00%	83,00%	93,00%	97,00%	100,00%						
Ejecutado	0,42%	0,83%	1,85%								
Ejecutado Acumulado	74,38%	75,21%	77,06%								

Reprogramado Contractual Propuesto	6,00%	10,00%	77,06%	3,20%	3,20%	3,20%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,50%
Contractual Acumulado	73,00%	75,21%	77,06%	80,26%	83,46%	86,66%	89,87%	93,08%	96,29%	99,50%	100,00%

Curva reprogramada en Project	39%	44%	47%	48%	52%	61%	72%	82%	93%	99%	100%

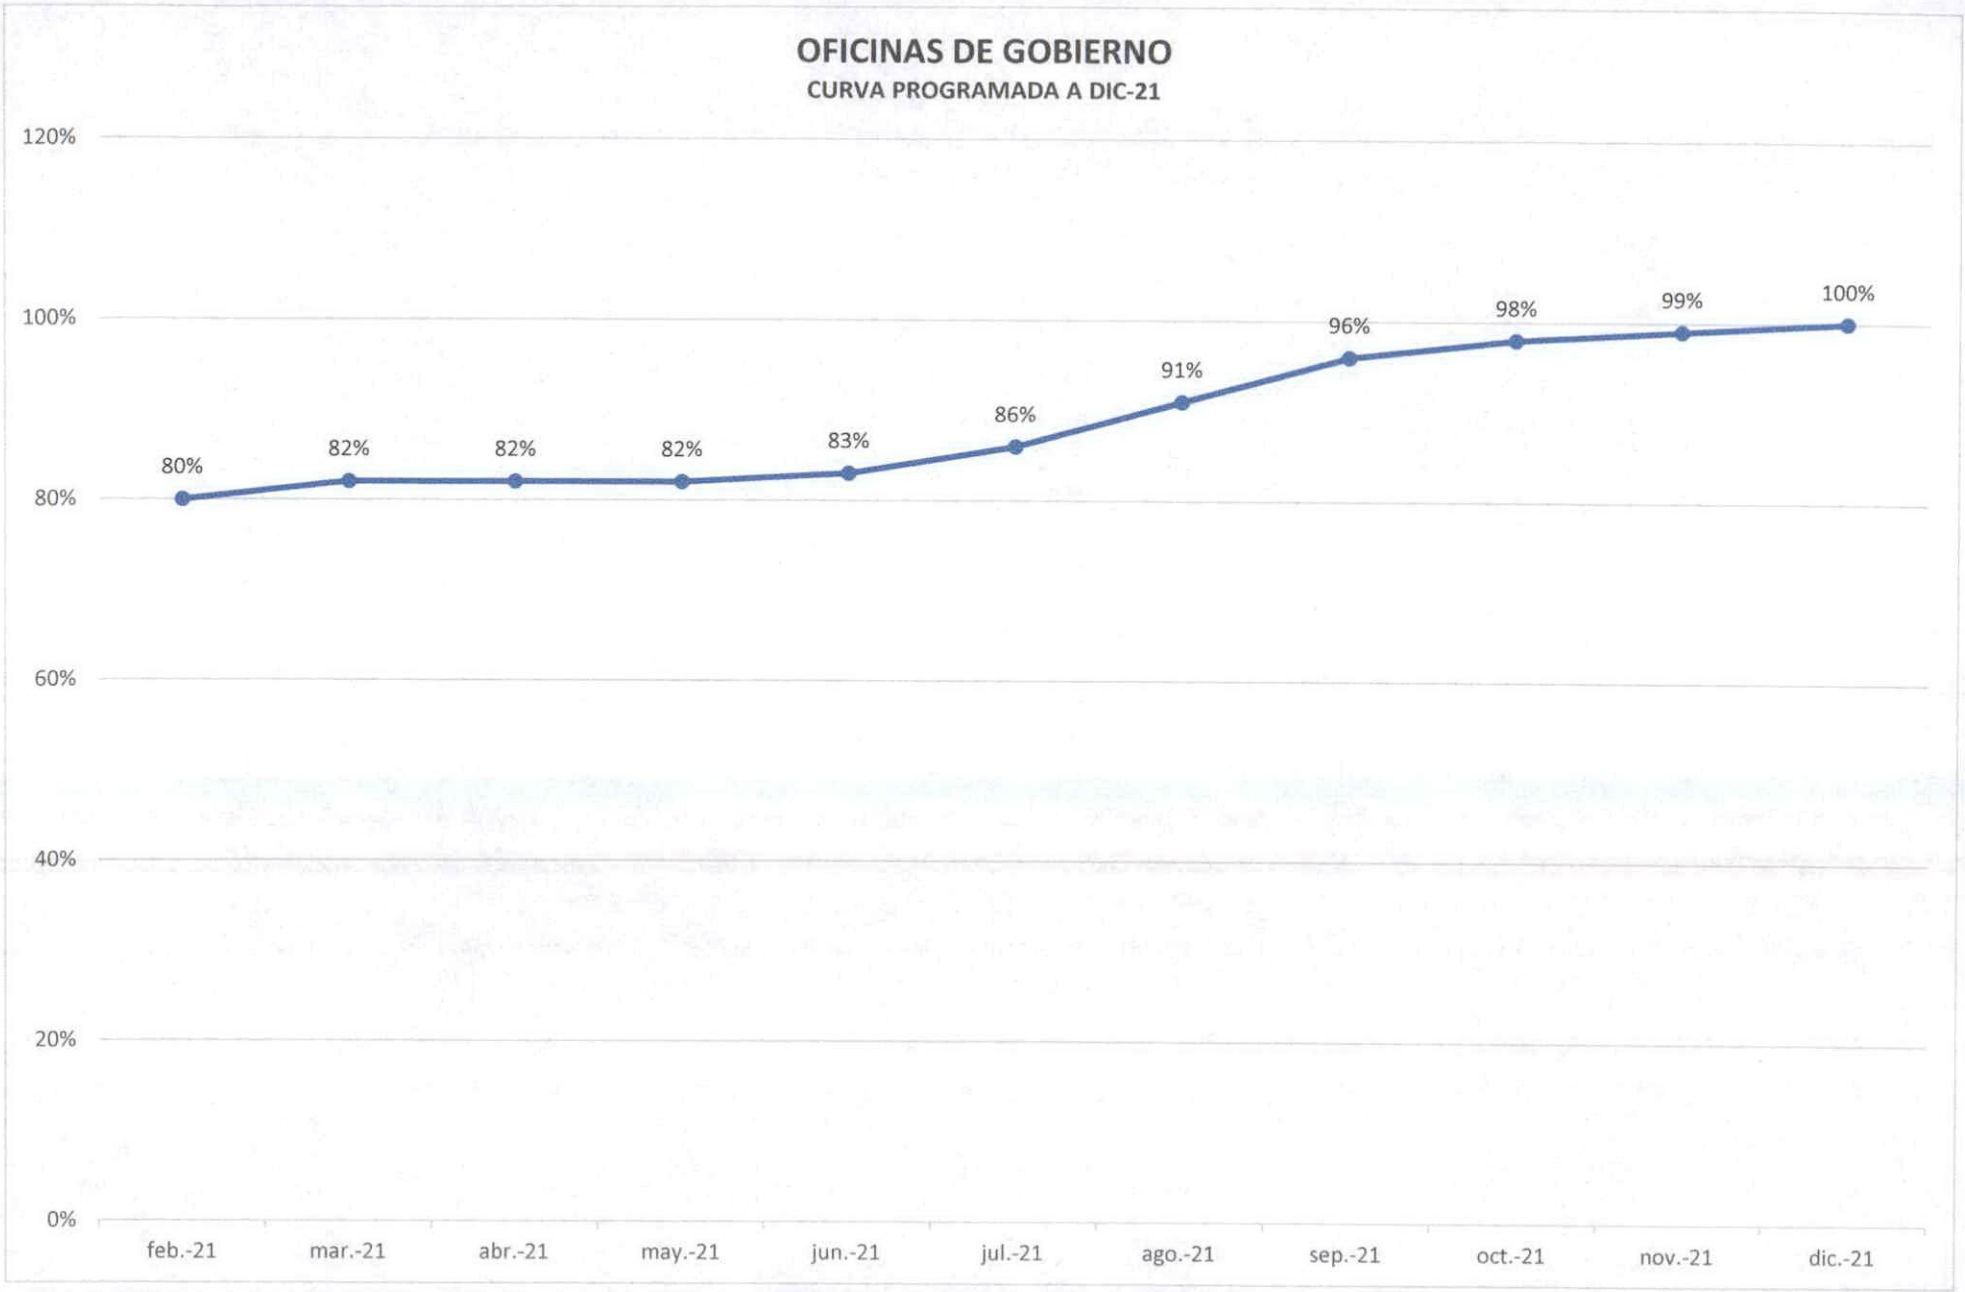
OFICINAS DE GOBIERNO
CURVA PROGRAMADA A DIC-21
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
80%
82%
82%
82%
83%
86%
91%
96%
98%
99%
100%
feb.-21
mar.-21
abr.-21
may.-21
jun.-21
jul.-21
ago.-21
sep.-21
oct.-21
nov.-21
dic.-21

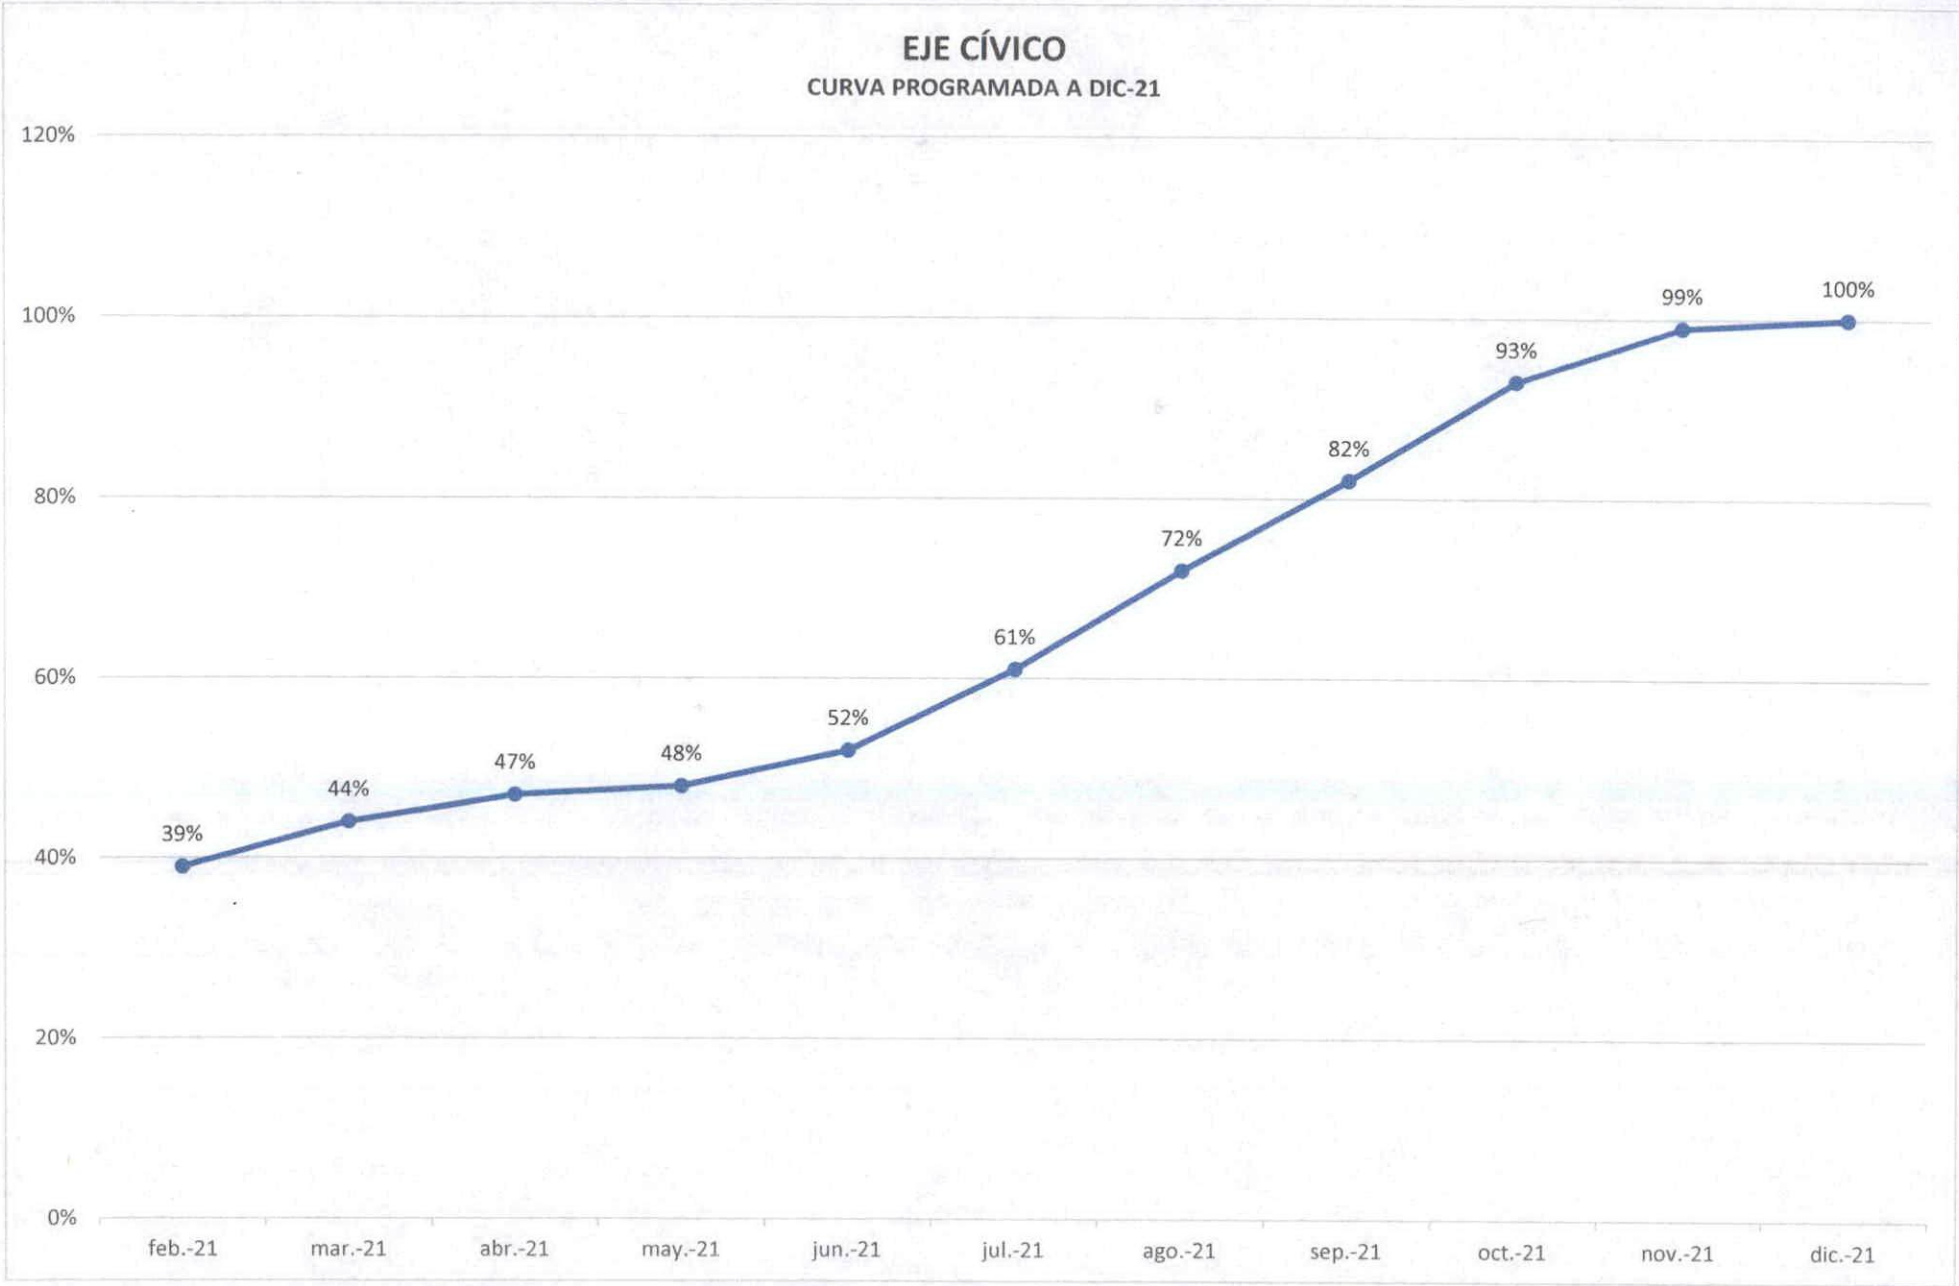
EJE CÍVICO
CURVA PROGRAMADA A DIC-21
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
39%
44%
47%
48%
52%
61%
72%
82%
93%
99%
100%
feb.-21
mar.-21
abr.-21
may.-21
jun.-21
jul.-21
ago.-21
sep.-21
oct.-21
nov.-21
dic.-21
