Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 24 de Noviembre del 2022

Señor

Director General de Administración y Finanzas

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

Lic. Carlos Morel

Presente

Ref: Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 – Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas", ID N° 415.978 – Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en Territorios con Mayor Índice de Pobreza a Nivel Nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".-

Me dirijo a usted con el objeto solicitar el Pago del Certificado de Obra N° 01 correspondiente al Lote Nro 1 - Minga Guazú del Contrato de Referencia, cuyo monto asciende a Gs. 37.080.600 Guaraníes Treinta y siete millones ochenta mil seiscientos.-

Además presentamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0001200.
- Certificados de Obra y Acta de Medición en 3 Originales.-
- Certificado de Cumpliendo Tributario
- Reportes FIP y FIS
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social

Ing. Mario R. Ibarrola A.
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 2598 Fecha: 24/11/22 Hora: 12:50
Asunto:
Recibido por: Lucia Rios

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 369
Proceso: — Fecha: 24-11-2022
Entregado por: Lidia Bareiro
Hora: 10:55 Recibido por: Delia Aiesar

Mario Raúl Ibarrola Adorno

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Adela Speratti c/ República Francesa N° 1689
Depto. Planta Baja - Tel.: (021) 222 552
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15208109
RUC: 430285 - 0
Inicio de Vigencia: 01 de Noviembre de 2021
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2022

FACTURA

No. 001-001 0001200

Fecha de Emisión: 24 | 11 | 2022 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Secretaria Nacional de Cultura

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°.: 80050610 - 3 Nota de Remisión N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Pago Certificado Nº-01, Contrato				
	Nº 01/2022, Licitacion por				
	Concurso de ofertas Nº-01/2022				
	ID Nº 415978, Lote Nro 1				
	Minga Guazu.				37.080.000
SUB TOTAL					37.080.000
TOTAL A PAGAR:	Treinta y siete millones ochenta mil seiscientos				37.080.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 3.370.964 TOTAL DE IVA: 3.370.964

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794691 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.366
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-001 - 1.151 al 1.250 - Nov. / 21.

ORIGINAL: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 **Periodo: OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022**

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						Porcentaje %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		**2.157.927**				**0**	**1.619.635**	**1.619.635**	**75,06%**
1.1		Demolición de piso	Metros cuadrados	59,2	11.443	677.426	0,00	43,20	43,20	0	494.338	494.338	72,97%
1.2		Demolición de muro de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	27,8	15.933	442.937	0,00	15,30	15,30	0	243.775	243.775	55,04%
1.3		Retiro de aberturas (4 puertas de vidrio templado, 2 ventanas de vidrio templado)	Unidad	6	84.316	505.896	0,00	6,00	6,00	0	505.896	505.896	100,00%
1.4		Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	4	45.434	181.736	0,00	4,00	4,00	0	181.736	181.736	100,00%
1.5		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	46	4.215	193.890	0,00	46,00	46,00	0	193.890	193.890	100,00%
1.6		Excavación para borde de guarda obra (Muro de nivelación 30cm)	Metros cúbicos	3,2	48.763	156.042	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2	72131601-005	CIMENTACIÓN	Unidad	1		**6.172.803**				**0**	**6.172.803**	**6.172.803**	**100,00%**
2.1		Cimentación de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	Metros cúbicos	13	474.831	6.172.803	0,00	13,00	13,00	0	6.172.803	6.172.803	100,00%
3	72101703-011	MUROS	Unidad	1		**17.248.620**				**0**	**14.692.504**	**14.692.504**	**85,18%**
3.1		Muro de nivelación 0.30 m con ladrillo común h: 0.30 m	Metros cuadrados	9,6	236.851	2.273.770	0,00	9,60	9,60	0	2.273.770	2.273.770	100,00%
3.2		Muro de nivelación 0.30 cm con ladrillo común h: 0.30 cm (Para borde de gurada obra)	Metros cuadrados	7,5	237.029	1.777.718	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.3		Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0.15m	Metros cuadrados	33	95.456	3.150.048	0,00	33,00	33,00	0	3.150.048	3.150.048	100,00%
3.4		Mampostería de elevación de ladrillos comunes a la vista 0.15m	Metros cuadrados	63	129.733	8.173.179	0,00	57,00	57,00	0	7.394.781	7.394.781	90,48%
3.5		Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marco y bajo ventanas	Metro lineal	55	34.071	1.873.905	0,00	55,00	55,00	0	1.873.905	1.873.905	100,00%
3.6		Pilastra de ANDE	Unidad	0	730.260	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4	72131601-006	AISLACIONES	Unidad	1		**1.320.096**				**0**	**1.320.096**	**1.320.096**	**100,00%**
4.1		Aislación horizontal de muros 3 caras	Metro lineal	32	41.253	1.320.096	0,00	32,00	32,00	0	1.320.096	1.320.096	100,00%
5	72102508-001	CONTRAPISO Y PISO	Unidad	1		**17.201.298**				**0**	**1.286.025**	**1.286.025**	**7,48%**
5.1		Contrapiso de cascotes para guarda obra	Metros cuadrados	7,5	32.975	247.313	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5.2		Contrapiso de cascotes apisonados	Metros cuadrados	78	32.975	2.572.050	0,00	39,00	39,00	0	1.286.025	1.286.025	50,00%
5.3		Carpeta de cemento alisado para pisos	Metros cuadrados	77,5	34.831	2.699.403	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5.4		Piso cerámico PI4 30 x 30 (Sector depósito)	Metros cuadrados	13	125.302	1.628.926	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5.5		Piso porcelanato 60cm x 60 cm (Sector Biblioteca)	Metros cuadrados	58	152.990	8.873.420	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5.6		Piso cerámico de alto tansito PI4 30 x 30 (Sector baño)	Metros cuadrados	6,5	125.302	814.463	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5.7		Piso de alisada de cemento guarda obra	Metros cuadrados	7,5	48.763	365.723	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPO / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
6	72101607-005	ZÓCALO	Unidad	1		**1.511.958**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	13,5	30.856	416.556	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.2		Zócalo de madera	Metro lineal	33	33.194	1.095.402	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
7	72131601-008	REVOQUE Y REVESTIMIENTOS	Unidad	1		**9.469.602**				**0**	**4.926.527**	**4.926.527**	**52,02%**
7.1		Revoque interior (Sector biblioteca y depósito)	Metros cuadrados	97	42.076	4.081.372	0,00	48,50	48,50	0	2.040.686	2.040.686	50,00%
7.2		Revoque interior con hidrófugo (Baño)	Metros cuadrados	70	45.807	3.206.490	0,00	63,00	63,00	0	2.885.841	2.885.841	90,00%
7.3		Revestimiento azulejos 15 x 15 color blanco h=2.10 m	Metros cuadrados	20	109.087	2.181.740	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8	72101510-001	INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad	1		**14.800.505**				**0**	**646.479**	**646.479**	**4,37%**
8.1		Instalación hidráulica: Intalación de agua corriente general	Unidad Medida Global	1	1.128.583	1.128.583	0,00	0,20	0,20	0	225.717	225.717	20,00%
8.2		Instalación hidráulica: Intalación de agua corriente de Baño	Unidad Medida Global	1	1.051.906	1.051.906	0,00	0,20	0,20	0	210.381	210.381	20,00%
8.3		Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna baja con tapa de plastico.	Unidad	1	1.887.978	1.887.978	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.4		Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio adosado a la pared para discapacitado.	Unidad	1	614.400	614.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.5		Artefactos, griferías y accesorios: - Espejo en baño 0,60 m x 0, 80 m.	Unidad	1	329.743	329.743	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.6		Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de jabon liquido.	Unidad	1	140.828	140.828	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.7		Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de rollo de papel.	Unidad	1	140.828	140.828	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.8		Artefactos, griferías y accesorios: - Percha simple de acero inoxidable.	Unidad	2	64.195	128.390	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.9		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento fijo.	Unidad	1	704.140	704.140	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.10		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento rebatible.	Unidad	1	1.052.728	1.052.728	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.11		Artefactos, griferías y accesorios: - Griferia para lavatorio pico alto y llave de paso.	Unidad	2	302.355	604.710	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.12		Desagüe cloacal: Cámara Séptica de 1.20m x 1.00m x 0.80m	Unidad	1	1.582.768	1.582.768	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.13		Desagüe cloacal: Pozo absorvente 1.20m x 2,50m	Unidad	1	2.389.940	2.389.940	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.14		Desagüe cloacal de Baño	Unidad Medida Global	1	1.051.906	1.051.906	0,00	0,20	0,20	0	210.381	210.381	20,00%
8.15		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 100	Metro lineal	12	103.564	1.242.768	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.16		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 40	Metro lineal	4	40.727	162.908	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.17		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 75	Metro lineal	3	59.748	179.244	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
8.18		Registro cloacal 50cm x 50cm x 50cm	Unidad	1	406.737	406.737	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
9	72101510-005	DESAGÜE PLUVIAL	Unidad	1		**13.643.814**				**0**	**1.672.958**	**1.672.958**	**12,26%**
9.1		Canaleta de alero de chapa y bajada. Desarrollo 40 cm Chapa N° 24 (Sector Biblioteca)	Metro lineal	46	171.501	7.889.046	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
9.2		Canaleta embutida y bajada, Chapa N°24 desarrollo 0,80 m (Sector baños y depósito)	Metro lineal	10	238.994	2.389.940	0,00	7,00	7,00	0	1.672.958	1.672.958	70,00%
9.3		Excavación para desagüe pluvial (colocación de caño de 100 mm)	Metro lineal	34	71.935	2.445.790	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
9.4		Registro pluvial de 60 cm x 60 cm x 50 cm	Unidad	2	459.519	919.038	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
10	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1		**15.317.759**				**0**	**1.880.219**	**1.880.219**	**12,27%**
10.1		Puesto de medición trifásica	Unidad Medida Global	1	2.096.867	2.096.867	0,00	0,20	0,20	0	419.373	419.373	20,00%
10.2		Entrada trifásica (Subterránea desde la pilastra al tablero)	Metro lineal	12	50.065	600.780	0,00	0,20	0,20	0	10.013	10.013	1,67%
10.3		Registro eléctrico de 30cm x 30cm x 70cm	Unidad Medida Global	1	271.459	271.459	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
10.4		Tablero Principal trifásico	Unidad	1	1.262.288	1.262.288	0,00	0,20	0,20	0	252.458	252.458	20,00%
10.5		Boca c/ 1 punto y toma - (por boca)	Unidad	4	168.305	673.220	0,00	1,00	1,00	0	168.305	168.305	25,00%
10.6		Boca c/ 2 punto y toma - (por boca)	Unidad	6	178.425	1.070.550	0,00	2,00	2,00	0	356.850	356.850	33,33%
10.7		Artefactos LED 18 W	Unidad	13	210.381	2.734.953	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
10.8		Artefacto Plafon de adosar 12 W	Unidad	18	196.355	3.534.390	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
10.9		Toma corriente - (por boca)	Unidad	14	168.305	2.356.270	0,00	4,00	4,00	0	673.220	673.220	28,57%
10.10		Ductos electricos para aires split hasta el tablero (sin cabledo) para prever futura instalación	Unidad	3	238.994	716.982	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
11	72102601-001	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	1		**3.811.977**				**0**	**3.811.977**	**3.811.977**	**100,00%**
11.1		Puerta placa de madera - 1.00 x 2.10 m (Baños y depósito). Incluye marco metalico de 0.15m, herrajes y cerraduras	Unidad	3	1.270.659	3.811.977	0,00	3,00	3,00	0	3.811.977	3.811.977	100,00%
12	72102602-004	ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1		**32.164.594**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
12.1		Puerta de vidrio templado 10 mm corrediza 1.20 x 2.20 m (Sector Biblioteca)	Unidad	1	2.944.407	2.944.407	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.2		Adaptacion y Recolocación de Puertas de vidrio templado desmontadas (incluye provision y colocación de paños fijos de vidrio templado 10 mm en laterales y freno hidraulico)	Unidad	2	3.686.439	7.372.878	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.3		Ventana tipo balancín con vidrio templado de 8 mm 1.80 x 0.40 m (Depósito)	Unidad	1	863.034	863.034	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.4		Ventana pivotante 0.60 x 0.40m con vidrio templado traslúcido (Baño)	Unidad	1	610.763	610.763	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.5		Ventana fija 1.00 x 0.50m vidrio templado (Baño)	Unidad	1	730.260	730.260	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.6		Ventana fija 1.35 x 0.80m vidrio blindex (Espacio de lectura)	Unidad	0	1.104.153	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.7		Vidrio templado fijos de 10 mm (Sector biblioteca)	Metros cuadrados	9	955.977	8.603.793	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
12.8		Pergola intermedia (estructura metálica con policarbonato)	Metros cuadrados	20,28	544.352	11.039.459	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
13	72101601-001	TECHO	Unidad	1		**22.091.678**				**0**	**7.123.627**	**7.123.627**	**32,25%**
13.1		Techo de chapa ondulada zincalum N° 27 con estructura metálica	Metros cuadrados	20,5	347.494	7.123.627	0,00	20,50	20,50	0	7.123.627	7.123.627	100,00%
13.2		Cielorraso de placa de yeso tipo durlock con junta tomada	Metros cuadrados	79	189.469	14.968.051	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14	72131601-012	PINTURAS	Unidad	1		**20.599.202**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
14.1		Enduido Interior y exterior	Metros cuadrados	214	19.916	4.262.024	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.2		Pintura de muro interior	Metros cuadrados	149	33.194	4.945.906	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.3		Pintura de muro exterior	Metros cuadrados	65	37.176	2.416.440	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.4		Tratamiento para ladrillo visto	Metros cuadrados	62	23.900	1.481.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.5		Carpintería metálica	Metros cuadrados	18	38.505	693.090	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.6		Carpintería de madera	Metros cuadrados	12,6	38.505	485.163	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.7		Canaleta de borde y bajada con sintético color grafito claro	Metro lineal	62	26.555	1.646.410	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.8		Pintura de zócalos de madera	Metro lineal	33	15.933	525.789	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
14.9		Pintura de cielorraso latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	78	53.110	4.142.580	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
15	72131601-013	LIMPIEZA FINAL CON RETIRO DE MATERIAL	Unidad Medida Global	1	2.994.750	**2.994.750**	0,00	0,40	0,40	**0**	**1.197.900**	**1.197.900**	**40,00%**
				Precio Total		**180.506.583**			**Total Certificado**		**46.350.750**	**46.350.750**	**25,68%**
				Anticipo		**37.130.691**			**Descuento Anticipo 20%**		**9.270.150**	**9.270.150**	**24,97%**
									Saldo a Cobrar		**37.080.600**	**37.080.600**	

Son Guaranies: Treinta y siete millones ochenta mil seiscientos.-

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CURVA DE INVERSION - Periodo: OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022

MONTO CONTRATO + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 Gs:	180.506.583

		Inicio	30 Dias 11/10/22 al 10/11/22	60 Dias 11/11/22 al 10/12/22	90 Dias 11/12/22 al 09/01/23	120 Dias 10/01/23 al 08/02/23
PROYECTADO	Porcentaje %	0,00	14,88%	46,33%	90,07%	100,00%
	Valores Gs.	0	26.859.380	83.628.700	162.582.279	180.506.583
EJECUTADO	Porcentaje %	0,00	25,68%			
	Valores Gs.	0	46.350.750			

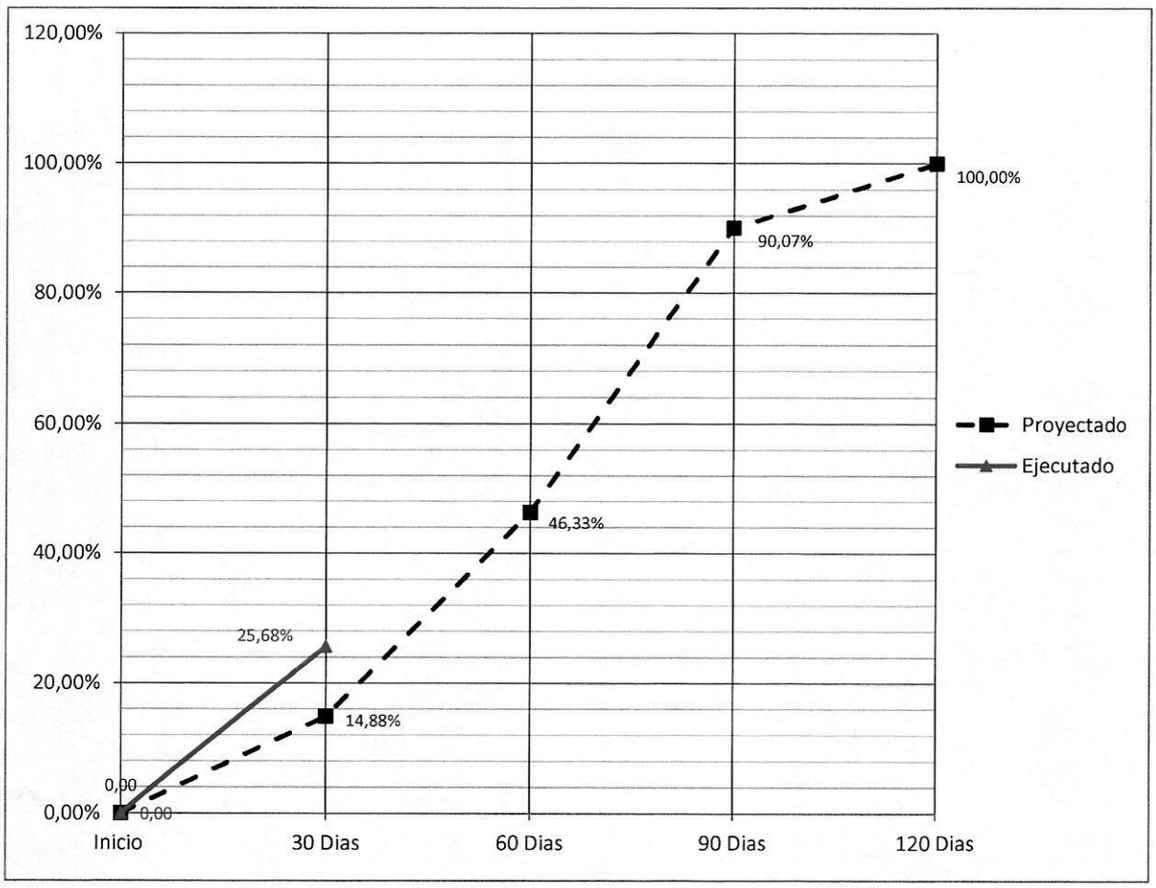

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRA
Secretaria Nacional de Cultura

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

ACTA DE MEDICION Nº 01 **Periodo: OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022**

LOTE NRO: 1 - MINGA GUAZU

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01		CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1				
1.1		Demolición de piso	Metros cuadrados	59,2	0,00	43,20	43,20	72,97%
1.2		Demolición de muro de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	27,8	0,00	15,30	15,30	55,04%
1.3		Retiro de aberturas (4 puertas de vidrio templado, 2 ventanas de vidrio templado)	Unidad	6	0,00	6,00	6,00	100,00%
1.4		Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	4	0,00	4,00	4,00	100,00%
1.5		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	46	0,00	46,00	46,00	100,00%
1.6		Excavación para borde de guarda obra (Muro de nivelación 30cm)	Metros cúbicos	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	72131601-005	CIMENTACIÓN	Unidad	1				
2.1		Cimentación de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	Metros cúbicos	13	0,00	13,00	13,00	100,00%
3	72101703-011	MUROS	Unidad	1				
3.1		Muro de nivelación 0.30 m con ladrillo común h: 0.30 m	Metros cuadrados	9,6	0,00	9,60	9,60	100,00%
3.2		Muro de nivelación 0.30 cm con ladrillo común h: 0.30 cm (Para borde de gurada obra)	Metros cuadrados	7,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0.15m	Metros cuadrados	33	0,00	33,00	33,00	100,00%
3.4		Mampostería de elevación de ladrillos comunes a la vista 0.15m	Metros cuadrados	63	0,00	57,00	57,00	90,48%
3.5		Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marco y bajo ventanas	Metro lineal	55	0,00	55,00	55,00	100,00%
3.6		Pilastra de ANDE	Unidad	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72131601-006	AISLACIONES	Unidad	1				
4.1		Aislación horizontal de muros 3 caras	Metro lineal	32	0,00	32,00	32,00	100,00%
5	72102508-001	CONTRAPISO Y PISO	Unidad	1				
5.1		Contrapiso de cascotes para guarda obra	Metros cuadrados	7,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2		Contrapiso de cascotes apisonados	Metros cuadrados	78	0,00	39,00	39,00	50,00%
5.3		Carpeta de cemento alisado para pisos	Metros cuadrados	77,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4		Piso cerámico PI4 30 x 30 (Sector depósito)	Metros cuadrados	13	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5		Piso porcelanato 60cm x 60 cm (Sector Biblioteca)	Metros cuadrados	58	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.6		Piso cerámico de alto tansito PI4 30 x 30 (Sector baño)	Metros cuadrados	6,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7		Piso de alisada de cemento guarda obra	Metros cuadrados	7,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	72101607-005	ZÓCALO	Unidad	1				
6.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	13,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2		Zócalo de madera	Metro lineal	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	72131601-008	REVOQUE Y REVESTIMIENTOS	Unidad	1				
7.1		Revoque interior (Sector biblioteca y depósito)	Metros cuadrados	97	0,00	48,50	48,50	50,00%
7.2		Revoque interior con hidrófugo (Baño)	Metros cuadrados	70	0,00	63,00	63,00	90,00%
7.3		Revestimiento azulejos 15 x 15 color blanco h=2.10 m	Metros cuadrados	20	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	72101510-001	INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad	1				
8.1		Instalación hidráulica: Intalación de agua corriente general	Unidad Medida Global	1	0,00	0,20	0,20	20,00%
8.2		Instalación hidráulica: Intalación de agua corriente de Baño	Unidad Medida Global	1	0,00	0,20	0,20	20,00%
8.3		Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna baja con tapa de plastico.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.4		Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio adosado a la pared para discapacitado.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.5		Artefactos, griferías y accesorios: - Espejo en baño 0,60 m x 0, 80 m.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.6		Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de jabon liquido.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.7		Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de rollo de papel.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.8		Artefactos, griferías y accesorios: - Percha simple de acero inoxidable.	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.9		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento fijo.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.10		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento rebatible.	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Carlos C. Gonzáles Zelada
Arquitecto

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
8.11		Artefactos, griferías y accesorios: - Griferia para lavatorio pico alto y llave de paso.	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.12		Desagüe cloacal: Cámara Séptica de 1.20m x 1.00m x 0.80m	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.13		Desagüe cloacal: Pozo absorvente 1.20m x 2,50m	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.14		Desagüe cloacal de Baño	Unidad Medida Global	1	0,00	0,20	0,20	20,00%
8.15		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 100	Metro lineal	12	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.16		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 40	Metro lineal	4	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.17		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 75	Metro lineal	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.18		Registro cloacal 50cm x 50cm x 50cm	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	72101510-005	DESAGÜE PLUVIAL	Unidad	1				
9.1		Canaleta de alero de chapa y bajada. Desarrollo 40 cm Chapa N° 24 (Sector Biblioteca)	Metro lineal	46	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2		Canaleta embutida y bajada, Chapa N°24 desarrollo 0,80 m (Sector baños y depósito)	Metro lineal	10	0,00	7,00	7,00	70,00%
9.3		Excavación para desagüe pluvial (colocación de caño de 100 mm)	Metro lineal	34	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4		Registro pluvial de 60 cm x 60 cm x 50 cm	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1				0,00%
10.1		Puesto de medición trifásica	Unidad Medida Global	1	0,00	0,20	0,20	20,00%
10.2		Entrada trifásica (Subterránea desde la pilastra al tablero)	Metro lineal	12	0,00	0,20	0,20	1,67%
10.3		Registro eléctrico de 30cm x 30cm x 70cm	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4		Tablero Principal trifásico	Unidad	1	0,00	0,20	0,20	20,00%
10.5		Boca c/ 1 punto y toma - (por boca)	Unidad	4	0,00	1,00	1,00	25,00%
10.6		Boca c/ 2 punto y toma - (por boca)	Unidad	6	0,00	2,00	2,00	33,33%
10.7		Artefactos LED 18 W	Unidad	13	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8		Artefacto Plafon de adosar 12 W	Unidad	18	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9		Toma corriente - (por boca)	Unidad	14	0,00	4,00	4,00	28,57%
10.10		Ductos electricos para aires split hasta el tablero (sin cabledo) para prever futura instalación	Unidad	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	72102601-001	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	1				0,00%
11.1		Puerta placa de madera - 1.00 x 2.10 m (Baños y depósito). Incluye marco metalico de 0.15m, herrajes y cerraduras	Unidad	3	0,00	3,00	3,00	100,00%
12	72102602-004	ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1				
12.1		Puerta de vidrio templado 10 mm corrediza 1.20 x 2.20 m (Sector Biblioteca)	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2		Adaptacion y Recolocación de Puertas de vidrio templado desmontadas (incluye provision y colocación de paños fijos de vidrio templado 10 mm en laterales y freno hidraulico)	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3		Ventana tipo balancín con vidrio templado de 8 mm 1.80 x 0.40 m (Depósito)	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4		Ventana pivotante 0.60 x 0.40m con vidrio templado traslúcido (Baño)	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5		Ventana fija 1.00 x 0.50m vidrio templado (Baño)	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6		Ventana fija 1.35 x 0.80m vidrio blindex (Espacio de lectura)	Unidad	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7		Vidrio templado fijos de 10 mm (Sector biblioteca)	Metros cuadrados	9	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8		Pergola intermedia (estructura metálica con policarbonato)	Metros cuadrados	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	72101601-001	TECHO	Unidad	1				
13.1		Techo de chapa ondulada zincalum N° 27 con estructura metálica	Metros cuadrados	20,5	0,00	20,50	20,50	100,00%
13.2		Cielorraso de placa de yeso tipo durlock con junta tomada	Metros cuadrados	79	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	72131601-012	PINTURAS	Unidad	1				
14.1		Enduido Interior y exterior	Metros cuadrados	214	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2		Pintura de muro interior	Metros cuadrados	149	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3		Pintura de muro exterior	Metros cuadrados	65	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4		Tratamiento para ladrillo visto	Metros cuadrados	62	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.5		Carpintería metálica	Metros cuadrados	18	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.6		Carpintería de madera	Metros cuadrados	12,6	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.7		Canaleta de borde y bajada con sintético color grafito claro	Metro lineal	62	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.8		Pintura de zócalos de madera	Metro lineal	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.9		Pintura de cielorraso latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	78	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	72131601-013	LIMPIEZA FINAL CON RETIRO DE MATERIAL	Unidad Medida Global	1	0,00	0,40	0,40	40,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

RESIDENTE DE OBRAS
Carlos C. González Zelada
Arquitecto

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Lote 4179583500 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270145347376

FECHA 22/11/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	430285	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 22/12/2022 NÚMERO DE CONTROL : 86BC0803

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271430285 86BC0803

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Gustavo Bernardo Lopez Gonzalez [2300073-430285] - Proveedor

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 415978

Llamado: Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	2300073	Activo	
NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	937306	Activo	
Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	4492994	Activo	
SIMONA	LOPEZ SILVA	1857999	Activo	

Nuevo Formulario de Identificación del Personal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

RUC

430285-0

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 415978 / Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

528.571.154

Año: 2022 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	Cumplio	3200000	Contratista	Activo
2	SIMONA	LOPEZ SILVA	Cumplio	1765602	Contratista	Activo
3	Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
4	NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	Cumplio	117706	Contratista	Activo

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Usuario Impresión: 2300073-430285

Fecha Impresión: 23/11/2022

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 430285

NRO. CERTIFICADO: 362742

FECHA EMISION: 16-11-2022

VENCIMIENTO: 20-12-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 430285

Nro. Certificado: 362742

Razon Social: IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-1997

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0004-40-0356 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
