TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC

CERTIFICADO DE OBRAS
NOVIEMBRE 2022

EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
CONTRATO N° 21/2021
LPN N° 05/2021 - ID 388.700

ESC. BÁS. Nº 478 ROBERTO L. PETIT - Asunción

ITEM DE CONTRATO	ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	Precio total	Avance físico			Monto Certificado		
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
	1	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Global	1								
	1.1	**Preparación de la Obra**										
	1.1.1	Vallado perimetral protección de obras de... (madera/chapa)	m2	51,00	170.000	8.670.000	-	24,00	24,00	-	4.080.000	4.080.000
	1.2	**Remociones y otros**					-	-	-	-	-	-
	1.2.18	Remoción de contrapiso	m2	40,00	15.000	600.000	-	20,00	20,00	-	300.000	300.000
	1.2.19	Remoción de pisos	m2	40,00	30.000	1.200.000	-	20,00	20,00	-	600.000	600.000
	1.13	**Contrapiso**					-	-	-	-	-	-
	1.13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	40,00	62.600	2.504.000	-	20,00	20,00	-	1.252.000	1.252.000
	1.14	**PISOS**					-	-	-	-	-	-
	1.14.3	Piso cerámico esmaltado antideslizante PI 5	m2	40,00	190.000	7.600.000	-	-	-	-	-	-
	1.18	**Pinturas**					-	-	-	-	-	-
	1.18.1	De paredes revocadas al látex	m2	300,00	57.000	17.100.000	-	-	-	-	-	-
	1.38	**Instalación sanitaria: Desagüe cloacal - Provisión y colocación**					-	-	-	-	-	-
	1.38.1	Caño PVC de 100 mm blanco	ml	70,00	70.000	4.900.000	-	-	-	-	-	-
	1.38.2	Caño PVC de 50 mm blanco	ml	20,00	35.000	700.000	-	10,00	10,00	-	350.000	350.000
	1.38.4	Codo PVC de 100 mm x 90º	Unidad	10,00	10.600	106.000	-	5,00	5,00	-	53.000	53.000
	1.38.5	Codo PVC de 50 mm x 90º	Unidad	6,00	4.150	24.900	-	3,00	3,00	-	12.450	12.450
	1.38.13	Rejilla de piso sifonada de 15 x 15 cm	Unidad	4,00	103.150	412.600	-	-	-	-	-	-
	1.38.16	Tanque séptico	Unidad	2,00	450.000	900.000	-	-	-	-	-	-
	1.38.17	Pozo absorbente	Unidad	2,00	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	1.38.21	Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	7,00	275.000	1.925.000	-	-	-	-	-	-
	1.42	**Limpieza**					-	-	-	-	-	-
	1.42.1	Limpieza final	m2	110,00	12.000	1.320.000	-	-	-	-	-	-
	1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	m3	20,00	40.000	800.000	-	-	-	-	-	-
					Precio Total	**49.762.500**				-	6.647.450	6.647.450

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Ju... R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0336) 400 - 245

SENDERO S.A.
Carmelo Desv...
Representante Legal

ESC. BÁS. Nº 478 ROBERTO L. PETIT (ASUNCIÓN)

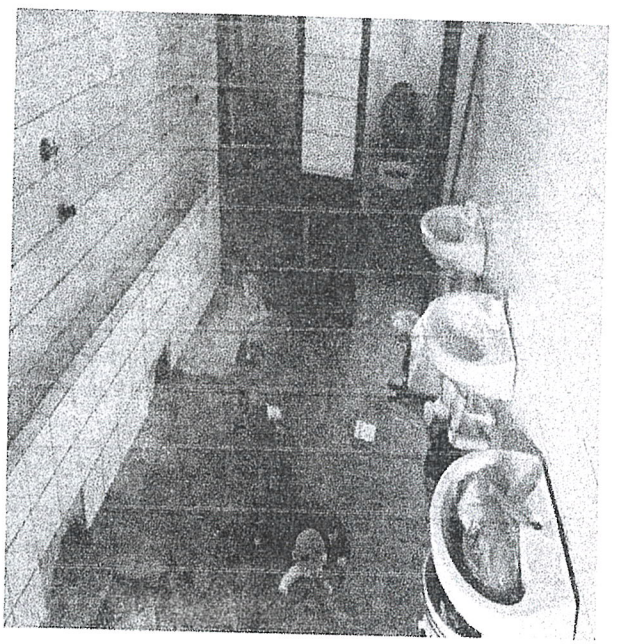

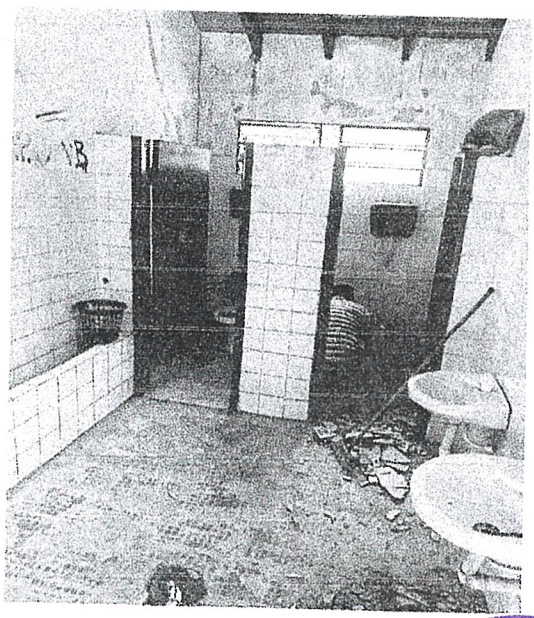

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIE. CIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
[illegible] - MEC
[illegible] 430 - 245

SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Cora - Tel.: 526 070
Fdo de la Mora - Paraguay

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO
REPARACION DE SS.HH.+ POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA
ESCUELA BÁSICA Nº 478 ROBERTO L. PETIT

Ítem	Descripción del Bien	4/10/2022					
		octubre		noviembre		diciembre	
1.1	Preparación de la Obra						
1.2	Remociones y otros						
1.14	PISOS						
1.18	Pinturas						
1.38	Instalación sanitaria: Desagüe cloacal - Provisión y colocación						
1.42	Limpieza						
Certificación mensual (%)		20		30		50	
Certificación acumulada (%)		20		50		100	

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * Dirección de Infraestructura *
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Arq. Julio A. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0336) 400 - 245
