GERENCIA TÉCNICA.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

ORDEN DE TRABAJO.

N°: 06/2022.

CONTRATO N° 63/2021: "Servicio de Cambio de Tubería de Agua Potable, Extensiones Para Anillados de Red y Sectorización de Red, Ramales Domiciliarios y Tareas Afines en Asunción y Gran Asunción con Provisión de Tuberías y Accesorios" – L.P.N. N°: 10/2021, ID N°: 390962.

FECHA: 21/03/2022.

Por la presente sírvase a proceder al cambio de **Cambio de Cañerías de Agua Potable en el marco del Contrato de Referencia.**

Tramo 1: Saravi desde De Las Palmeras hasta Hazzeler.

Según indicciones dadas en el plano adjunto a esta orden de trabajo Lámina: 16.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromec.
Gerencia Técnica
ESSAP S.A.

C.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Recibí
21/03/22.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
ESSAP S.A.
Ing. Carlos Ramírez.-
Gerente Técnico.-
ESSAP SA.

DETALLES - TIPO 7



REF.	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Cruz b-b 100 x 50mm "H"F	1
2	Val. Compuerta bolsa - bolsa de 2"	2
3	Unión de transición de 60 a 63mm	2
4	Tubería PVC-PBA 60mm - Proyecto	-
5	Tubería PVC-O 110mm - Proyecto	-
6	Tubería PEAD 63mm - Existente	-
	Caja de válvula de hierro fundido	2

DETALLES - TIPO 15



REF.	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Tee b-b 100 x 50mm "H"F	1
2	Val. Compuerta bolsa - bolsa de 2"	1
3	Unión de transición de 60 a 63mm	1
4	Tubería PVC-PBA 60mm - Proyecto	-
5	Tubería PVC-O 110mm - Proyecto	-
6	Bloque de anclaje tipo 2	1
7	Tubería PEAD 63mm - Existente	-
	Caja de válvula de hierro fundido	1

DETALLES - TIPO 49



REF.	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Tee b-b 100 x 100mm "H"F	1
2	Val. Compuerta bolsa - bolsa de 4"	1
3	Unión universal de 100mm "H"F	1
4	Tubería PVC-O 110mm - Proyecto	-
5	Bloque de anclaje tipo 2	1
6	Tubería PEAD 63mm - Existente	-
	Caja de válvula de hierro fundido	1

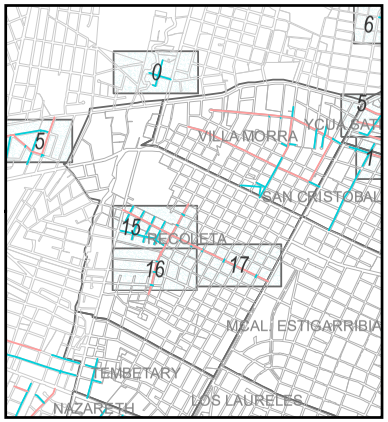

REFERENCIAS

Tuberías Existente

- 50 mm.
- 100 mm.
- 150 mm.
- 200 mm.
- 250 mm.
- 300 mm.
- 350 mm.
- 400 mm.
- 500 mm.
- 600 mm.
- 700 mm.
- 750 mm.
- 800 mm.
- 1000 mm.
- 1200 mm.
- conex domic

Tuberías Proyecto

- 50 mm.
- 100 mm.
- 150 mm.

Válvulas Proyecto

- Válvulas compuerta

Válvulas Existente

- Válvulas de diferente tipo

Interconexiónes

- 1 Detalles - Tipo

Sistema de Coordenadas: UTM Zona 21 Hemisferio Sur
Proyección: Transversal de Mercator
Datum: WGS84
Falso este: 500.000,0000
Falso norte: 10.000.000,0000
Meridiano central: -57,0000
Factor de escala: 0,9996
Latitud de origen: 0,0000
Unidad: Metro

N S E W

30 15 0 30 60 90 Metros

Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorizacion de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

GERENCIA TECNICA

Cambio de tuberías en 2 y 4" en calzada.
En barrio Recoleta.

ESCALA 1:2.750	FECHA 11/2021	LAMINA 16
