INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 09/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

Trabajos ejecutados son:

Trabajos ejecutados son:

LOTE 4 – CAPITAN BADO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PUBLICA CAPITAN GENES RCA. DE CHILE					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad Total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	3623	1811	50%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	3623	1811	50%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	725	162	22,5%
5	Movimiento de suelo	M3	272	136	50%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	145	37,5	26%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	3623	212,5	6%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	3623	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	672	105	15,5%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	181	0	0%
11	Limpieza final	M2	3623	0	0%
				TOTAL	13.5%

LOTE 8 – KARAPA'I – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE 20 DE JULIO					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad Total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2400	1200	50%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2400	1200	50%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	480	167,5	35%
5	Movimiento de suelo	M3	180	90	50%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	96	28	29%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2400	237,5	10%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2400	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	600	180	30%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	120	30	25%
11	Limpieza final	M2	2400	0	0%
				TOTAL	20%

Es mi informe,

Fecha: 10/08/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 09/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

Trabajos ejecutados son:

LOTE 4 – CAPITAN BADO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PUBLICA CAPITAN GENES RCA. DE CHILE				
N°	**Descripción**	**Cantidad Total**	**Avance M2**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	3623	3.623	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	3623	3.623	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	725	325	45%
5	Movimiento de suelo	272	272	100%
6	Relleno y compactación de terreno	145	75	52%
7	Pavimento tipo Empedrado	3623	425	12%
8	Compactación y apisonado mecánico	3623	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	672	210	31%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	181	0	0%
11	Limpieza final	3623	0	0%
			TOTAL	**27%**

LOTE 8 – KARAPA'I – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE 20 DE JULIO				
N°	**Descripción**	**Cantidad Total**	**Avance M2**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	2400	2400	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	2400	2400	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	480	335	70%
5	Movimiento de suelo	180	180	100%
6	Relleno y compactación de terreno	96	56	58%
7	Pavimento tipo Empedrado	2400	475	20%
8	Compactación y apisonado mecánico	2400	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	600	360	60%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	120	60	50%
11	Limpieza final	2400	0	0%
			TOTAL	**40%**

Es mi informe,

Fecha: 27/08/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 8 – KARAPA'I – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE 20 DE JULIO

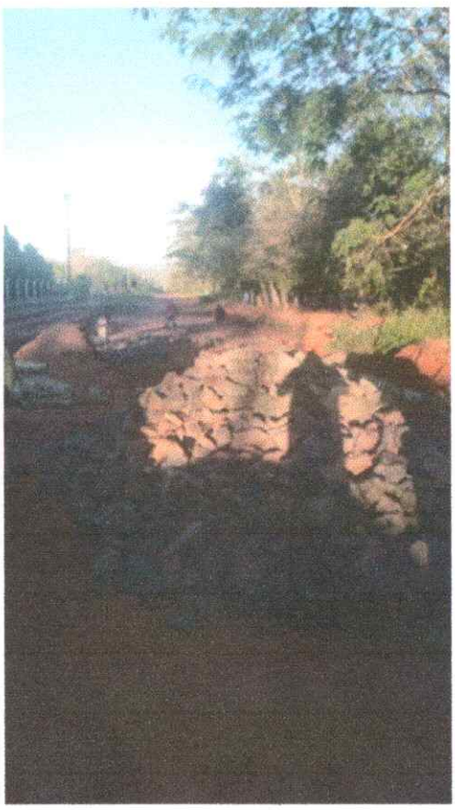

LOTE 4 – CAPITAN BADO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PUBLICA CAPITAN GENES RCA. DE CHILE

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 08/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: HR INGENIERIA

Trabajos ejecutados son:

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	244	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	244	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	49	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	18	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	10	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	244	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	244	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	64	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	12	0	0%
11	Limpieza final	M2	244	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA RIO YPANE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	1060	424	40%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1060	424	40%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	212	85	40%
5	Movimiento de suelo	M3	80	32	40%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	42	17	40%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1060	424	40%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	1060	424	40%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	246	98	40%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	53	21	40%
11	Limpieza final	M2	1060	0	0%
				TOTAL	42%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	4007	757	19%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	4007	757	19%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	801	151	19%
5	Movimiento de suelo	M3	301	57	19%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	160	30	19%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	4007	757	19%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	4007	757	19%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	934	177	19%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	200	38	19%
11	Limpieza final	M2	4007	0	0%
				TOTAL	25%

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	3339	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	3339	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	668	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	250	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	134	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	3339	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	3339	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	825	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	167	0	0%
11	Limpieza final	M2	3339	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	5697	3361	59%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5697	2353	41%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1139	470	41%
5	Movimiento de suelo	M3	427	176	41%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	228	94	41%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5697	2353	41%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	5697	2353	41%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1362	563	41%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	285	118	41%
11	Limpieza final	M2	5697	0	0%
				TOTAL	44%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA DR. RONALD ROLON MORINIGO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2521	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2521	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	504	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	189	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	101	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2521	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2521	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	614	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126	0	0%
11	Limpieza final	M2	2521	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	1315	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1315	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	263	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	99	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	53	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1315	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	1315	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	364	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	66	0	0%
11	Limpieza final	M2	1315	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2735	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2735	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	547	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	205	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	109	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2735	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2735	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1004	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	137	0	0%
11	Limpieza final	M2	2735	0	0%
				TOTAL	0%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2525	1540	61%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2525	1540	61%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	505	308	61%
5	Movimiento de suelo	M3	189	115	61%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	101	62	61%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2525	1540	61%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2525	1540	61%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	615	375	61%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126	77	61%
11	Limpieza final	M2	2525	0	0%
				TOTAL	59%

Es mi informe,

Fecha: 20/08/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 10/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TAPERA CONSTRUCCIONES

Trabajos ejecutados son:

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	816	408	50%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	816	408	50%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	163	82	50%
5	Movimiento de suelo	M3	61	31	51%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	33	17	52%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	816	408	50%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	816	408	50%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	215	108	50%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	41	20	49%
11	Limpieza final	M2	800	400	50%
				TOTAL	55%

LOTE 6 – ZANJA PYTA – EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	6671	750	11%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	6671	750	11%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1334	150	11%
5	Movimiento de suelo	M3	500	55	11%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	267	30	11%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	6671	750	11%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	6671	750	11%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	798	200	25%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	334	84	25%
11	Limpieza final	M2	6671	750	11%
				TOTAL	22%

Es mi informe,

Fecha: 18/08/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 11/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TERRACOM

Trabajos ejecutados son:

LOTE 7 – CERRO CORA – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COLONIA SANTA CLARA					
N°	**Descripción**	**UNIDAD**	**Cantidad total**	**Avance M2**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	4800	1080	23%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	60%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	4800	1080	23%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	960	216	23%
5	Movimiento de suelo	M3	360	81	23%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	192	43	23%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	4800	1080	23%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	4800	1080	23%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1840	414	23%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	240	50	21%
11	Limpieza final	M2	4800	1080	23%
				TOTAL	**26%**

Es mi informe,

Fecha: 19/08/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay
