TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondéva
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC

CERTIFICADO DE OBRAS

OCTUBRE 2022

EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
CONTRATO N° 21/2021
LPN N° 05/2021 - ID 388.700

ESCUELA BÁSICA Nº 3 REPUBLICA DE BRASIL - Asunción

ITEM DE CONTRATO	ITEMS UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	Precio PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	Precio total	Avance físico Anterior	Avance físico Presente	Avance físico Acumulado	Monto Certificado Anterior	Monto Certificado Presente	Monto Certificado Total
	1	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS										
	1.2	**Remociones y otros**										
	1.2.3	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	42	50.000	2.100.000	-	-	-	-	-	-
	1.2.17	Remoción de revoque	m2	20	13.000	260.000	-	20,00	20,00	-	260.000	260.000
	1.8	**Muro de elevación**			0		-	-	-	-	-	-
	1.8.12	Envarillado de muros por rajaduras	ml	10	47.200	472.000	-	10,00	10,00	-	472.000	472.000
	1.10	**Techos**			0		-	-	-	-	-	-
	1.10.8	Reparación de techos con estructura de madera (cambio de	m2	42	295.000	12.390.000	-	-	-	-	-	-
	1.11	**Revoques**			0		-	-	-	-	-	-
	1.11.1	Interior y Exterior de muros a 1 capa	m2	20	54.900	1.098.000	-	20,00	20,00	-	1.098.000	1.098.000
	1.18	**Pinturas**			0		-	-	-	-	-	-
	1.18.1	De paredes revocadas al látex	m2	240	57.000	13.680.000	-	240,00	240,00	-	13.680.000	13.680.000
	1.18.6	De abertura de madera al barniz	m2	25	62.000	1.550.000	-	-	-	-	-	-
	1.31	**Bocas de Instalación Eléctrica**			0		-	-	-	-	-	-
	1.31.5	Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefación) hasta 6m	Unidad	1	300.000	300.000	-	1,00	1,00	-	300.000	300.000
	1.33	**Artefactos de Iluminación - Provisión y colocación - Montajes de artefactos de Iluminación**					-	-	-	-	-	-
	1.33.2	Artefactos fluorescentes led de 2 x 18 w (blanco)	Unidad	8	285.000	2.280.000	-	8,00	8,00	-	2.280.000	2.280.000
	1.35	**Desmontajes de artefactos eléctricos**			0		-	-	-	-	-	-
	1.35.2	De artefactos fluorescentes con recuperación de material.	Unidad	8	29.000	232.000	-	8,00	8,00	-	232.000	232.000
	1.37	**Instalación sanitaria: Hidráulica para consumo - Provisión y colocación**			0		-	-	-	-	-	-
	1.37.18	Ducha eléctrica con brazo	Unidad	1	101.000	101.000	-	-	-	-	-	-
	1.39	**Artefactos y Accesorios Sanitarios: provisión y colocación**			0		-	-	-	-	-	-
	1.39.19	Tapa de Inodoro	Unidad	2	69.500	139.000	-	2,00	2,00	-	139.000	139.000
	1.42	**Limpieza**			0		-	-	-	-	-	-
	1.42.1	Limpieza final	m2	42	12.000	504.000	-	42,00	42,00	-	504.000	504.000
	1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	m3	15	40.000	600.000	-	15,00	15,00	-	600.000	600.000
			TOTAL			35.706.000				-	19.565.000	19.565.000

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura MEC
Cel.: (0986) 450 - 245

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Conclusión:

Los trabajos han finalizado con las siguientes observaciones:

No se ha certificado la realización del destecho y su reposición en 42 m2, al comprobarse con la ultimas tormentas de lluvia que no justifica su ejecución, misma situación con el rubro de pintura: abertura de madera al barniz y la ducha eléctrica. La empresa concuerda y de esta manera se reduce la inversión en dicho local escolar.

Los demás rubros han seguido las indicaciones del PBC de la Licitación en cuestión, según las Planillas de obras, y las Especificaciones Técnicas

SE DEJA EN CLARO QUE NO EXISTE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA, SINO DESCUENTO EN LA CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA POR PARTE DE LA EMPRESA AL EXCLUIRSE LOS RUBROS QUE YA NO AMERITAN SU EJECUCION

Nueva planilla final según Ejecución de obras:

Debido al descuento en la ejecución de los rubros más arriba mencionado, la planilla Inicial aprobada con la cual se dio inicio a las obras ha sufrido variaciones en la totalidad contratada para esta institución escolar. ,

Planilla Original: 35.706.000 Gs.

Planilla ajustada a lo ejecutado: 19.565.000 Gs

Diferencia a favor del MEC: *16.141.000 Gs.*

Finalmente se da por concluido las obras previstas en el local escolar de referencia

Documentos Adjuntos: 1) Planilla de ajuste final 3) informe final, 4) uso de tiempo – avance de obra

Elaborado por el Arq. Julio Elizeche

Revisado por la: Lic Gloria Candía

Dirección de Infraestructura. Piribebuy 354 c/ Alberdi
Tel. (595 21) 495-894Asunción - Paraguay
infraestructura@mec.gov.py

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbeyondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MEC

EMPRESA CONTRATISTA : SENDERO S.A

CONTRATO Nº 21/2021 - LPN Nº 05/2021 - ID 388.700

ESCUELA BÁSICA Nº 3 REPUBLICA DE BRASIL - Asunción - PLANILLA DE AJUSTE FINAL DE OBRAS /SEGÚN EJECUCION DE RUBROS

ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Precio total
1.2	**Remociones y otros**				
1.2.17	Remoción de revoque	m2	20	13.000	260.000
1.8	**Muro de elevación**			0	
1.8.12	Envarillado de muros por rajaduras	ml	10	47.200	472.000
1.11	**Revoques**			0	
1.11.1	Interior y Exterior de muros a 1 capa	m2	20	54.900	1.098.000
1.18	**Pinturas**			0	
1.18.1	De paredes revocadas al látex	m2	240	57.000	13.680.000
1.31	**Bocas de Instalación Eléctrica**			0	
1.31.5	Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefación) hasta 6m	Unidad	1	300.000	300.000
1.33	**artefactos de iluminación**				
1.33.2	Artefactos fluorescentes led de 2 x 18 w (blanco)	Unidad	8	285.000	2.280.000
1.35	**Desmontajes de artefactos eléctricos**			0	
1.35.2	De artefactos fluorescentes con recuperación de material.	Unidad	8	29.000	232.000
1.39	**Artefactos y Accesorios Sanitarios: provisión y colocación**			0	
1.39.19	Tapa de Inodoro	Unidad	2	69.500	139.000
1.42	**Limpieza**			0	
1.42.1	Limpieza final	m2	42	12.000	504.000
1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	m3	15	40.000	600.000
			T O T A L		**19.565.000**

Arq. Julio T. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0[illegible]) 450 - 245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Infraestructura *

ESCUELA BÁSICA Nº 3 REPÚBLICA DE BRASIL (Asunción)

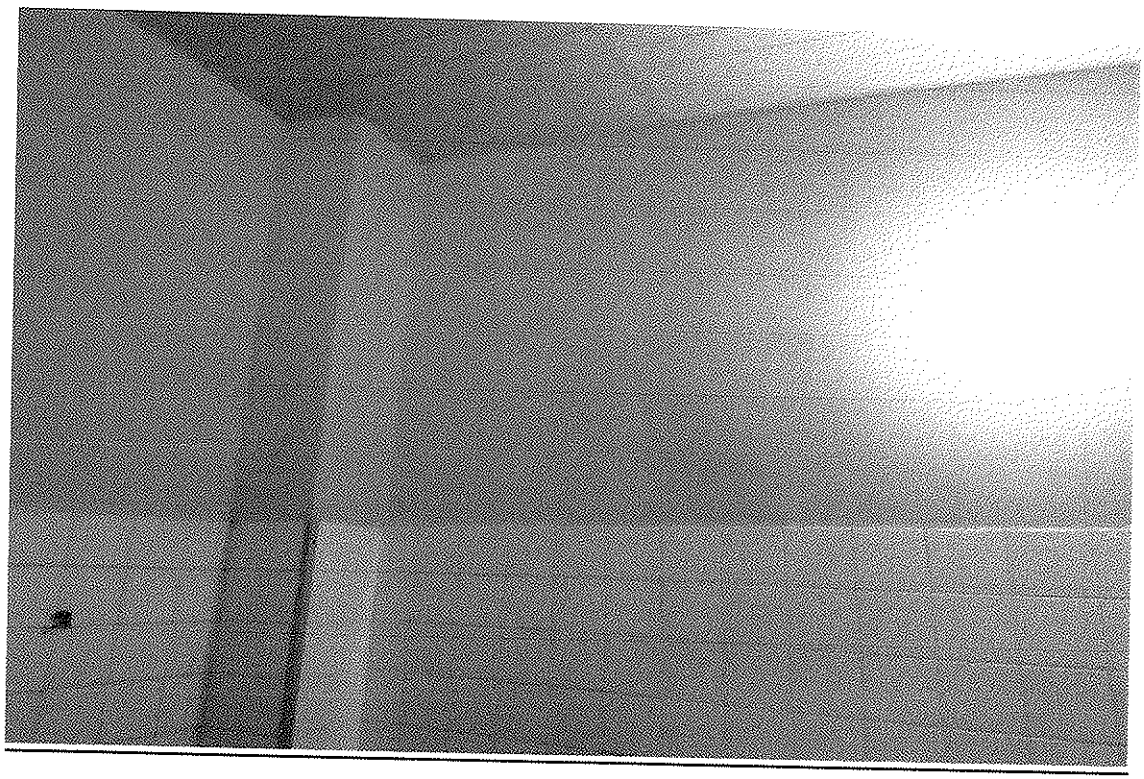

Carmen Desv
Representante Legal

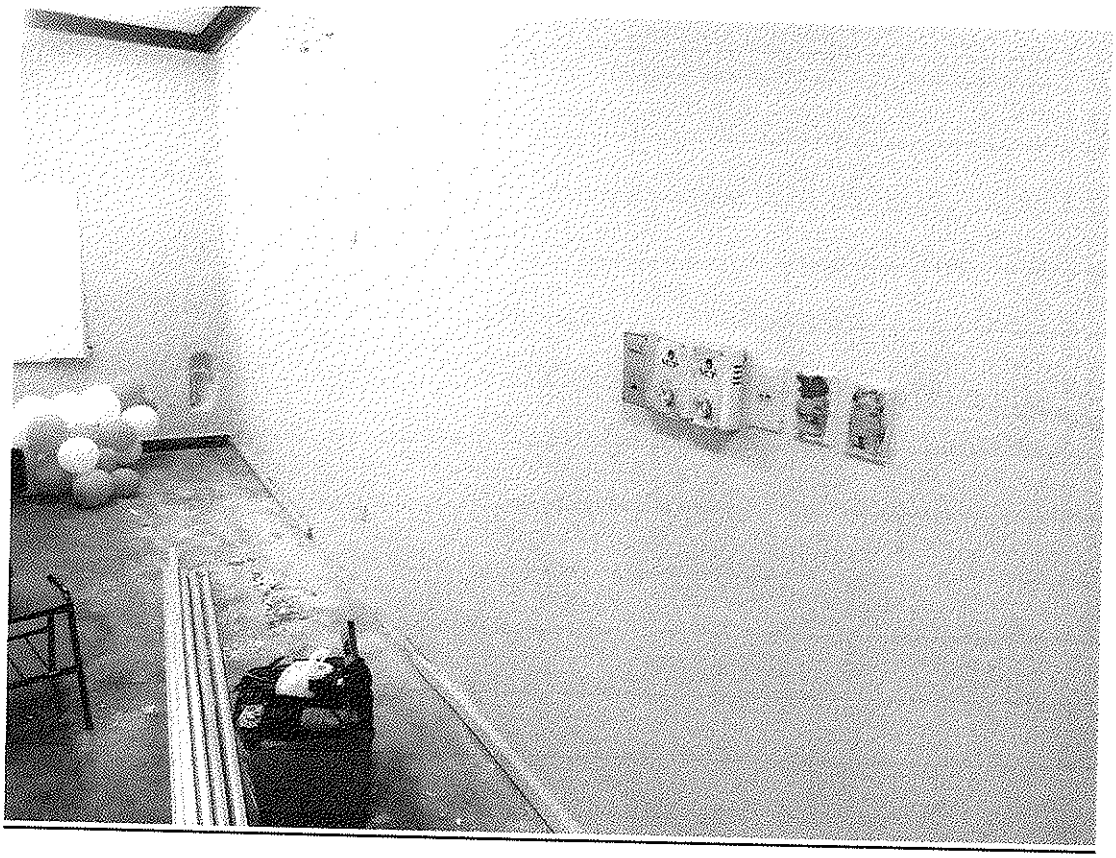

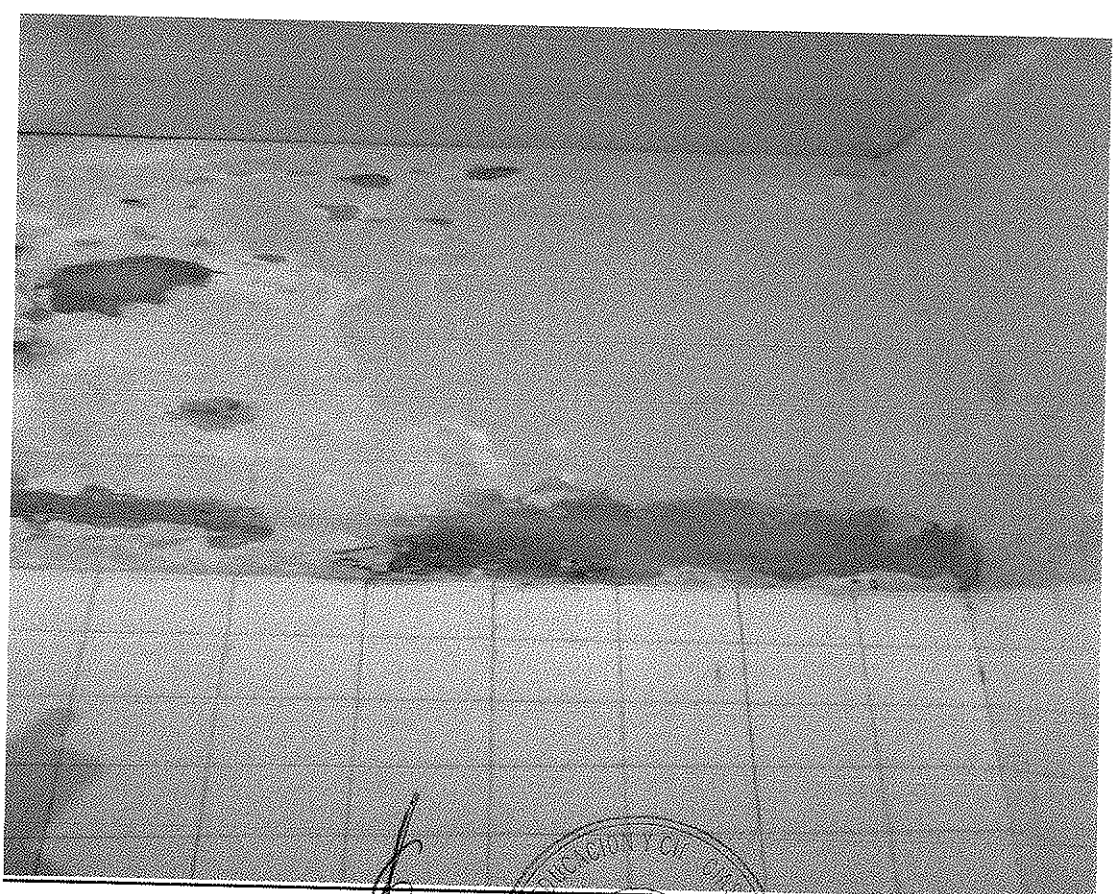

Carmen Des[illegible]s
Representante Legal
