GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

RESUMEN DE PAGO

Correspondiente al Mes: Febrero	Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Conceptos	Importes Autorizados		Importes certificados					
				Hasta certificado anterior		Presente Certificado		Total certificado a la fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%	34.040.000.000	0,00%	12.560.765.000	0,00%	5.149.513.000	0,00%	17.710.278.000
A.2	Precios Unitarios	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
A	Total Guaranies	0,00%	34.040.000.000	36,90%	12.560.765.000	15,13%	5.149.513.000	52,03%	17.710.278.000

Gobernacion de Ñeembucu

Contrato N° LPN 09/2022

Monto Gs. 34.040.000.000.-

Contratista: CONSORCIO ITACORA

Fecha de Inicio: 17 - Noviembre - 22

Plazo de Ejecucion (dias): 540

Fecha de Terminación: 17 - Abril - 24

B	Deducciones a la fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.1	Devolución del Anticipo	20,00%	0	0	0	0
B.2	Para fondo de Reparo	5,00%	0	0	0	0
B.3	Otras deducciones		0	0	0	0
BII	Total deducciones		0	0	0	0

Gobernacion de Ñeembucu

Secretaria de Obras Publicas

Mesa de Entrada

C.1	IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	5.149.513.000
C.2	MULTAS	0
C	**IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)**	**5.149.513.000**

SON GUARANÍES: Cinco mil ciento cuarenta y nueve millones quinientos trece mil guaranies .----------

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvare
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.58

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Febrero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	5,30	3,00	8,3	4,0	67,5%	53.000.000	30.000.000	83.000.000	40.000.000	67,48%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	1,00	1,00	2,00	2,0	50,0%	22.513.000	22.513.000	45.026.000	45.026.000	50,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	22.570,00	15.000,00	37.570,00	19.129,00	66,3%	507.825.000	337.500.000	845.325.000	430.402.500	66,26%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	24.020,00	17.000,00	41.020,00	23.371,00	63,7%	540.450.000	382.500.000	922.950.000	525.847.500	63,70%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	52.190,00	21.000,00	73.190,00	48.692,00	60,0%	1.174.275.000	472.500.000	1.646.775.000	1.095.570.000	60,05%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	45.030,00	29.500,00	74.530,00	37.646,00	66,4%	1.260.840.000	826.000.000	2.086.840.000	1.054.088.000	66,44%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	134.814,00	75.000,00	209.814,00	192.686,00	52,1%	4.448.862.000	2.475.000.000	6.923.862.000	6.358.638.000	52,13%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	546.000.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	390.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	0,00	0,00	0,00	402,50	0,0%	0	0	0	523.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	60,0%	22.500.000	22.500.000	45.000.000	30.000.000	60,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	57,1%	11.000.000	11.000.000	22.000.000	16.500.000	57,14%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	0,00	0,00	0,00	116,00	0,0%	0	0	0	162.400.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	1.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	27,3%	13.500.000	0	13.500.000	36.000.000	27,27%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	5,00	1,00	6,00	6,00	50,0%	2.850.000.000	570.000.000	3.420.000.000	3.420.000.000	50,00%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	3,00	0,00	3,00	3,00	50,0%	1.656.000.000	0	1.656.000.000	1.656.000.000	50,00%
		TOTAL				34.040.000.000						12.560.765.000	5.149.513.000	17.710.278.000	16.329.722.000	52,03%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8,5 km - Paso Pimdó a Apipe

Correspondiente al Mes: Febrero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0%	0	0	0	20.000.000	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	22.500	483.750.000	0,0	0,0	0,0	21.500,0	0,0%	0	0	0	483.750.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	28.000	476.000.000	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0%	0	0	0	476.000.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	33.000	1.963.500.000	0,0	0,0	0,0	59.500,0	0,0%	0	0	0	1.963.500.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	1.050.000	67.200.000	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0%	0	0	0	67.200.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	750.000	12.000.000	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0%	0	0	0	12.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	1.300.000	42.250.000	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0%	0	0	0	42.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	15.000	7.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	7.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	11.000	5.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	5.500.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	9.000	9.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	9.000.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	552.000.000	0,00%
		TOTAL				4.084.313.000						0	0	0	4.084.313.000	0,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Correspondiente al Mes: Febrero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0%	0	0	0	20.000.000	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	22.500	198.922.500	0,0	0,0	0,0	8.841,0	0,0%	0	0	0	198.922.500	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	22.500	203.175.000	0,0	0,0	0,0	9.030,0	0,0%	0	0	0	203.175.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	22.500	499.095.000	0,0	0,0	0,0	22.182,0	0,0%	0	0	0	499.095.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	28.000	501.536.000	0,0	0,0	0,0	17.912,0	0,0%	0	0	0	501.536.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	33.000	1.848.000.000	0,0	0,0	0,0	56.000,0	0,0%	0	0	0	1.848.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	1.050.000	100.800.000	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0%	0	0	0	100.800.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml			-										
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	1.300.000	52.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	52.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	22.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	11.000.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	570.000.000	1.710.000.000	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0%	0	0	0	1.710.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	552.000.000	0,00%
		TOTAL				5.795.641.500						0	0	0	5.795.641.500	0,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. Nº 1.025.553

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Correspondiente al Mes: Febrero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	22.500	72.000.000	0,0	2.000,0	2.000,0	1.200,0	62,5%	0	45.000.000	45.000.000	27.000.000	62,50%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	22.500	18.000.000	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0%	0	0	0	18.000.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0%	0	0	0	1.155.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-										
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	750.000	180.000.000	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0%	0	0	0	180.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.107.000.000						0	45.000.000	597.000.000	1.510.000.000	28,33%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Correspondiente al Mes: Febrero	Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	22.500	67.500.000	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0%	0	0	0	67.500.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	22.500	29.250.000	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0%	0	0	0	29.250.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0%	0	0	0	1.155.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-				0,0						
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	750.000	168.000.000	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0%	0	0	0	168.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	1.300.000	91.000.000	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0%	0	0	0	91.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	552.000.000	0,00%
		TOTAL				2.062.750.000						0	0	0	2.062.750.000	0,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. Nº 1.025.553

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Febrero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	5,3	0,0	5,3	0,0	100,0%	53.000.000	0	53.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	22.570,0	0,0	22.570,0	1.288,0	94,6%	507.825.000	0	507.825.000	28.980.000	94,60%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	24.020,0	0,0	24.020,0	1.141,0	95,5%	540.450.000	0	540.450.000	25.672.500	95,47%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	52.190,0	0,0	52.190,0	1.910,0	96,5%	1.174.275.000	0	1.174.275.000	42.975.000	96,47%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	45.030,0	0,0	45.030,0	1.434,0	96,9%	1.260.840.000	0	1.260.840.000	40.152.000	96,91%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	134.814,0	0,0	134.814,0	5.186,0	96,3%	4.448.862.000	0	4.448.862.000	171.138.000	96,30%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0%	0	0	0	218.400.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	30.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	13.500.000	0	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	5,0	1,0	6,0	2,0	75,0%	2.850.000.000	570.000.000	3.420.000.000	1.140.000.000	75,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				13.894.682.500						11.456.765.000	570.000.000	12.026.765.000	1.867.917.500	86,56%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 11 km - Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Febrero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	10.000.000	30.000.000	0,0	3,0	3,0	0,0	100,0%	0	30.000.000	30.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0%	0	22.513.000	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	0,0	15.000,0	15.000,0	500,0	96,8%	0	337.500.000	337.500.000	11.250.000	96,77%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	0,0	15.000,0	15.000,0	500,0	96,8%	0	337.500.000	337.500.000	11.250.000	96,77%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.500	495.000.000	0,0	21.000,0	21.000,0	1.000,0	95,5%	0	472.500.000	472.500.000	22.500.000	95,45%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	28.000	862.400.000	0,0	29.500,0	29.500,0	1.300,0	95,8%	0	826.000.000	826.000.000	36.400.000	95,78%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	33.000	2.541.000.000	0,0	75.000,0	75.000,0	2.000,0	97,4%	0	2.475.000.000	2.475.000.000	66.000.000	97,40%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	1.050.000	159.600.000	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0%	0	0	0	159.600.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml													
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	1.300.000	78.000.000	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0%	0	0	0	78.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	100,0%	0	22.500.000	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	100,0%	0	11.000.000	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	570.000.000	570.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	570.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				6.095.613.000						552.000.000	4.534.513.000	5.086.513.000	1.009.100.000	83,45%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Vivlana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA RESUMEN POR TRAMO GENERAL: 57,5 km

Correspondiente al Mes: Febrero	Año: 2023

	Tramos de Caminos a Enrripiar	Km	Costo Guaranies	Ejecutado Guaranies	Saldo Guaranies	Porcentaje de Avance
1	Villa Oliva	11	6.095.613.000,00	5.086.513.000	1.009.100.000	83,45%
2	Potrero Piru	20	13.894.682.500,00	12.026.765.000	1.867.917.500	86,56%
3	Calles de la Ciudad de Pilar	5	2.062.750.000,00	-	2.062.750.000	0,00%
4	Calles de la Ciudad de Alberdi	5	2.107.000.000,00	597.000.000	1.510.000.000	28,33%
5	Villalbin a Teniente Sanches	8	5.795.641.500,00	-	5.795.641.500	0,00%
6	Paso Pindo a Apipe	8,5	4.084.313.000,00	-	4.084.313.000	0,00%
	Total General	57,5	34.040.000.000,00	17.710.278.000	16.329.722.000	52,03%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 12.915

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

57,5km - TOTAL GENERAL

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**CANTIDADES**			
					Anterior	**Presente**	**Acumulado**	**Avance**
1	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	5,30	3,00	8,30	67,48%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	1,00	1,00	2,00	50,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.570,00	15.000,00	37.570,00	66,26%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	24.020,00	17.000,00	41.020,00	63,70%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	52.190,00	21.000,00	73.190,00	60,05%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	45.030,00	29.500,00	74.530,00	66,44%
2	**72131701-003**	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	134.814,00	75.000,00	209.814,00	52,13%
3	**72102304-005**	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	**72131601-005**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	60,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	57,14%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	27,27%
5	**72131702-001**	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	5,00	1,00	6,00	50,00%
5.2		Movilizacion	un	6,00	3,00	0,00	3,00	50,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml				-	
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	0,00	0,00	-	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8,5km - Paso Pimdó a Apipe

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO					-	
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml					
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	0,00	2.000,00	2.000	62,50%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml				-	
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. Nº 1.025.553

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

11 km - Villa Oliva

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	0,00	3,00	3	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	1,00	1	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	0,00	15.000,00	15.000	96,77%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	0,00	15.000,00	15.000	96,77%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	0,00	21.000,00	21.000	95,45%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	0,00	29.500,00	29.500	95,78%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	0,00	75.000,00	75.000	97,40%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml					
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00		1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

20 km Tramo Potrero Pirú

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Febrero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.570,00	0,00	22.570,00	94,60%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	24.020,00	0,00	24.020,00	95,47%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	52.190,00	0,00	52.190,00	96,47%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	45.030,00	0,00	45.030,00	96,91%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	134.814,00	0,00	134.814,00	96,30%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	5,00	1,00	6,00	75,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

AVANCE	
Mes:	Febrero

CONTRATISTA : CONSORCIO ITACORA

PAVIMENTOS ENRRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - LPN 09 -2022 - ID N° 412.692

CURVA CONTRACTUAL Y AVANCE

	AVANCE FINANCIERO				AVANCE %				DESVÍO + -	
	PREVISTO Gs.		EJECUTADO Gs.		PREVISTO		EJECUTADO			
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
INICIO	**0**	**0**	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%		
nov-22	**3.000.000.000**	3.000.000.000	**3.203.121.500**	3.203.121.500	8,81%	8,81%	9,41%	9,41%	0,60%	Ok
dic-22	**6.916.215.421**	9.916.215.421	**6.713.093.500**	9.916.215.000	20,32%	29,13%	19,72%	29,13%	0,00%	Ok
ene-23	**5.023.784.579**	14.940.000.000	**2.644.550.000**	12.560.765.000	14,76%	43,89%	7,77%	36,90%	-6,99%	atraso
feb-23	**3.500.000.000**	18.440.000.000	**5.149.513.000**	17.710.278.000	10,28%	54,17%	15,13%	52,03%	-2,14%	atraso
mar-23	**2.000.000.000**	20.440.000.000	**0**	0	5,88%	60,05%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
abr-23	**2.000.000.000**	22.440.000.000	**0**	0	5,88%	65,92%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
may-23	**1.500.000.000**	23.940.000.000	**0**	0	4,41%	70,33%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
jun-23	**1.500.000.000**	25.440.000.000	**0**	0	4,41%	74,74%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
jul-23	**1.500.000.000**	26.940.000.000	**0**	0	4,41%	79,14%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
ago-23	**1.000.000.000**	27.940.000.000	**0**	0	2,94%	82,08%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
sept-23	**1.000.000.000**	28.940.000.000	**0**	0	2,94%	85,02%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
oct-23	**1.000.000.000**	29.940.000.000	**0**	0	2,94%	87,96%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
nov-23	**1.000.000.000**	30.940.000.000	**0**	0	2,94%	90,89%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
dic-23	**1.000.000.000**	31.940.000.000	**0**	0	2,94%	93,83%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
ene-24	**1.000.000.000**	32.940.000.000	**0**	0	2,94%	96,77%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
feb-24	**500.000.000**	33.440.000.000	**0**	0	1,47%	98,24%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
mar-24	**500.000.000**	33.940.000.000	**0**	0	1,47%	99,71%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
abr-24	**100.000.000**	34.040.000.000	**0**	**0**	0,29%	100,00%	0,00%	52,03%	0,00%	Ok
TOTALES	**34.040.000.000**				100,00%					

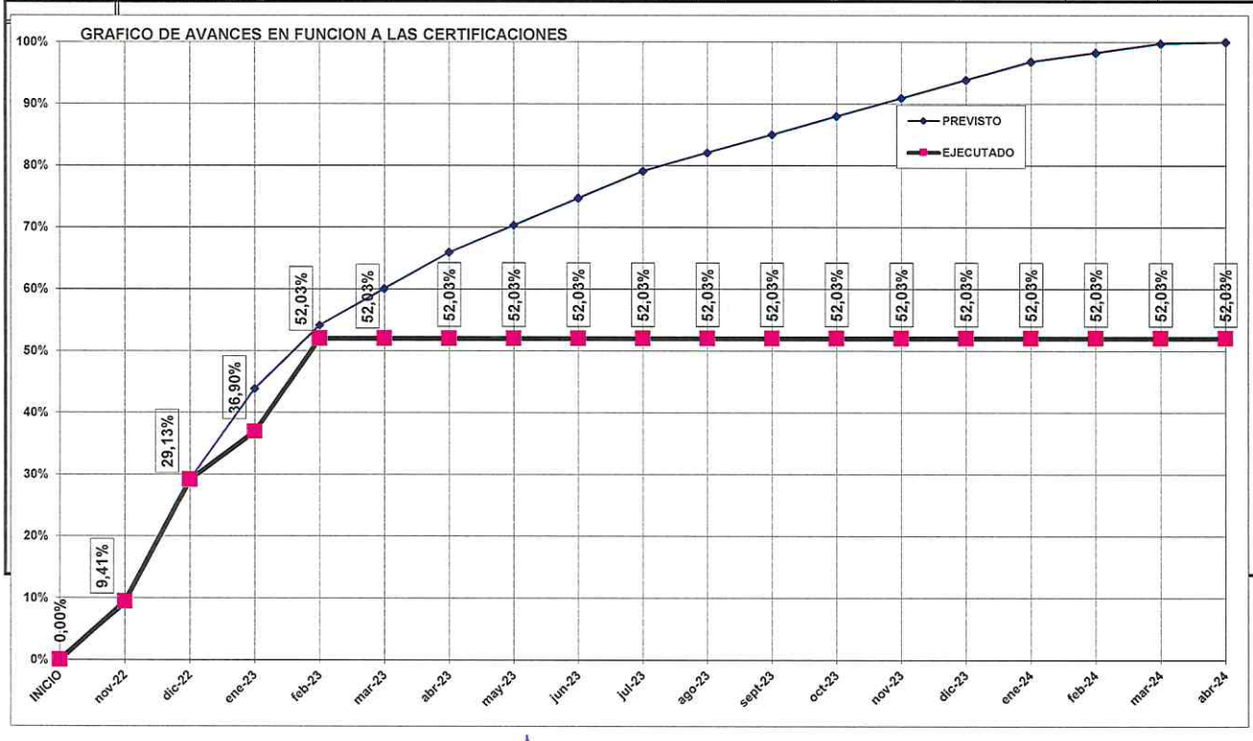

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Bolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN
