LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

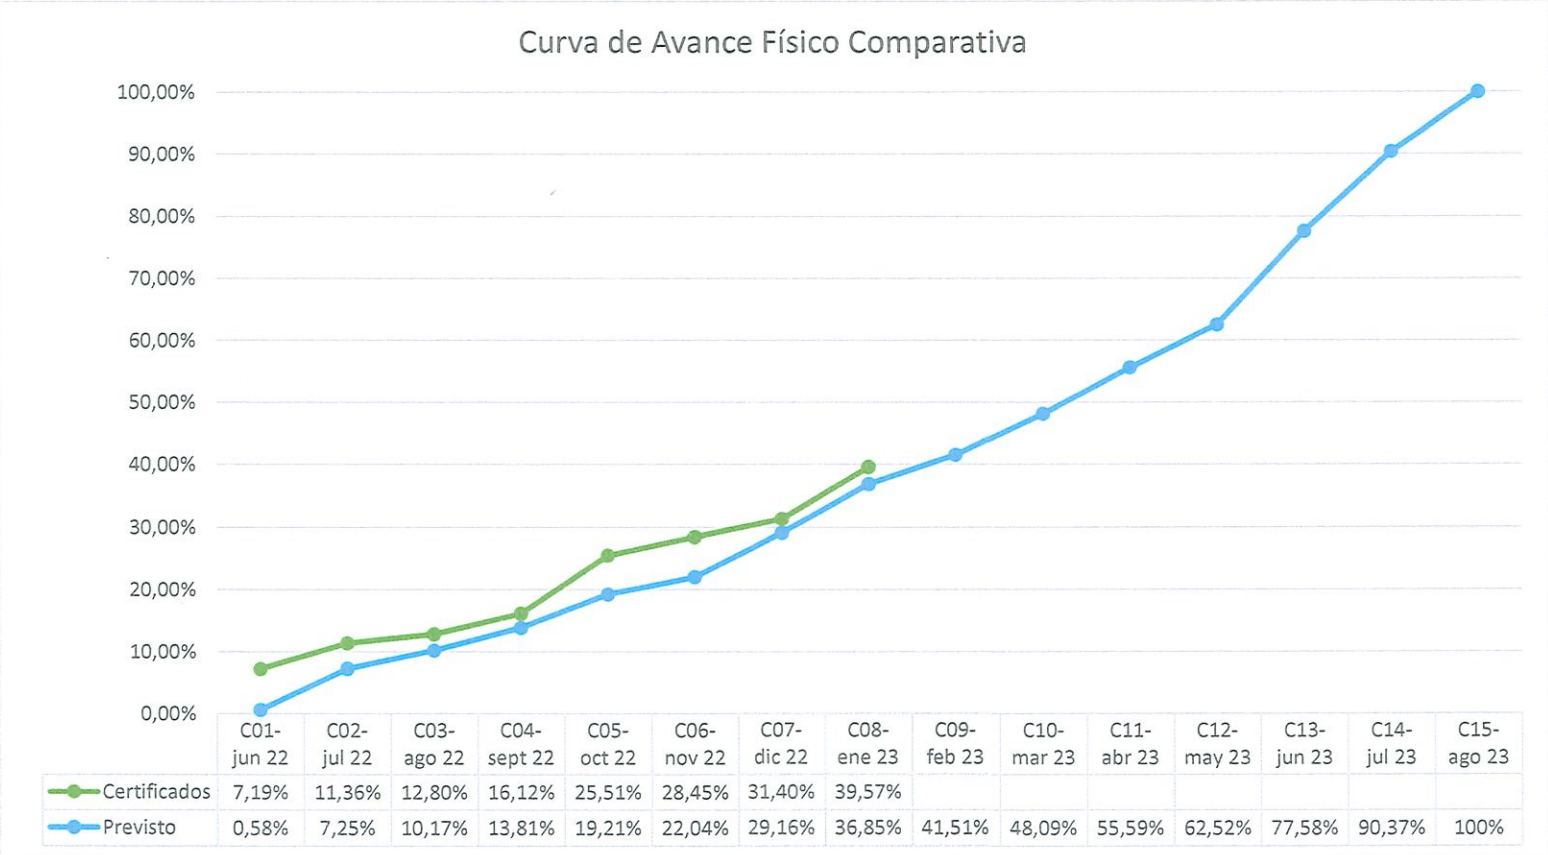


| | C01-jun 22 | C02-jul 22 | C03-ago 22 | C04-sept 22 | C05-oct 22 | C06-nov 22 | C07-dic 22 | C08-ene 23 | C09-feb 23 | C10-mar 23 | C11-abr 23 | C12-may 23 | C13-jun 23 | C14-jul 23 | C15-ago 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificados | 7,19% | 11,36% | 12,80% | 16,12% | 25,51% | 28,45% | 31,40% | 39,57% | | | | | | | |
| Previsto | 0,58% | 7,25% | 10,17% | 13,81% | 19,21% | 22,04% | 29,16% | 36,85% | 41,51% | 48,09% | 55,59% | 62,52% | 77,58% | 90,37% | 100% |

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

**Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327**

LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaje y retiro de Obrador (Oficina Técnica, Caseta para materiales y herramientas, Caseta para Sereno, Caseta para vestuario del personal, Baño para el personal y Baño para el Fiscal de Obra/Jefe de Obra) | 36.450.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Poda de árboles | 972.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Destronque y desraizamiento de arboles | 8.506.000 | | | | | | | | | | | | 12.747.600 | 12.747.600 | 12.747.600 |
| 4 | Desmonte, excavación | | | | | | | | | | | | | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.620.000 |
| 5 | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado. | | | | | | | | | | | | | 13.370.000 | 13.370.000 | 13.370.000 |
| + | Provisión y colocación de badenes prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado, tipo cuneta. | | | | | | | | | | | | | | 51.345.900 | 51.345.900 |
| 7 | Empedrado en acceso y estacionamiento. | | | | | | | | | | | | | | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 8 | Provisión y cultivo de pasto en panes y especies arbóreas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Replanteo y marcación de obra | | | | | 801.667 | 801.667 | 801.667 | | | | | | | | |
| 10 | Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº . | | | | | 851.000 | 851.000 | 851.000 | | | | | | | | |
| 11 | Despeje y retiro de capa vegetal | | | | | 1.956.067 | 1.956.067 | 1.956.067 | | | | | | | | |
| 12 | Excavación | | | | | 5.346.667 | 5.346.667 | 5.346.667 | | | | | | | | |
| 13 | Relleno en área de Edificio y guarda obra, con provisión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación. | | | | | | 5.371.167 | 5.371.167 | 5.371.167 | | | | | | | |
| 14 | Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT ) | | | | | | | 96.648.000 | 96.648.000 | | | | | | | |
| 15 | Estructura de H°A° - Fuste | | | | | | | 6.548.967 | 6.548.967 | 6.548.967 | | | | | | |
| 16 | Estructura de H°A° - Viga de Fundación | | | | | | | 47.066.800 | 47.066.800 | 47.066.800 | | | | | | |
| 17 | Estructura de H°A° - Pilar a la vista | | | | | | | 16.840.200 | 16.840.200 | 16.840.200 | | | | | | |
| 18 | Estructura de H°A° - Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2 | | | | | | | | 122.842.500 | 122.842.500 | | | | | | |
| 19 | Estructura de H°A° - Viga superior a la vista | | | | | | | | 42.708.200 | 42.708.200 | | | | | | |
| 20 | Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Losa base, h=20 cm ( incluye canaletas y registros colectores de derrames, murete de seguridad y rampa de acceso, juntas de dilatación y contracción) | | | | | | | | | | | | 41.980.400 | 41.980.400 | | |
| 21 | Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Sobre losa ( de sacrificio), hvar.= ( 8cm. Min ), terminado con alisadora mecánica y con las pendientes requeridas | | | | | | | | | | | | 37.788.000 | 37.788.000 | | |
| 22 | Mampostería de nivelación de 0,30 m | | | | | | | | | | 5.654.000 | 5.654.000 | | | | |
| 23 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,15 m | | | | | | | | | | 21.945.000 | 21.945.000 | | | | |
| 24 | Mampostería de ladrillo común de 0.15m | | | | | | | | | | 52.511.250 | 52.511.250 | | | | |
| 25 | Aislación Horizontal de Paredes. | | | | | | | | | | 5.285.200 | 5.285.200 | | | | |
| 26 | Aislamiento poliuretano in situ 30mm | | | | | | | | | | 41.553.000 | 41.553.000 | | | | |
| 27 | Aislación de piso de H° A° - Lámina 1, entre suelo y losa: Suministro e instalación de una Lámina de Polietileno (PEAD 2 mm ), la cual deberá ser firmemente anclada a través de perfiles PEAD | | | | | | | | | | | 2.758.994 | 2.758.994 | | | |
| 28 | Aislación de piso de H° A° - Lámina 2, entre losa base y sobre losa: Suministro e instalación de una Lámina de Polietileno ( PEAD 2 mm ), la cual deberá ser firmemente anclada a través de perfiles PEAD | | | | | | | | | | | 2.207.195 | 2.207.195 | | | |
| 29 | Construcción carpeta de terminación y/o regularización de losa alivianada | | | | | | | | | | | 9.900.000 | 9.900.000 | | | |
| 30 | Impermeabilización de techo plano y vigas invertidas utilizando manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 | | | | | | | | | | | 54.675.000 | 54.675.000 | | | |
| 31 | Contrapiso de H° de cascote e: 10cm | | | | | | | | | | | | | 12.960.000 | 12.960.000 | |
| 32 | Estructura metálica - Techo de Chapa Metálica galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica). | | | | | | | | | | | | | 81.865.000 | 81.865.000 | |
| 33 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (interior - incluye aristas) | | | | | | | | | | | | | 23.580.000 | 23.580.000 | |
| 34 | Construcción de revoque de pared, con hidrófugo (exterior - incluye aristas) | | | | | | | | | | | | | 4.519.500 | 4.519.500 | |
| 35 | Construcción de revoque de cielo raso, sin hidrófugo (interior - incluye azotada impermeable) | | | | | | | | | | | | | 17.685.000 | 17.685.000 | |
| 36 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (base azulejado) | | | | | | | | | | | | | 4.932.150 | 4.932.150 | |
| 37 | Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños y oficinas. | | | | | | | | | | | | 18.348.000 | 18.348.000 | 18.348.000 | |
| 38 | Zócalo cerámico similar al piso | | | | | | | | | | | | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.215.500 | |
| 39 | Baldosones de hormigón en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | | | | | | | | | | | | | 3.518.667 | 3.518.667 | 3.518.667 |
| 40 | Piso de hormigón rodillado en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | | | | | | | | | | | | | 4.099.333 | 4.099.333 | 4.099.333 |
| 41 | Zócalos baldosones de hormigón | | | | | | | | | | | | | 605.933 | 605.933 | 605.933 |
| 42 | Azulejo cerámico esmaltado | | | | | | | | | | | | 7.412.867 | 7.412.867 | 7.412.867 | |
| 43 | Ventanas de vidrios templados (incluye marcos) | | | | | | | | | | | | 6.521.267 | 6.521.267 | 6.521.267 | |
| 44 | Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio, pivot y freno. | | | | | | | | | | | | 6.682.133 | 6.682.133 | 6.682.133 | |
| 45 | Puerta de hojas corredizas con vidrios templados de 8mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio,carriles y cerraduras. | | | | | | | | | | | | 8.364.233 | 8.364.233 | 8.364.233 | |
| 46 | Vidrios templados de 10mm - paños fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio. | | | | | | | | | | | | 26.732.000 | 26.732.000 | 26.732.000 | |
| 47 | Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | | | | | | | | | | | | | 13.757.500 | 13.757.500 | |

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

Ing. Cesar Medina J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

| Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
| 48 | Puerta de Acero (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | | | | | | | | | | | | | | | 4.678.000 |
| 49 | Puerta cortafuego - puerta de emergencia (incluye marco, contramarco, cerradura ,herraje y sistema de apertura y cierre antipánico) | | | | | | | | | | | | | | 2.551.500 | 2.551.500 |
| 50 | Vallado malla plast 50x50x2.5 H= 2m | | | | | | | | | | | | | | 1.117.800 | 1.117.800 |
| 51 | Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio. | | | | | | | | | | | | | 41.580.000 | 41.580.000 | |
| 52 | melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas y/o ciegas, de altura variable, con puerta de 0,80m, incluye cerraduras, herrajes, y zócalos para cableado. | | | | | | | | | | | | | 16.402.500 | 16.402.500 | |
| 53 | Desagüe Pluvial de Techo, incluye boquetas de Acero Galvanizado Chapa N° 20 - embebidas en la losa con diámetro de 150mm | | | | | | | | | | | | | 3.888.000 | 3.888.000 | |
| 54 | Desagüe Pluvial de Techo, incluye tubos de bajadas de PVC de 150mm, embudos, sujeciones, conexiones al sistema de drenaje, etc.) | | | | | | | | | | | | | 3.420.000 | 3.420.000 | |
| 55 | Desagüe Pluvial de Techo, incluye conexiones al sistema de drenaje con caños de PVC de 150mm, entre registros.) | | | | | | | | | | | | | 4.560.000 | 4.560.000 | |
| 56 | Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, incluye rejillas | | | | | | | | | | | | | 3.015.900 | 3.015.900 | |
| 57 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 40mm | | | | | | | | | | | | | 1.064.000 | 1.064.000 | |
| 58 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 75mm | | | | | | | | | | | | | 219.000 | 219.000 | |
| 59 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 100mm | | | | | | | | | | | | | 1.201.200 | 1.201.200 | |
| 60 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 200mm | | | | | | | | | | | | | 11.285.550 | 11.285.550 | |
| 61 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector colgado de PVC de 150mm | | | | | | | | | | | | | 3.092.600 | 3.092.600 | |
| 62 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de pozo de drenaje prefabricado. D= 1000mm | | | | | | | | | | | | | | 2.401.600 | 2.401.600 |
| 63 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de sifón de PVC | | | | | | | | | | | | | 170.200 | 170.200 | |
| 64 | Suministros e instalación de tapas reforzadas metálicas tipo rejilla, para canaletas colectoras (incluye pintura de protección) | | | | | | | | | | | | | | 3.555.000 | 3.555.000 |
| 65 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fría y caliente (incluye todas las cañerías, codos, conexiones, llaves de paso, griferías y accesorios)- Según planos y detalles | | | | | | | | | | | | | 13.364.133 | 13.364.133 | 13.364.133 |
| 66 | Tanque elevado de 1000lts (incluye conexiones y estructura metálica de soporte) | | | | | | | | | | | | | | 10.934.300 | 10.934.300 |
| 67 | Desagüe Cloacal de sanitario ( incluye cañerías, rejillas de piso sifonadas) | | | | | | | | | | | | | 498.200 | 498.200 | |
| 68 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal) | | | | | | | | | | | | | 2.446.600 | 2.446.600 | |
| 69 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara séptica) | | | | | | | | | | | | | | 1.004.700 | 1.004.700 |
| 70 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de pozo absorbente) | | | | | | | | | | | | | | 1.425.150 | 1.425.150 |
| 71 | Provisión y colocación de inodoro | | | | | | | | | | | | | | 1.137.300 | 1.137.300 |
| 72 | Provisión y colocación de mingitorio | | | | | | | | | | | | | | 1.063.250 | 1.063.250 |
| 73 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal | | | | | | | | | | | | | | 461.700 | 461.700 |
| 74 | Provisión y colocación de cisterna alta | | | | | | | | | | | | | | 80.400 | 80.400 |
| 75 | Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoro | | | | | | | | | | | | | | | 160.800 |
| 76 | Provisión y colocación de portarrollo | | | | | | | | | | | | | | | 291.600 |
| 77 | Provisión y colocación de jabonera | | | | | | | | | | | | | | | 291.600 |
| 78 | Provisión y colocación de espejos | | | | | | | | | | | | | | | 1.519.000 |
| 79 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para lavatorios | | | | | | | | | | | | | | 789.900 | 789.900 |
| 80 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para mingitorios | | | | | | | | | | | | | | 658.250 | 658.250 |
| 81 | Provisión y colocación de griferías para ducha | | | | | | | | | | | | | | 2.326.100 | 2.326.100 |
| 82 | Provisión y colocación de llave de paso | | | | | | | | | | | | | 1.543.300 | 1.543.300 | 1.543.300 |
| 83 | Provisión y colocación de tubería PVC presión de 1/2 | | | | | | | | | | | | | 662.200 | 662.200 | 662.200 |
| 84 | Provisión y colocación de tubería PVC presión de 3/4 | | | | | | | | | | | | | 401.500 | 401.500 | 401.500 |
| 85 | Provisión y colocación de ducha eléctrica (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | | | | | | | | | | | | | 510.300 | 510.300 | 510.300 |
| 86 | Provisión y colocación de ducha lava ojos (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, montaje sobre mesa,etc) | | | | | | | | | | | | | 567.067 | 567.067 | 567.067 |
| 87 | Provisión y colocación de termo calefón de 400lts (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | | | | | | | | | | | | | 2.227.367 | 2.227.367 | 2.227.367 |
| 88 | Provisión y colocación de plato ducha acrílico de 900x900mm. | | | | | | | | | | | | | | 1.093.600 | 1.093.600 |
| 89 | Provisión y colocación de placa identificatoria aseos/vestuario. | | | | | | | | | | | | | | | 583.200 |
| 90 | Provisión y colocación de bachas ovaladas de losa . Incluye conexiones flexibles. | | | | | | | | | | | | | 406.400 | 406.400 | |
| 91 | Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable rígida . Incluye conexiones flexibles | | | | | | | | | | | | | 206.600 | 206.600 | |
| 92 | Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,50m de ancho en baños ) | | | | | | | | | | | | | | 7.290.000 | 7.290.000 |

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Caspar Maldana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

| Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
| 93 | Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños, color según muestra, de 15cm, en todos los lados requeridos | | | | | | | | | | | | | | 3.007.500 | 3.007.500 |
| 94 | Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños, color según muestra, de 10cm, en todos los lados requeridos | | | | | | | | | | | | | | 3.007.500 | 3.007.500 |
| 95 | Provisión y colocación de separadores de granito entre mingitorios, 0,50mx0,90m, color según muestra, incluye soportes. | | | | | | | | | | | | | | 729.000 | 729.000 |
| 96 | Acometida de media tensión trifásica y PD a la intemperie para transformador trifásico de 300kVA-diseño final de la inst. Eléctrica | | | | | | | | | | | | | 16.413.833 | 16.413.833 | 16.413.833 |
| 97 | Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 300 kVA (con accesorios de protección y medición) | | | | | | | | | | | | | 32.586.200 | 32.586.200 | 32.586.200 |
| 98 | Provisión e instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2) | | | | | | | | | | | | | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 99 | Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general) | | | | | | | | | | | | | 7.796.667 | 7.796.667 | 7.796.667 |
| 100 | Provisión e instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e interruptores Termomagnéticos, tipo europeo. | | | | | | | | | | | | | 779.600 | 779.600 | 779.600 |
| 101 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C | | | | | | | | | | | | | 71.567 | 71.567 | 71.567 |
| 102 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T | | | | | | | | | | | | | 23.867 | 23.867 | 23.867 |
| 103 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes | | | | | | | | | | | | | 710.500 | 710.500 | 710.500 |
| 104 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x20 amperes | | | | | | | | | | | | | 304.500 | 304.500 | 304.500 |
| 105 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x16 amperes | | | | | | | | | | | | | 210.500 | 210.500 | 210.500 |
| 106 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x10 amperes | | | | | | | | | | | | | 437.500 | 437.500 | 437.500 |
| 107 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm - sobre el cielorraso. | | | | | | | | | | | | | 2.223.000 | 2.223.000 | 2.223.000 |
| 108 | Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) | | | | | | | | | | | | | 3.822.000 | 3.822.000 | 3.822.000 |
| 109 | Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) | | | | | | | | | | | | | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| 110 | Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) | | | | | | | | | | | | | 1.911.000 | 1.911.000 | 1.911.000 |
| 111 | Provisión e instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos | | | | | | | | | | | | | 6.848.267 | 6.848.267 | 6.848.267 |
| 112 | Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos | | | | | | | | | | | | | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 113 | Provisión e instalación: Equipo tipo spot de embutir, para lámparas de bajo consumo. | | | | | | | | | | | | | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 114 | Provisión e instalación de circuito con fotocélulas para iluminación externa. | | | | | | | | | | | | | 781.000 | 781.000 | 781.000 |
| 115 | Construcción de registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m. | | | | | | | | | | | | | 744.667 | 744.667 | 744.667 |
| 116 | Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves ) | | | | | | | | | | | | | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 117 | Provisión y colocación de tapas ciegas rectangulares plásticas. | | | | | | | | | | | | | 101.333 | 101.333 | 101.333 |
| 118 | Provisión y colocación de cañerías de 3/4 de reserva. | | | | | | | | | | | | | 506.667 | 506.667 | 506.667 |
| 119 | Acometida Telefónica: 2 ductos de 1 para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares | | | | | | | | | | | | | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 120 | Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares | | | | | | | | | | | | | 146.733 | 146.733 | 146.733 |
| 121 | Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares. | | | | | | | | | | | | | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 122 | Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre. | | | | | | | | | | | | | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 123 | Provisión y colocación de Marco ampliación | | | | | | | | | | | | | 12.167 | 12.167 | 12.167 |
| 124 | Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares | | | | | | | | | | | | | 178.667 | 178.667 | 178.667 |
| 125 | Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac. | | | | | | | | | | | | | 38.833 | 38.833 | 38.833 |
| 126 | Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10 | | | | | | | | | | | | | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 127 | Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido | | | | | | | | | | | | | 253.333 | 253.333 | 253.333 |
| 128 | Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado) | | | | | | | | | | | | | 549.500 | 549.500 | 549.500 |
| 129 | Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2 para alimentación de Swich en sala Técnica. | | | | | | | | | | | | | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 130 | Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Sala Técnica). | | | | | | | | | | | | | 186.400 | 186.400 | 186.400 |
| 131 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras) | | | | | | | | | | | | | 549.500 | 549.500 | 549.500 |

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Caspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

| Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
| 132 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. | | | | | | | | | | | | | 4.965.333 | 4.965.333 | 4.965.333 |
| 133 | Provisión e instalación de panel de Control Central | | | | | | | | | | | | | 1.091.433 | 1.091.433 | 1.091.433 |
| 134 | Provisión e instalación de disyuntor diferencial en tablero | | | | | | | | | | | | | 116.967 | 116.967 | 116.967 |
| 135 | Provisión e instalación de detector humo-calor | | | | | | | | | | | | | 1.528.333 | 1.528.333 | 1.528.333 |
| 136 | Extintor Polvo 113A/21B 6 kg. | | | | | | | | | | | | | 822.000 | 822.000 | 822.000 |
| 137 | Iluminación de Emergencia D-200 | | | | | | | | | | | | | 373.600 | 373.600 | 373.600 |
| 138 | Señal Poliprop. 210x197 mm. Fotolum. | | | | | | | | | | | | | 776.400 | 776.400 | 776.400 |
| 139 | Pulsador Alarma Fuego | | | | | | | | | | | | | 373.600 | 373.600 | 373.600 |
| 140 | Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split | | | | | | | | | | | | | 1.599.133 | 1.599.133 | 1.599.133 |
| 141 | Provisión e Inst. de aparatos de A°A° Split tipo Casette de 36.000 BTU | | | | | | | | | | | | | 4.856.467 | 4.856.467 | 4.856.467 |
| 142 | Provisión e Inst. de aparatos de A°A° Split tipo Casette de 24.000 BTU | | | | | | | | | | | | | 4.181.067 | 4.181.067 | 4.181.067 |
| 143 | Provisión e instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | | | | | | | | | | | | | 11.626.333 | 11.626.333 | 11.626.333 |
| 144 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC Ø 25mm. | | | | | | | | | | | | | 1.513.333 | 1.513.333 | 1.513.333 |
| 145 | Provisión e instalación de extractor de aire para sanitario | | | | | | | | | | | | | 298.933 | 298.933 | 298.933 |
| 146 | Extractores eólicos de techo. | | | | | | | | | | | | | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 147 | Provisión e instalación de Gases (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | | 24.125.967 | 24.125.967 | 24.125.967 |
| 148 | Aplicación de Enduído Interior | | | | | | | | | | | | | 4.774.267 | 4.774.267 | 4.774.267 |
| 149 | Pintura al látex lavable interior de paredes | | | | | | | | | | | | | 3.431.000 | 3.431.000 | 3.431.000 |
| 150 | Pintura al aceite lavable interior de paredes | | | | | | | | | | | | | 2.287.333 | 2.287.333 | 2.287.333 |
| 151 | Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos | | | | | | | | | | | | | 4.161.000 | 4.161.000 | 4.161.000 |
| 152 | Aplicación de pintura sintética en aberturas metálicas (previa aplicación de antióxido) | | | | | | | | | | | | | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| 153 | Aplicación de pintura sintética en canaletas y bajadas pluviales | | | | | | | | | | | | | 617.500 | 617.500 | 617.500 |
| 154 | Aplicación de pintura barniz marino en aberturas de madera | | | | | | | | | | | | | 727.500 | 727.500 | 727.500 |
| 155 | Pintura epóxica para Hormigón Pulido (piso), incluyendo canaletas colectoras y registros | | | | | | | | | | | | | 5.925.833 | 5.925.833 | 5.925.833 |
| 156 | Replanteo y marcación de obra | 8.875.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº . | 2.553.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Despeje y retiro de capa vegetal | 8.662.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Excavación | | 12.528.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Desmonte en área de Edificio y guarda obra, con retiro de tierra sobrante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación. | | 17.466.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT ) | | 699.637.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Estructura de H°A° - Fuste | | 33.918.133 | 33.918.133 | 33.918.133 | | | | | | | | | | | |
| 163 | Estructura de H°A° - Viga de Fundación | | | 300.360.500 | 300.360.500 | 300.360.500 | | | | | | | | | | |
| 164 | Estructura de H°A° - Pilar a la vista | | | | 82.095.975 | 82.095.975 | 82.095.975 | 82.095.975 | | | | | | | | |
| 165 | Estructura de H°A° - Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2 | | | | | 102.343.933 | 102.343.933 | 102.343.933 | | | | | | | | |
| 166 | Estructura de H°A° - Viga superior a la vista | | | | | 123.629.000 | 123.629.000 | 123.629.000 | 123.629.000 | | | | | | | |
| 167 | Estructura de H°A° - Escalera | | | | | 1.354.333 | 1.354.333 | 1.354.333 | | | | | | | | |
| 168 | Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Losa base, h=20 cm ( Incluye canaletas y registros colectores de derrames, murete de seguridad y rampa de acceso, juntas de dilatación y contracción) | | | | | | | | 39.077.500 | 39.077.500 | 39.077.500 | 39.077.500 | | | | |
| 169 | Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Sobre losa ( de sacrificio), hvar.= ( 8cm. Min ), terminado con alisadora mecánica y con las pendientes requeridas | | | | | | | | 31.657.500 | 31.657.500 | 31.657.500 | 31.657.500 | | | | |
| 170 | Mampostería de nivelación de 0,30 m | | | | | | | 7.538.667 | 7.538.667 | 7.538.667 | | | | | | |
| 171 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,15 m | | | | | | | 90.500.667 | 90.500.667 | 90.500.667 | | | | | | |
| 172 | Mampostería de ladrillo común de 0.15m | | | | | | | 30.855.733 | 30.855.733 | 30.855.733 | | | | | | |
| 173 | Mampostería de ladrillo convocó | | | | | | | 4.171.200 | 4.171.200 | | | | | | | |
| 174 | Aislación Horizontal de Paredes. | | | | | | | 5.285.200 | 5.285.200 | | | | | | | |
| 175 | Aislamiento poliuretano in situ 30mm | | | | | | | 185.530.500 | 185.530.500 | | | | | | | |
| 176 | Aislación de piso de H° A° - Lámina 1, entre suelo y losa: Suministro e instalación de una Lámina de Polietileno (PEAD 2 mm ), la cual deberá ser firmemente anclada a través de perfiles PEAD | | | | | | | | 23.785.000 | 23.785.000 | | | | | | |
| 177 | Aislación de piso de H° A° - Lámina 2, entre losa base y sobre losa: Suministro e instalación de una Lámina de Polietileno ( PEAD 2 mm ), la cual deberá ser firmemente anclada a través de perfiles PEAD | | | | | | | | | | 23.785.000 | 23.785.000 | | | | |
| 178 | Construcción carpeta de terminación y/o regularización de losa alivianada | | | | | | | | | | 11.341.000 | 11.341.000 | | | | |
| 179 | Impermeabilización de techo plano y vigas invertidas utilizando manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2. | | | | | | | | | | 31.225.500 | 31.225.500 | | | | |
| 180 | Contrapiso de H° de cascote e: 10cm | | | | | | | | | | 6.528.000 | 6.528.000 | | | | |

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Cesar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

| Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
| 181 | Estructura metálica - Techo de Chapa Metálica galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica). | | | | | | | | | | 393.653.700 | 393.653.700 | | | | |
| 182 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (interior - incluye aristas) | | | | | | | | | 54.089.900 | 54.089.900 | 54.089.900 | | | | |
| 183 | Construcción de revoque de pared, con hidrófugo (exterior - incluye aristas) | | | | | | | | | 3.013.000 | 3.013.000 | 3.013.000 | | | | |
| 184 | Construcción de revoque de cielo raso, sin hidrófugo (interior - incluye azotada impermeable) | | | | | | | | | 13.506.100 | 13.506.100 | 13.506.100 | | | | |
| 185 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (base azulejado) | | | | | | | | | 2.921.300 | 2.921.300 | 2.921.300 | | | | |
| 186 | Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños y oficinas. | | | | | | | | | | 14.178.000 | 14.178.000 | | | | |
| 187 | Zócalo cerámico similar al piso | | | | | | | | | | 1.823.250 | 1.823.250 | | | | |
| 188 | Baldosones de hormigón en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | | | | | | | | | | | | | | 5.278.000 | 5.278.000 |
| 189 | Piso de hormigón rodillado en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | | | | | | | | | | | | | | 5.676.000 | 5.676.000 |
| 190 | Zócalos baldosones de hormigón | | | | | | | | | | | | | | 908.900 | 908.900 |
| 191 | Azulejo cerámico esmaltado | | | | | | | | | | | 9.878.900 | 9.878.900 | | | |
| 192 | Ventanas de vidrios templados (incluye marcos) | | | | | | | | | | | | 94.203.950 | 94.203.950 | | |
| 193 | Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio, pivot y freno. | | | | | | | | | | | | | 6.682.133 | 6.682.133 | 6.682.133 |
| 194 | Puerta de hojas corredizas con vidrios templados de 8mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio,carriles y cerraduras. | | | | | | | | | | | | | 8.364.233 | 8.364.233 | 8.364.233 |
| 195 | Vidrios templados de 10mm - paños fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio. | | | | | | | | | | | | | 26.732.000 | 26.732.000 | 26.732.000 |
| 196 | Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | | | | | | | | | | | | | 9.721.967 | 9.721.967 | 9.721.967 |
| 197 | Puerta de Acero (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | | | | | | | | | | | | | 1.559.333 | 1.559.333 | 1.559.333 |
| 198 | Puerta cortafuego - puerta de emergencia (incluye marco, contramarco, cerradura ,herraje y sistema de apertura y cierre antipánico) | | | | | | | | | | | | | 1.701.000 | 1.701.000 | 1.701.000 |
| 199 | Vallado malla plast 50x50x2.5 H= 2m | | | | | | | | | | | | | | 1.117.800 | 1.117.800 |
| 200 | Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio. | | | | | | | | | | | | 27.720.000 | 27.720.000 | 27.720.000 | |
| 201 | Mamparas divisorias de ambientes, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas y/o ciegas, de altura variable, con puerta de 0,80m, incluye cerraduras, herrajes, y zócalos para cableado. | | | | | | | | | | | | | | 16.402.500 | 16.402.500 |
| 202 | Desagüe Pluvial de Techo, incluye boquetas de Acero Galvanizado Chapa N° 20 - embebidas en la losa con diámetro de 150mm | | | | | | | | | | | | 3.888.000 | 3.888.000 | | |
| 203 | Desagüe Pluvial de Techo, de canaleta de Acero Galvanizado Chapa N° 24 - desarrollo 1m | | | | | | | | | | | | 33.048.000 | 33.048.000 | | |
| 204 | Desagüe Pluvial de Techo, incluye tubos de bajadas de PVC de 150mm, embudos, sujeciones, conexiones al sistema de drenaje, etc.) | | | | | | | | | | | | 3.420.000 | 3.420.000 | | |
| 205 | Desagüe Pluvial de Techo, incluye conexiones al sistema de drenaje con caños de PVC de 150mm, entre registros.) | | | | | | | | | | | | 4.560.000 | 4.560.000 | | |
| 206 | Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, incluye rejillas | | | | | | | | | | | | 5.920.100 | 5.920.100 | | |
| 207 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 40mm | | | | | | | | | | | | 456.000 | 456.000 | | |
| 208 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 75mm | | | | | | | | | | | | 91.250 | 91.250 | | |
| 209 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 100mm | | | | | | | | | | | | 9.609.600 | 9.609.600 | | |
| 210 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 200mm | | | | | | | | | | | | 18.930.600 | 18.930.600 | | |
| 211 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector colgado de PVC de 150mm | | | | | | | | | | | | 1.233.750 | 1.233.750 | | |
| 212 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de pozo de drenaje prefabricado. D= 1000mm | | | | | | | | | | | | 2.401.600 | 2.401.600 | | |
| 213 | Evacuación de aguas-Suministros e instalación de sifón de PVC | | | | | | | | | | | | 170.200 | 170.200 | | |
| 214 | Suministros e instalación de tapas reforzadas metálicas tipo rejilla, para canaletas colectoras (incluye pintura de protección) | | | | | | | | | | | | 3.555.000 | 3.555.000 | | |
| 215 | Provisión e instalación de Sistema de tratamiento (incluye todas las cañerías, codos, conexiones, llaves de paso, griferías y accesorios)- Según planos y | | | | | | | | | | | | | 185.362.200 | 185.362.200 | 185.362.200 |
| 216 | Provisión e instalación de Sistema de abastecimiento de agua (incluye todas las cañerías, codos, conexiones, llaves de paso, griferías y accesorios)- Según | | | | | | | | | | | | 106.544.200 | 106.544.200 | | |
| 217 | Desagüe Cloacal de sanitario ( incluye cañerías, rejillas de piso sifonadas) | | | | | | | | | | | | 498.200 | 498.200 | | |
| 218 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal) | | | | | | | | | | | | 2.446.600 | 2.446.600 | | |
| 219 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara séptica) | | | | | | | | | | | | 1.004.700 | 1.004.700 | | |
| 220 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de pozo absorbente) | | | | | | | | | | | | 1.425.150 | 1.425.150 | | |
| 221 | Provisión y colocación de inodoro | | | | | | | | | | | | | | 3.980.550 | 3.980.550 |
| 222 | Provisión y colocación de mingitorio | | | | | | | | | | | | | | 1.063.250 | 1.063.250 |
| 223 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal | | | | | | | | | | | | | | 5.078.700 | 5.078.700 |
| 224 | Provisión y colocación de cisterna alta | | | | | | | | | | | | | | 281.400 | 281.400 |

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Cristian Valdena J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

| Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
| 225 | Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoro | | | | | | | | | | | | | | 281.400 | 281.400 |
| 226 | Provisión y colocación de portarrollo | | | | | | | | | | | | | | 510.300 | 510.300 |
| 227 | Provisión y colocación de jabonera | | | | | | | | | | | | | | 534.600 | 534.600 |
| 228 | Provisión y colocación de espejos | | | | | | | | | | | | | | 1.670.900 | 1.670.900 |
| 229 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para lavatorios | | | | | | | | | | | | | | 2.896.300 | 2.896.300 |
| 230 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para mingitorios | | | | | | | | | | | | | | 658.250 | 658.250 |
| 231 | Provisión y colocación de griferías para ducha | | | | | | | | | | | | | | 2.326.100 | 2.326.100 |
| 232 | Provisión y colocación de llave de paso | | | | | | | | | | | | | 4.910.500 | 4.910.500 | |
| 233 | Provisión y colocación de tubería PVC presión de 1/2 | | | | | | | | | | | | | 7.525.000 | 7.525.000 | |
| 234 | Provisión y colocación de tubería PVC presión de 3/4 | | | | | | | | | | | | | 2.555.000 | 2.555.000 | |
| 235 | Provisión y colocación de ducha eléctrica (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | | | | | | | | | | | | | 510.300 | 510.300 | 510.300 |
| 236 | Provisión y colocación de ducha lava ojos (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, montaje sobre mesa,etc) | | | | | | | | | | | | | 567.067 | 567.067 | 567.067 |
| 237 | Provisión y colocación de termo calefón de 400lts (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | | | | | | | | | | | | | 6.682.100 | 6.682.100 | 6.682.100 |
| 238 | Provisión y colocación de plato ducha acrílico de 900x900mm. | | | | | | | | | | | | | | 1.913.800 | 1.913.800 |
| 239 | Provisión y colocación de placa identificatoria aseos/vestuario. | | | | | | | | | | | | | | | 2.187.000 |
| 240 | Provisión y colocación de bachas ovaladas de losa . incluye conexiones flexibles. | | | | | | | | | | | | | | 406.400 | 406.400 |
| 241 | Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable rígida . incluye conexiones flexibles | | | | | | | | | | | | | | 206.600 | 206.600 |
| 242 | Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,50m de ancho en baños ) | | | | | | | | | | | | | | 3.645.000 | 3.645.000 |
| 243 | Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños, color según muestra, de 15cm, en todos los lados requeridos | | | | | | | | | | | | | | 3.007.500 | 3.007.500 |
| 244 | Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños, color según muestra, de 10cm, en todos los lados requeridos | | | | | | | | | | | | | | 3.007.500 | 3.007.500 |
| 245 | Provisión y colocación de separadores de granito entre mingitorios, 0,50mx0,90m, color según muestra, incluye soportes. | | | | | | | | | | | | | | 729.000 | 729.000 |
| 246 | Provisión e instalación de Sistema de Tierra (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | 32.293.450 | 32.293.450 | | |
| 247 | Provisión e instalación de Alimentación a Tableros eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | 122.586.150 | 122.586.150 | | |
| 248 | Provisión e instalación de cajas con elementos de protección de circuitos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | | 39.547.233 | 39,547,233 | 39.547.233 |
| 249 | Provisión e instalación de cajas con elementos de alimentación a circuitos eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | | 170.082.033 | 170,082,033 | 170.082.033 |
| 250 | Provisión e instalación de mecanismo de encendido y tomas(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | | 18.300.000 | 18,300,000 | 18.300.000 |
| 251 | Provisión e instalación de bandejas para circuitos, alimentadores, señales(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | 57.195.800 | 57.195.800 | | |
| 252 | Provisión e instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos | | | | | | | | | | | | | | 8.420.000 | 8.420.000 |
| 253 | Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos | | | | | | | | | | | | | | 2.610.000 | 2.610.000 |
| 254 | Provisión e instalación: Equipo tipo spot de embutir, para lámparas de bajo | | | | | | | | | | | | | | 786.000 | 786.000 |
| 255 | Provisión e instalación de circuito con fotocélulas para iluminación externa. | | | | | | | | | | | | | | 1.171.500 | 1.171.500 |
| 256 | Construcción de registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso | | | | | | | | | | | | | | 1.117.000 | 1.117.000 |
| 257 | Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves ) | | | | | | | | | | | | | | 74.850 | 74.850 |
| 258 | Provisión y colocación de tapas ciegas rectangulares plásticas. | | | | | | | | | | | | | | 152.000 | 152.000 |
| 259 | Provisión y colocación de cañerías de 3/4 de reserva. | | | | | | | | | | | | | | 760.000 | 760.000 |
| 260 | Acometida Telefónica: 2 ductos de 1 para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares | | | | | | | | | | | | | | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 261 | Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 | | | | | | | | | | | | | | 220.100 | 220.100 |
| 262 | Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares. | | | | | | | | | | | | | | 68.400 | 68.400 |
| 263 | Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre. | | | | | | | | | | | | | | 84.300 | 84.300 |
| 264 | Provisión y colocación de Marco ampliación | | | | | | | | | | | | | | 18.250 | 18.250 |
| 265 | Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares | | | | | | | | | | | | | | 268.000 | 268.000 |
| 266 | Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac. | | | | | | | | | | | | | | 58.250 | 58.250 |
| 267 | Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10 | | | | | | | | | | | | | | 171.000 | 171.000 |
| 268 | Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido | | | | | | | | | | | | | | 380.000 | 380.000 |
| 269 | Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado) | | | | | | | | | | | | | | 824.250 | 824.250 |
| 270 | Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2 para alimentación de Swich en sala Técnica. | | | | | | | | | | | | | | 86.100 | 86.100 |
| 271 | Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Sala | | | | | | | | | | | | | | 279.600 | 279.600 |

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

Ing. Caspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

| Ítems del llamado LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo con ID: 377327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | 29-jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 |
| 272 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras) | | | | | | | | | | | | | | 824.250 | 824.250 |
| 273 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. | | | | | | | | | | | | | | 7.448.000 | 7.448.000 |
| 274 | Provisión e instalación de panel de Control Central | | | | | | | | | | | | | | 1.637.150 | 1.637.150 |
| 275 | Provisión e instalación de disyuntor diferencial en tablero | | | | | | | | | | | | | | 175.450 | 175.450 |
| 276 | Provisión e instalación de detector humo-calor | | | | | | | | | | | | | | 5.371.000 | 5.371.000 |
| 277 | Iluminación de Emergencia D-200 | | | | | | | | | | | | | | 700.500 | 700.500 |
| 278 | Extintor Polvo 113A/21B 6 kg. | | | | | | | | | | | | | | 2.712.600 | 2.712.600 |
| 279 | Señal Poliprop. 210x197 mm. Fotolum. | | | | | | | | | | | | | | 2.717.400 | 2.717.400 |
| 280 | Pulsador Alarma Fuego | | | | | | | | | | | | | | 840.600 | 840.600 |
| 281 | Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split | | | | | | | | | | | | | | 2.398.700 | 2.398.700 |
| 282 | Provisión e Inst. de aparatos de A°A° Split tipo Casette de 36.000 BTU | | | | | | | | | | | | | | 7.284.700 | 7.284.700 |
| 283 | Provisión e Inst. de aparatos de A°A° Split tipo Casette de 24.000 BTU | | | | | | | | | | | | | | 6.271.600 | 6.271.600 |
| 284 | 18.000 BTU (incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | | | | | | | | | | | | | | 17.439.500 | 17.439.500 |
| 285 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC Ø | | | | | | | | | | | | | | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 286 | Provisión e instalación de extractor de aire para sanitario | | | | | | | | | | | | | | 448.400 | 448.400 |
| 287 | Provisión e instalación de Aire comprimido (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | | | 2.930.550 | 2.930.550 |
| 288 | Provisión e instalación de Sistema de CCTV (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.) | | | | | | | | | | | | | | 67.354.300 | 67.354.300 |
| 289 | Extractores eólicos de techo. | | | | | | | | | | | | | | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 290 | Aplicación de Enduido Interior | | | | | | | | | | | 25.186.900 | 25.186.900 | | | |
| 291 | Pintura al látex lavable interior de paredes | | | | | | | | | | | | | 10.361.133 | 10.361.133 | 10.361.133 |
| 292 | Pintura al aceite lavable interior de paredes | | | | | | | | | | | | | 9.733.333 | 9.733.333 | 9.733.333 |
| 293 | Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos | | | | | | | | | | | | | 4.161.000 | 4.161.000 | 4.161.000 |
| 294 | Aplicación de pintura sintética en aberturas metálicas (previa aplicación de antióxido) | | | | | | | | | | | | | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| 295 | Aplicación de pintura sintética en canaletas y bajadas pluviales | | | | | | | | | | | | | 617.500 | 617.500 | 617.500 |
| 296 | Aplicación de pintura barniz marino en aberturas de madera | | | | | | | | | | | | | 727.500 | 727.500 | 727.500 |
| 297 | Pintura epóxica para Hormigón Pulido (piso), incluyendo canaletas colectoras y | | | | | | | | | | | | | 36.466.667 | 36.466.667 | 36.466.667 |
| 298 | Demolición de mampostería de 0.15m de ladrillos comunes | | | | | | | | | | | | | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 299 | Retiro de aberturas | | | | | | | | | | | | | 364.800 | 364.800 | 364.800 |
| 300 | Colocación de puertas recuperadas | | | | | | | | | | | | | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 301 | Provisión y colocación de ventanas metálicas | | | | | | | | | | | | | 1.225.400 | 1.225.400 | 1.225.400 |
| 302 | Cimiento de piedra bruta colocada | | | | | | | | | | | | | 5.559.400 | 5.559.400 | 5.559.400 |
| 303 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final | | | | | | | | | | | | | 607.467 | 607.467 | 607.467 |
| | **Monto Certificado Previsto por mes** | 66.018.000 | 763.549.133 | 334.278.633 | 416.374.608 | 618.739.142 | 323.749.808 | 814.735.742 | 880.056.800 | 532.952.033 | 753.748.200 | 858.355.189 | 792.853.689 | 1.723.941.733 | 1.463.196.533 | 1.102.165.333 |
| | **Monto Certificado Previsto Acumulado** | 66.018.000 | 829.567.133 | 1.163.845.767 | 1.580.220.375 | 2.198.959.517 | 2.522.709.325 | 3.337.445.067 | 4.217.501.867 | 4.750.453.900 | 5.504.202.100 | 6.362.557.289 | 7.155.410.978 | 8.879.352.712 | 10.342.549.245 | 11.444.714.578 |
| | **Monto Certificado** | 823.182.858 | 477.319.201 | 164.713.542 | 379.788.757 | 1.075.077.662 | 335.789.463 | 337.738.191 | 935.459.804 | | | | | | | |
| | **Monto Certificado Avance Acumulado** | 823.182.858 | 1.300.502.059 | 1.465.215.601 | 1.845.004.358 | 2.920.082.021 | 3.255.871.484 | 3.593.609.675 | 4.529.069.478 | | | | | | | |

FOI Fecha de Orden de Inicio

O.S. Periodo de Ejecucion Previsto

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal
CONSORCIO PC

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura
