GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: Diciembre - Enero - Febrero

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda - Plurianual con ID 435.864

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LOTE N° 1** - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram	100,00%	339.670.029	0,00%	0	13,20%	44.838.266	13,20%	44.838.266
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**339.670.029**	**1**	**0**	13,20%	**44.838.266**	13,20%	**44.838.266**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	67.934.006	0	8.967.653	8.967.653
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**67.934.006**	**0**	**8.967.653**	**8.967.653**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				35.870.613	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**35.870.613**	

Certificado Básico Nº 01

Mes: Diciembre - Enero - Febrero

Contrato N°: 31/2023

Monto Básico: 339. 670.029 gs

Contratista: Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta

Fecha de Inicio: 20/Diciembre/2023

Plazo de Ejecución: 120 dias

Fecha de Terminación: 18/Abril/2024

SON GUARANIES: Treinta y cinco millones ochocientos setenta mil seiscientos trece.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista

Itinera S.A.
RUC: 80072876-3

90

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda - Plurianual con ID 435.864

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 31/2023
MONTO DE LA OFERTA: 339. 670.029 gs	**PLAZO:** 120 dias
LOTE N°: 1	**FECHA DE MEDICIÓN:** 22/02/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Construcción de Empedrado - Tramo 1 - Calle Ñeembucú y calle Pedro Christophensen, long. 431,00ml - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	0,003	0%	100%	100%	0,000	0,003	0,003	0	1,00	1,00	0	1.183.175	1.183.175
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794	0,011	0%	100%	100%	0,000	0,011	0,011	0	1,00	1,00	0	3.782.794	3.782.794
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcacion	Metro lineal	441	7.175	3.164.175	0,009	0%	100%	100%	0,000	0,009	0,009	0	441	441	0	3.164.175	3.164.175
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. - de obra	Metros cúbicos	1.293	19.174	24.791.982	0,073	0%	100%	100%	0,000	0,073	0,073	0	1.293	1.293	0	24.791.982	24.791.982
5	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	431	33.756	14.548.836	0,043	0%	25,10%	25%	0,000	0,011	0,011	0	108	108	0	3.651.758	3.651.758
6	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra	Metros cúbicos	70	28.703	2.009.210	0,006	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
7	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	32.374	101.848.604	0,300	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
8	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	7.095	22.320.870	0,066	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
9	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	2.650	8.336.900	0,025	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
10	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	1,31	1.024.954	1.342.690	0,004	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
11	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	847,6	86.391	73.225.012	0,216	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
12	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	7,56	1.825.500	13.800.780	0,041	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
13	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.663	1.350	4.945.050	0,015	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
14	Construcción de Empedrado - Tramo 2 - Calle Paraguari entre Calle Chile y José L. Oviedo, long. 103,00ml -Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	0,003	0%	100%	100%	0,000	0,003	0,003	0	1	1	0	1.183.175	1.183.175
15	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	103	7.175	739.025	0,002	0%	100%	100%	0,000	0,002	0,002	0	103	103	0	739.025	739.025

Itinera S.A.
RUC: 80072876-3

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

16	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	310	19.174	5.943.940	0,017	0%	100%	100%	0,000	0,017	0,017	0	310	310	0	5.943.940	5.943.940
17	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	103	33.756	3.476.868	0,010	0%	11,45%	11,45%	0,000	0,001	0,001	0	11,80	11,80	0	398.242	398.242
18	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	61	28.703	1.750.883	0,005	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
19	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	32.374	24.312.874	0,072	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
20	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	7.095	5.328.345	0,016	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
21	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	2.650	1.990.150	0,006	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
22	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,65	1.024.954	666.220	0,002	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
23	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	206	86.391	17.796.546	0,052	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
24	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	875,5	1.350	1.181.925	0,003	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
					339.670.029	**100%**				**0,00%**	**13,20%**	**13,20%**				**0**	**44.838.266**	**44.838.266**

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

Contratista

Itinera S.A.

RUC: 80072876-3

.....

Fiscal de Obras

Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando C[illegible]gioni

Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

50

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda - Plurianual con ID 435.864

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 31/2023
MONTO DE LA OFERTA: 339. 670.029 gs	**PLAZO:** 120 dias
LOTE N°: 1	**FECHA DE MEDICIÓN:** 22/02/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 dias					TOTAL
LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta		DICIEMBRE 20/12/2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 18/04/2024	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**						
1	Construcción de Empedrado - Tramo 1 - Calle Ñeembucú y calle Pedro Christophensen, long. 431,00ml - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	1.183.175					100%
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización -Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794	3.782.794					100%
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcacion	Metro lineal	441	7.175	3.164.175		3.164.175				100%
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. - de obra	Metros cúbicos	1.293	19.174	24.791.982		24.791.982				100%
5	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	431	33.756	14.548.836		7.274.418	7.274.418			100%
6	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra	Metros cúbicos	70	28.703	2.009.210					2.009.210	100%
7	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	32.374	101.848.604				70.000.000	31.848.604	100%
8	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	7.095	22.320.870				22.320.870		100%
9	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	2.650	8.336.900				4.168.450	4.168.450	100%
10	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	1,31	1.024.954	1.342.690					1.342.690	100%
11	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	847,6	86.391	73.225.012			36.612.506	36.612.506		100%
12	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	7,56	1.825.500	13.800.780				13.800.780		100%
13	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.663	1.350	4.945.050					4.945.050	100%
14	Construcción de Empedrado - Tramo 2 - Calle Paraguari entre Calle Chile y José L. Oviedo, long. 103,00ml -Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	1.183.175					100%

Itinera S.A.
RUC: 80072876-3

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

15	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	103	7.175	739.025	739.025					100%
16	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	310	19.174	5.943.940		5.943.940				100%
17	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	103	33.756	3.476.868		3.476.868				100%
18	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	61	28.703	1.750.883					1.750.883	100%
19	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	32.374	24.312.874				24.312.874		100%
20	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	7.095	5.328.345				5.328.345		100%
21	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	2.650	1.990.150					1.990.150	100%
22	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,65	1.024.954	666.220					666.220	100%
23	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	206	86.391	17.796.546			8.898.273	8.898.273		100%
24	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	875,5	1.350	1.181.925					1.181.925	100%
					339.670.029						

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	6.888.169	44.651.383	52.785.197	185.442.098	49.903.182	**339.670.029**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	2,03%	13,15%	15,54%	54,59%	14,69%	**100%**

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

Contratista

Itinera S.A.

RUC: 80072876-9

.....

Fiscal de Obras

Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni

Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte

Gobernacion de Itapúa

80

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda - Plurianual con ID 435.864 - Lote N° 1

Contrato N°: 31/2023	
Monto del Contrato: 339. 670.029 gs	**Term. Prevista:** 18/Abril/2024
Plazo Contractual: 120 dias	**Prorrogas:**
Inicio de Obra: 20/Diciembre/2023	**Mes:** Diciembre - Enero - Febrero

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 31/2023

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DICIEMBRE	6.888.169	6.888.169	6.888.169	6.888.169	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
ENERO	44.651.383	51.539.552	20.889.707	27.777.876	13,15%	15,17%	6,15%	8,18%
FEBRERO	52.785.197	104.324.749	17.060.390	44.838.266	15,54%	30,71%	5,02%	13,20%
MARZO	185.442.098	289.766.847			54,59%	85,31%		
ABRIL	49.903.182	339.670.029			14,69%	100,00%		

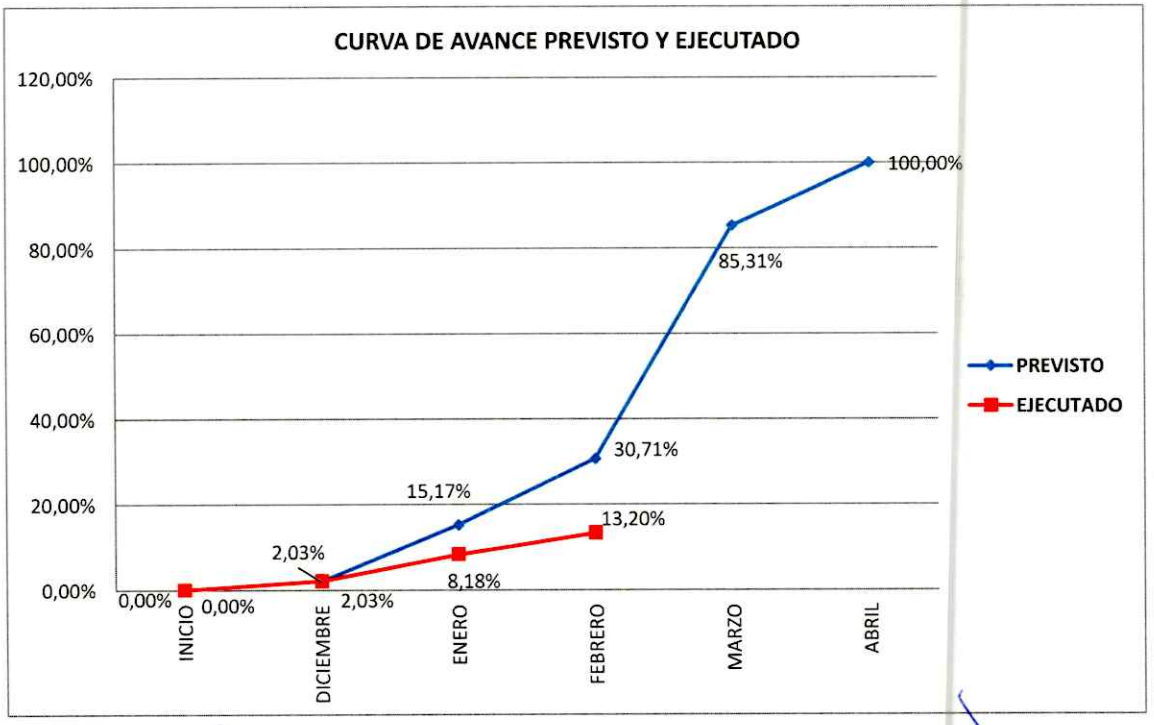

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
CONTRATISTA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Itinera S.A.
RUC: 80072876-9

06

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda - Plurianual con ID 435.864

LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.

BENEFICIARIO: Calle Ñeembucú y Pedro Christophensen - Calle Paraguarí e/ Chile y José L. Oviedo.

FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni

FECHA DE VISITA: 22/Febrero/2024

AVANCE DE OBRA: 13.20 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Ñeembucú y Pedro Christophensen - Calle Paraguarí e/ Chile y José L. Oviedo.	Fram	x1= 596744 – 7003228 x1= 596861 - 7002841	339. 670.029 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	31/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	18/Abril/2024	------

OBSERVACIONES GENERALES:

Se han ejecutado los trabajos de relevamiento topográfico y marcación, trabajos de movimientos de suelo, apertura de caja y terraplén.

A la fecha la obra se encuentra paralizada debido a que la empresa Ascent Ingeniería y Construcción están realizando trabajos de desagües cloacales en el lugar de la obra, imposibilitando la ejecución de los trabajos en el sitio de obra. La contratista ha presentado una solicitud de suspensión de plazo debido a dicha situación por la cual no se puede continuar la obra hasta la fecha.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

13

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
