TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC

CERTIFICADO DE OBRAS

EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
CONTRATO N° 21/2021
LPN N° 05/2021 - ID 388.700

ESCUELA BÁSICA Nº 679 GRAL. ANDRÉS A. DELMAS

ITEM DE CONTRATO	ITEMS UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	Precio UNITARIO IVA INCLUIDO	Precio total	Avance físico Anterior	Avance físico [illegible]	Avance físico Acumulado	Monto Certificado Anterior	Monto Certificado [illegible]	Monto Certificado Total
	1	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Global									
	1.1	**Preparación de la Obra**										
	1.1.1	Vallado perimetral protección de obras de... (madera/chapa)	m2	44,00	170.000	7.480.000	44,00	-	44,00	7.480.000	-	7.480.000
	1.2	**Remociones y otros**					-	-	-	-	-	-
	1.2.3	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	352,00	50.000	17.600.000	352,00	-	352,00	17.600.000	-	17.600.000
	1.10	**Techos**					-	-	-	-	-	-
	1.10.5	De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H° A°	m2	200,00	535.000	107.000.000	105,00	95,00	200,00	56.175.000	50.825.000	107.000.000
	1.10.7	Reparación de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	m2	152,00	250.000	38.000.000	152,00	-	152,00	38.000.000	-	38.000.000
	1.18	**Pinturas**					-	-	-	-	-	-
	1.18.1	De paredes revocadas al látex	m2	936,00	57.000	53.352.000	-	936,00	936,00	-	53.352.000	53.352.000
	1.18.9	De aberturas de madera con esmalte sintético	m2	32,00	70.000	2.240.000	-	32,00	32,00	-	2.240.000	2.240.000
	1.18.10	De abertura metálica con esmalte sintético	m2	82,00	70.000	5.740.000	-	82,00	82,00	-	5.740.000	5.740.000
	1.18.13	De tejuelón y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	m2	468,00	63.000	29.484.000	-	468,00	468,00	-	29.484.000	29.484.000
	1.42	**Limpieza**					-	-	-	-	-	-
	1.42.1	Limpieza final	m2	468,00	12.000	5.616.000	300,00	168,00	468,00	3.600.000	2.016.000	5.616.000
	1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	m3	20,00	40.000	800.000	10,00	10,00	20,00	400.000	400.000	800.000
						267.312.000				123.255.000	144.057.000	267.312.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible] R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel. (0[illegible]) 4[illegible]0 - 245

SENDERO S.A.
Carmelo Desv[illegible]s
Representante Legal

ESC. BÁS. Nº 679 GRAL. ANDRÉS DELMÁS (LAMBARÉ)

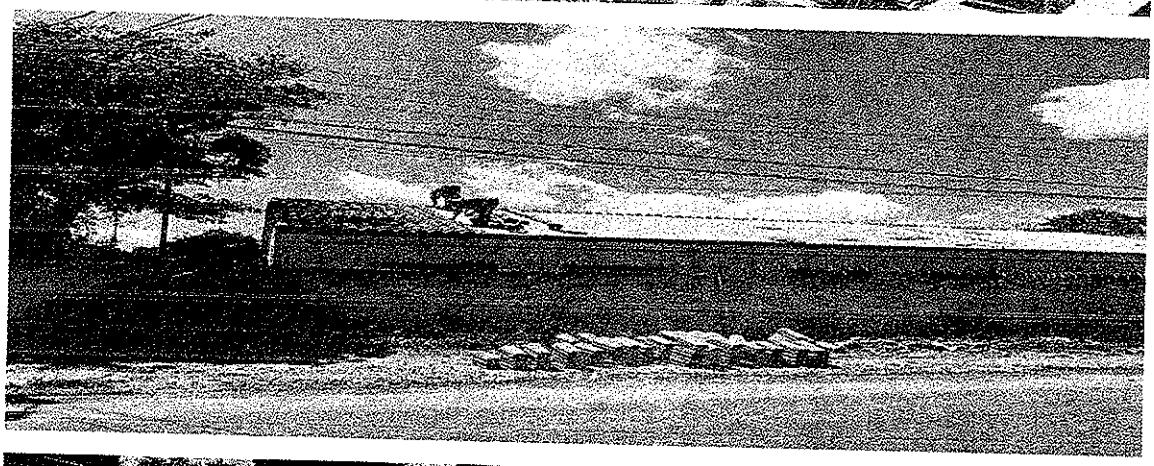

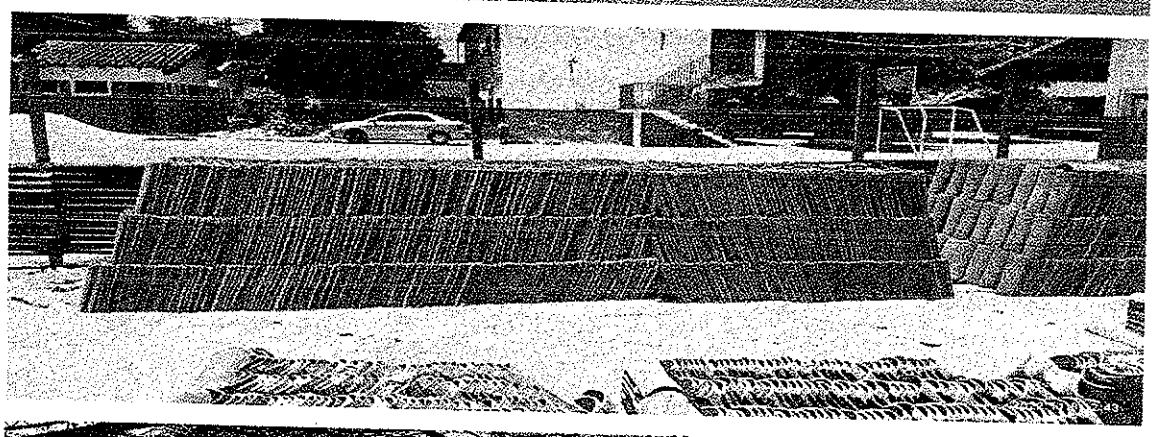

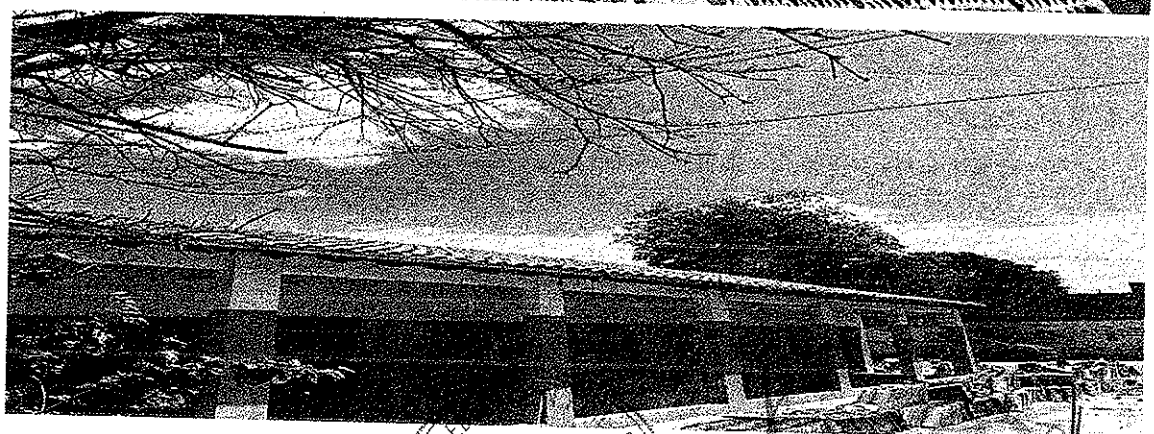

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura
SANDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

LPN N° 05/ 2021 ID N° 388.700 Contratista: SENDERO S.A

Establecimiento Escolar	**ESCUELA BAS N.º 679 GRAL. DE INF MIL. DON ANDRES A. DELMAS -**
Distrito – Localidad	LAMBARE – CENTRAL

10. DOCUMENTACIÓN y REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS DEL INICIO DE OBRAS: 04/10/2022- PLAZO 120 DIAS


TRABAJOS DE PINTURAS

ASPECTO FINAL . BLOQUE INTERVENIDO


PROCESO .

PROCESO


PROCESO .

PROCESO Y RESULTADO


PROCESO


TECHO : TIRANTES DE HORMIGON


PROCESO

FINAL : NUEVO ASPECTO

PROCESO : VALLADO DE PROTECCION


AULAS REPARADAS Y PINTADAS

FISCAL DE OBRAS
Dirección de Infraestructura

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura MEC
Cel.: (0982) 450 - 245

Elaborado por el Arq. Julio R. Elizeche

Revisado por la Lic. Gloria Candía
