GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 7
MES: MAYO 2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - ID: Nº 452.536 - LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI`Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ – CONTRATO N°38/2024.

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI`Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ	100%	1.271.303.400	63,09%	802.107.600	7,92%	100.685.800	71,01%	902.793.400
A	**Total por Contrato**	**100%**	**1.271.303.400**	**63,09%**	**802.107.600**	**7,92%**	**100.685.800**	**71,01%**	**902.793.400**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	254.260.680	160.421.520	20.137.160	180.558.680
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**254.260.680**	**160.421.520**	**20.137.160**	**180.558.680**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				80.548.640	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**80.548.640**	

Certificado Básico Nº	7
Mes:	MAYO 2025
Contrato N°:	38/2024
Monto Básico:	1.271.303.400
Contratista:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Fecha de Inicio:	15-nov-24
Plazo de Ejecución:	270 dias
Fecha de terminación prevista:	12-ago-25
Prórroga:	
Fecha de terminación con prórroga:	

SON GUARANÍES: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.I. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

ING. CUSTI ECKERT SILVERO
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICA
MES: MAYO 2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - ID: Nº 452.536 - LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI`Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ – CONTRATO N°38/2024.

CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	FECHA DE INICIO:	15-nov-24
MONTO DE LA OFERTA:	1.271.303.400	FECHA DE TERMINACION PREVISTA:	12-ago-25
CONTRATO N°:	38/2024	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270 días	FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - ID: Nº 452.536 - LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI`Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ – CONTRATO N°38/2024.							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	"Movilización de Obra (Despeje e instalación de campamento, cartel de obra, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	3.200.000	3.200.000	0,25%	100,00%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	1,00	0,00	1,00	3.200.000	0	3.200.000
2	"Excavación de Suelo. No clasificada	Metros cúbicos	220,00	55.000	12.100.000	0,95%	100,00%	0,00%	100,00%	0,95%	0,00%	0,95%	220,00	0,00	220,00	12.100.000	0	12.100.000
3	Excavación en Roca - Empleo de compresor y martillete	Metros cúbicos	30,00	700.000	21.000.000	1,65%	100,00%	0,00%	100,00%	1,65%	0,00%	1,65%	30,00	0,00	30,00	21.000.000	0	21.000.000
4	Hormigón de regularización fck: 250 kg/cm2 (para base de estribos y zapatas de hormigón armado)	Metros cúbicos	20,00	1.400.000	28.000.000	2,20%	100,00%	0,00%	100,00%	2,20%	0,00%	2,20%	20,00	0,00	20,00	28.000.000	0	28.000.000
5	Anclaje en roca con varillas de 25mm de diámetro, longitud 3m, relleno con epoxi	Unidad	45,00	350.000	15.750.000	1,24%	100,00%	0,00%	100,00%	1,24%	0,00%	1,24%	45,00	0,00	45,00	15.750.000	0	15.750.000
6	Zapatas de Hormigón Armado- Fundación directa (fck: 250 kg/cm2). Incluye viga de arriostre	Metros cúbicos	15,57	3.700.000	57.609.000	4,53%	100,00%	0,00%	100,00%	4,53%	0,00%	4,53%	15,57	0,00	15,57	57.609.000	0	57.609.000
7	Columnas de Hormigón Armado, D: 70 cm (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	2,31	4.500.000	10.395.000	0,82%	100,00%	0,00%	100,00%	0,82%	0,00%	0,82%	2,31	0,00	2,31	10.395.000	0	10.395.000
8	"Vigas Transversales de Hormigón Armado de apoyo de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	28,40	4.200.000	119.280.000	9,38%	0,00%	29,93%	29,93%	0,00%	2,81%	2,81%	0,00	8,50	8,50	0	35.700.000	35.700.000
9	Estribos cerrados de H°A° con losa de aproximación (fck: 250 kg/cm2). Incluye viga de apoyo ambos lados	Metros cúbicos	104,96	4.535.000	475.993.600	37,44%	100,00%	0,00%	100,00%	37,44%	0,00%	37,44%	104,96	0,00	104,96	475.993.600	0	475.993.600
10	Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	40,00	630.000	25.200.000	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Veredas de Hormigón Armado	Metro lineal	40,00	500.000	20.000.000	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	"Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	33,62	3.450.000	115.989.000	9,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Capa de desgaste según plano H° (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	9,60	1.700.000	16.320.000	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	"Vigas Longitudinales prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	24,00	5.500.000	132.000.000	10,38%	100,00%	0,00%	100,00%	10,38%	0,00%	10,38%	24,00	0,00	24,00	132.000.000	0	132.000.000
15	"Vigas Transversales de ariostre de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	5,89	4.200.000	24.738.000	1,95%	0,00%	67,91%	67,91%	0,00%	1,32%	1,32%	0,00	4,00	4,00	0	16.800.000	16.800.000
16	"Losetas de HºAº Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	132,00	300.000	39.600.000	3,11%	75,76%	0,00%	75,76%	2,36%	0,00%	2,36%	100,00	0,00	100,00	30.000.000	0	30.000.000
17	"Losetas de HºAº Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	88,00	150.000	13.200.000	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Apoyos Neoprenos s/planos. Incluye altar de Hormigón Armado.	Unidad	16,00	2.600.000	41.600.000	3,27%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	3,27%	3,27%	0,00	16,00	16,00	0	41.600.000	41.600.000
19	"Juntas de dilatación	Metro lineal	30,00	1.300.000	39.000.000	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	"Muros de P.B.C y Protección de Taludes	Metros cúbicos	33,44	700.000	23.408.000	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	"Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	38,37	340.000	13.045.800	1,03%	49,52%	50,48%	100,00%	0,51%	0,52%	1,03%	19,00	19,37	38,37	6.460.000	6.585.800	13.045.800
22	"Empastado de Taludes	Metros cuadrados	250,00	17.500	4.375.000	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	"Señalización Vertical del puente"	Unidad	2,00	1.050.000	2.100.000	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Mensulas de Hormigón Armado (fck: 250 kg/cm2)	Unidad	16,00	600.000	9.600.000	0,76%	100,00%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,76%	16,00	0,00	16,00	9.600.000	0	9.600.000
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400,00	19.500	7.800.000	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					1.271.303.400	100,00%				63,09%	7,92%	71,01%				802.107.600	100.685.800	902.793.400

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.I. 1053
Reg. AD.SG. N° 104/03

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

Fiscalización de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 7
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
MES: MAYO 2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - ID: Nº 452.536 - LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI'Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ – CONTRATO N°38/2024.			
CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	FECHA DE INICIO:	15-nov-24
MONTO DE LA OFERTA GS:	1.271.303.400	FECHA DE TERMINACION PREVISTA:	12-ago-25
CONTRATO N°:	38/2024	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270 dias	FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - ID: Nº 452.536 - LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI'Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ – CONTRATO N°38/2024.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PLAZO DE EJECUCIÓN nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	TOTAL
1	"Movilización de Obra (Despeje e instalación de campamento, cartel de obra, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	3.200.000	3.200.000	3.200.000										3.200.000
2	"Excavación de Suelo. No clasificada	Metros cúbicos	220,00	55.000	12.100.000		12.100.000									12.100.000
3	Excavación en Roca - Empleo de compresor y martillete	Metros cúbicos	30,00	700.000	21.000.000		21.000.000									21.000.000
4	Hormigón de regularización fck: 250 kg/cm2 (para base de estribos y zapatas de hormigón armado)	Metros cúbicos	20,00	1.400.000	28.000.000			28.000.000								28.000.000
5	Anclaje en roca con varillas de 25mm de diámetro, longitud 3m, relleno con epoxi	Unidad	45,00	350.000	15.750.000			15.750.000								15.750.000
6	Zapatas de Hormigón Armado- Fundación directa (fck: 250 kg/cm2). Incluye viga de arriostre	Metros cúbicos	15,57	3.700.000	57.609.000			57.609.000								57.609.000
7	Columnas de Hormigón Armado, D: 70 cm (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	2,31	4.500.000	10.395.000				10.395.000							10.395.000
8	"Vigas Transversales de Hormigón Armado de apoyo de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	28,40	4.200.000	119.280.000				59.640.000	59.640.000						119.280.000
9	Estribos cerrados de H°A° con losa de aproximación (fck: 250 kg/cm2). Incluye viga de apoyo ambos lados	Metros cúbicos	104,96	4.535.000	475.993.600					95.198.720	190.397.440	190.397.440				475.993.600
10	Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	40,00	630.000	25.200.000								25.200.000			25.200.000
11	Veredas de Hormigón Armado	Metro lineal	40,00	500.000	20.000.000								20.000.000			20.000.000
12	"Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	33,62	3.450.000	115.989.000								81.192.300	34.796.700		115.989.000
13	Capa de desgaste según plano H° (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	9,60	1.700.000	16.320.000								16.320.000			16.320.000
14	"Vigas Longitudinales prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	24,00	5.500.000	132.000.000									132.000.000		132.000.000
15	"Vigas Transversales de ariostre de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	5,89	4.200.000	24.738.000									24.738.000		24.738.000
16	"Losetas de HºAº Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	132,00	300.000	39.600.000										39.600.000	39.600.000
17	"Losetas de HºAº Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	88,00	150.000	13.200.000										13.200.000	13.200.000
18	Apoyos Neoprenos s/planos. Incluye altar de Hormigón Armado.	Unidad	16,00	2.600.000	41.600.000										41.600.000	41.600.000
19	"Juntas de dilatación	Metro lineal	30,00	1.300.000	39.000.000										39.000.000	39.000.000
20	"Muros de P.B.C y Protección de Taludes	Metros cúbicos	33,44	700.000	23.408.000										23.408.000	23.408.000
21	"Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	38,37	340.000	13.045.800										13.045.800	13.045.800
22	"Empastado de Taludes	Metros cuadrados	250,00	17.500	4.375.000										4.375.000	4.375.000
23	"Señalización Vertical del puente"	Unidad	2,00	1.050.000	2.100.000										2.100.000	2.100.000
24	Mensulas de Hormigón Armado (fck: 250 kg/cm2)	Unidad	16,00	600.000	9.600.000										9.600.000	9.600.000
25	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400,00	19.500	7.800.000										7.800.000	7.800.000
TOTAL EN GUARANIES					1.271.303.400											
AVANCE PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						3.200.000	33.100.000	101.359.000	70.035.000	155.838.720	190.397.440	190.397.440	142.712.300	191.534.700	193.728.800	1.271.303.400
AVANCE PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						0,25%	2,60%	7,97%	5,51%	12,18%	14,98%	14,98%	11,23%	15,07%	15,24%	100,00%

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AG.SG. N° 164/03

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Amarilla
Dpto. Obras Públicas

GOBERNACION DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 7
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: MAYO 2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2024 - ID: Nº 452.536 - LOTE Nº4: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI`Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETÁ – CONTRATO N°38/2024.

Contrato N°: 38/2024			
Monto del Contrato:	1.271.303.400	**Fecha de terminación prevista:**	12-ago-25
Plazo Contractual:	270 dias	**Prórroga:**	
Inicio de Obra:	15-nov-24	**Fecha de terminación con prórroga:**	

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Inicio	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
nov-24	3.200.000	3.200.000	51.380.000	51.380.000	0,25%	0,25%	4,04%	4,04%
dic-24	33.100.000	36.300.000	258.646.188	310.026.188	2,60%	2,86%	20,34%	24,39%
ene-25	101.359.000	137.659.000	95.812.000	405.838.188	7,97%	10,83%	7,54%	31,92%
feb-25	70.035.000	207.694.000	169.620.812	575.459.000	5,51%	16,34%	13,34%	45,27%
mar-25	154.838.720	362.532.720	85.425.000	660.884.000	12,18%	28,52%	6,72%	51,98%
abr-25	190.397.440	552.930.160	141.223.600	802.107.600	14,98%	43,49%	11,11%	63,09%
may-25	190.397.440	743.327.600	100.685.800	902.793.400	14,98%	58,47%	7,92%	71,01%
jun-25	142.712.300	886.039.900			11,23%	69,70%		
jul-25	191.534.700	1.077.574.600			15,07%	84,76%		
ago-25	193.728.800	1.271.303.400			15,24%	100,00%		

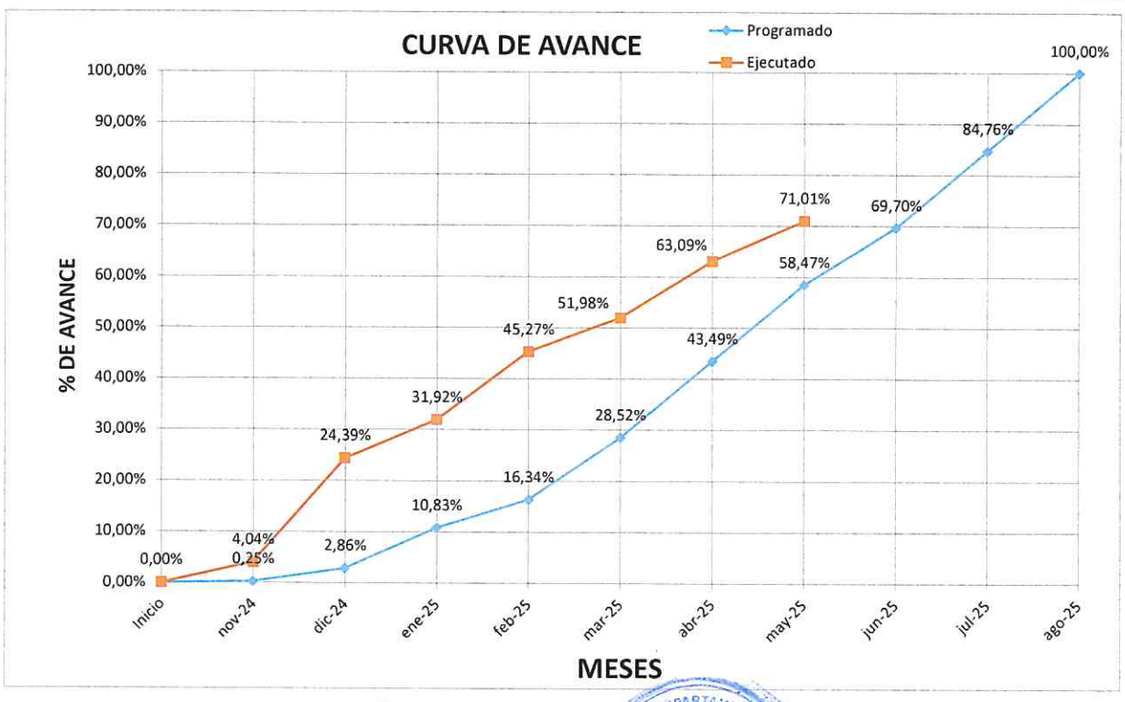

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. V.B.SG. N° 154/03

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación

5
