Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 14 de Diciembre del 2022

Señor
Director General de Administración y Finanzas
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Lic. Carlos Morel

Presente

Ref: Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 – Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas", ID N° 415.978 – Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en Territorios con Mayor Índice de Pobreza a Nivel Nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".-

Me dirijo a usted con el objeto solicitar el Pago del Certificado de Obra N° 01 correspondiente al Lote Nro 2 - Iturbe del Contrato de Referencia, cuyo monto asciende a Gs. 101.999.368 Guaraníes Ciento un millones novecientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y ocho.-

Además presentamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0001253.
- Certificados de Obra y Acta de Medición en 3 Originales.-
- Certificado de Cumpliendo Tributario
- Reportes FIP y FIS
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social

Ing. Mario R. Ibarrola A.
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 390
Proceso: — Fecha: 14-12-2022
Entregado por: Lidia Barrios
Hora: 10:08 Recibido por: Decia Ovelar

Mario Raúl Ibarrola Adorno

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Adela Speratti c/ República Francesa N° 1689
Depto. Planta Baja - Tel.: (021) 222 552
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16016326
RUC: 430285 - 0
Inicio de Vigencia: 11 de Noviembre de 2022
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2023

FACTURA

No. 001-001 0001253

Fecha de Emisión: 14/12/2022 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Secretaria Nacional de Cultura

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°.: 80050610-3 Nota de Remisión N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Pago Certificado Nº 01, Contrato				
	Nº 01/2022 - Licitación por Concurso				
	de Ofertas Nº 01/2022, Lote Nro 2				
	Eturbe				101.999.368
SUB TOTAL					101.999.368

TOTAL A PAGAR: Ciento un millones novecientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y ocho. 101.999.368

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) — (10 %) 9.272.670 TOTAL DE IVA: 9.272.670

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.366
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-001 - 1.251 al 1.350 - Nov. / 22.

ORIGINAL: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 Periodo: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						Porcentaje %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72102508-001	PISO	Unidad	1		**20.856.625**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.1		Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	17.768	3.284.415	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	21.615	1.080.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	52.837	422.696	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	43.507	2.175.350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	73.294	3.664.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas.	Metros cuadrados	185	16.185	2.994.225	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.7		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	30,8	45.601	1.404.511	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.8		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.	Metros cuadrados	30,8	189.285	5.829.978	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1		**17.909.527**				**0**	**7.512.964**	**7.512.964**	**41,95%**
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	85.181	12.521.607	0,00	88,20	88,20	0	7.512.964	7.512.964	60,00%
2.2		Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad	Metros lineales	0	40.816	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	86.021	1.720.420	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
2.4		Arreglo de fisuras en muros	Metros lineales	45	81.500	3.667.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1		**204.283.366**				**0**	**94.495.037**	**94.495.037**	**46,26%**
3.1		Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	240	11.329	2.718.960	0,00	240,00	240,00	0	2.718.960	2.718.960	100,00%
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	240	39.041	9.369.840	0,00	120,00	120,00	0	4.684.920	4.684.920	50,00%
3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	148	15.483	2.291.484	0,00	148,00	148,00	0	2.291.484	2.291.484	100,00%
3.4		Provisión y Colocacion de chapas en los aleros	Metros cuadrados	148	179.589	26.579.172	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	1.703.611	3.407.222	0,00	1,00	1,00	0	1.703.611	1.703.611	50,00%
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	1.169.484	2.338.968	0,00	1,00	1,00	0	1.169.484	1.169.484	50,00%
3.7		Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	0	715.490	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.8		Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	116	162.876	18.893.616	0,00	17,60	17,60	0	2.866.618	2.866.618	15,17%
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	16.743	8.371.500	0,00	100,00	100,00	0	1.674.300	1.674.300	20,00%
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion	Metros cuadrados	180	39.426	7.096.680	0,00	90,00	90,00	0	3.548.340	3.548.340	50,00%
3.11		Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	60	148.845	8.930.700	0,00	40,00	40,00	0	5.953.800	5.953.800	66,67%
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	192	32.015	6.146.880	0,00	96,00	96,00	0	3.073.440	3.073.440	50,00%
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	48	31.233	1.499.184	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	240	129.486	31.076.640	0,00	120,00	120,00	0	15.538.320	15.538.320	50,00%
3.15		Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	240	101.298	24.311.520	0,00	120,00	120,00	0	12.155.760	12.155.760	50,00%
3.16		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m	Unidad	2	7.113.000	14.226.000	0,00	2,00	2,00	0	14.226.000	14.226.000	100,00%
3.17		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m	Unidad	1	4.620.000	4.620.000	0,00	1,00	1,00	0	4.620.000	4.620.000	100,00%
3.18		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m	Unidad	10	3.045.000	30.450.000	0,00	6,00	6,00	0	18.270.000	18.270.000	60,00%
3.19		Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m	Unidad	1	1.955.000	1.955.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1		**26.052.225**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Ing. Mario A. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Sumudio
Dirección de Proyectos y Obras

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	30	123.487	3.704.610	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	159.183	9.550.980	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	159.183	4.775.490	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	25	159.183	3.979.575	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED	Unidad	15	269.438	4.041.570	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1		**17.886.486**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	156.899	17.886.486	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1		**48.423.785**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	38.279	13.589.045	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	38.279	8.038.590	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	240	43.846	10.523.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir	Metros cuadrados	140	30.066	4.209.240	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	44.681	10.187.268	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	44.681	1.876.602	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	40.378.702	**40.378.702**	0,00	0,60	0,60	**0**	**24.227.221**	**24.227.221**	**60,00%**
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	2.527.975	**2.527.975**	0,00	0,50	0,50	**0**	**1.263.988**	**1.263.988**	**50,00%**
				Precio Total		378.318.691			**Total Certificado**		127.499.210	127.499.210	**33,70%**
				Anticipo		68.583.540			**Descuento Anticipo 20%**		25.499.842	25.499.842	**37,18%**
									Saldo a Cobrar		101.999.368	101.999.368	

Son Guaranies: Ciento un millones novecientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y ocho.-

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

ACTA DE MEDICION Nº 01 **Periodo: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022**

LOTE NRO: 2 - ITURBE

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01		CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72102508-001	PISO	Unidad	1				
1.1		Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas.	Metros cuadrados	185	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	30,8	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.	Metros cuadrados	30,8	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1				
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	0,00	88,20	88,20	60,00%
2.2		Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad	Metros lineales	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4		Arreglo de fisuras en muros	Metros lineales	45	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1				
3.1		Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	240	0,00	240,00	240,00	100,00%
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	240	0,00	120,00	120,00	50,00%
3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	148	0,00	148,00	148,00	100,00%
3.4		Provisión y Colocacion de chapas en los aleros	Metros cuadrados	148	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	0,00	1,00	1,00	50,00%
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	0,00	1,00	1,00	50,00%
3.7		Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.8		Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	116	0,00	17,60	17,60	15,17%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Carlos C. González Zelada
Arquitecto

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras

			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	0,00	100,00	100,00	20,00%
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion	Metros cuadrados	180	0,00	90,00	90,00	50,00%
3.11		Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	60	0,00	40,00	40,00	66,67%
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	192	0,00	96,00	96,00	50,00%
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	48	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	240	0,00	120,00	120,00	50,00%
3.15		Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	240	0,00	120,00	120,00	50,00%
3.16		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m	Unidad	2	0,00	2,00	2,00	100,00%
3.17		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m	Unidad	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
3.18		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m	Unidad	10	0,00	6,00	6,00	60,00%
3.19		Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1				
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	25	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED	Unidad	15	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1				
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1				
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	240	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir	Metros cuadrados	140	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	0,00	0,60	0,60	60,00%
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	0,00	0,50	0,50	50,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Ing. Mario Raul Ibarrola Adono
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

RESIDENTE DE OBRAS
Carlos C. Gonzalez Zelada
Arquitecto

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CURVA DE INVERSION - Periodo: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022

MONTO CONTRATO + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 Gs:	**378.318.691**

		Inicio	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias
PROYECTADO	Porcentaje %	0,00	19,93%	39,47%	73,91%	90,40%	100,00%
	Valores Gs.	0	75.398.915	149.322.387	378.318.692	342.000.097	378.318.691
EJECUTADO	Porcentaje %	0,00	33,70%				
	Valores Gs.	0	127.499.210				

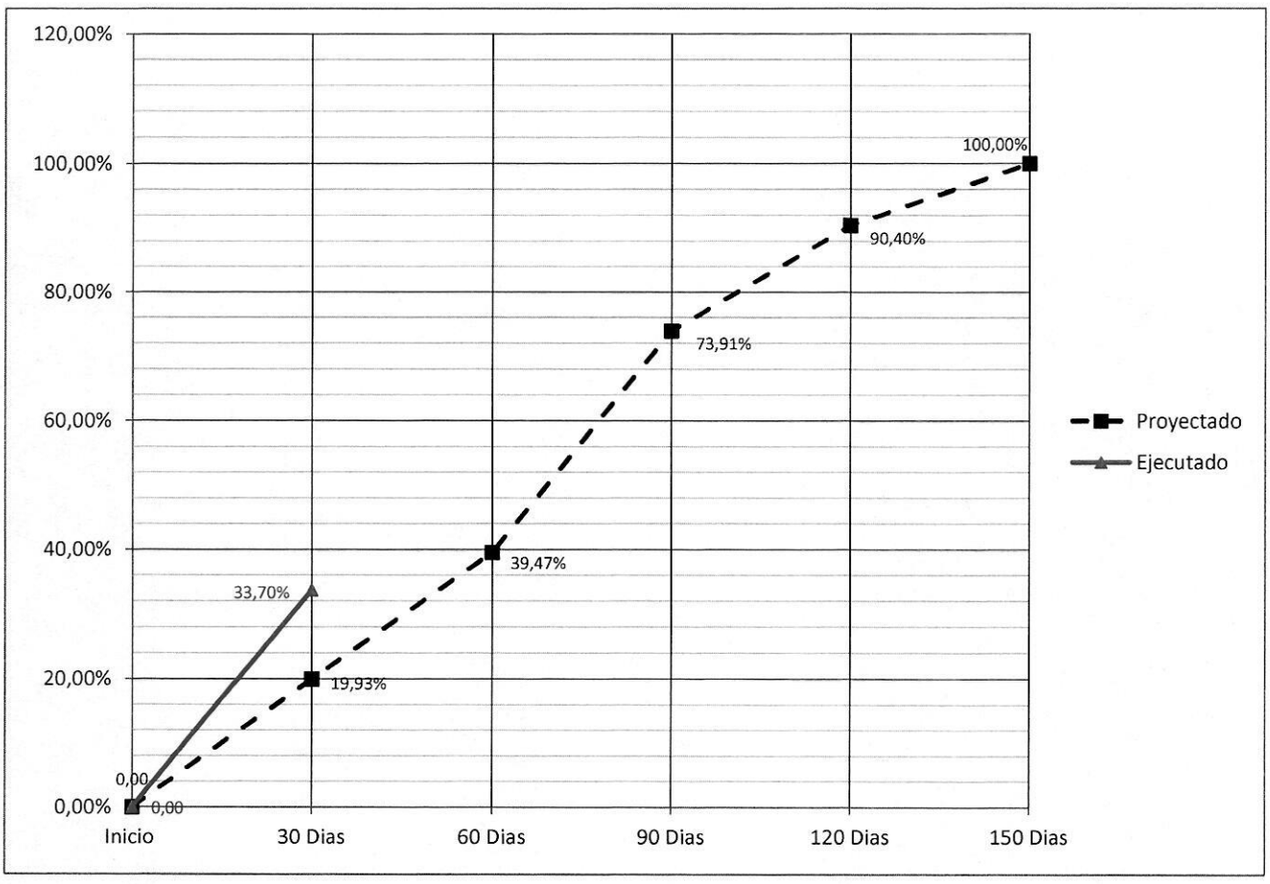

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRA
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Lote 4180018562 , Cons.: 1

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270146425826

FECHA 12/12/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	430285	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/01/2023 NÚMERO DE CONTROL : 88C40863

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271430285888C40863

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Gustavo Bernardo Lopez Gonzalez [2300073-430285] - Proveedor

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 415978

Llamado: Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	4492994	Activo	
SIMONA	LOPEZ SILVA	1857999	Activo	
Ruben Antonio	Duarte Martinez	1436444	Activo	
Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	2300073	Activo	
NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	937306	Activo	

Nuevo Formulario de Identificación del Personal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

RUC

430285-0

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 415978 / Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

528.571.154

Año: 2022 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	Cumplio	3200000	Contratista	Activo
2	SIMONA	LOPEZ SILVA	Cumplio	1765602	Contratista	Activo
3	NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	Cumplio	0	Contratista	Activo
4	Ruben Antonio	Duarte Martinez	Cumplio	4500000	Contratista	Activo
5	Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	Cumplio	3000000	Contratista	Activo

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Usuario Impresión: 2300073-430285

Fecha Impresión: 14/12/2022

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 430285

NRO. CERTIFICADO: 362742

FECHA EMISION: 16-11-2022

VENCIMIENTO: 20-12-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 430285

Nro. Certificado: 362742

Razon Social: IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-1997

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0004-40-0356 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
