24 (veinticuatro)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

ACTA DE MEDICIÓN

Municipalidad de Asunción

CERTIFICADO Nº 01 MES DE ENERO

En la ciudad de Asuncion, a los 31 días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte el Ing. Ivan Cañete, representante de la Fiscalización, y por la otra parte Ing. Oscar Rubiani, Representante Legal de la Empresa Contratista Construcciones y viviendas Paraguayas S.A, a los efectos de labrar el presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados hasta el 31 de enero del 2024, en la obra ; CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID 421421, según CONTRATO UOC3 N° 05/2023 suscripto en fecha 30 de octubre del 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS - ENERO 2024

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
2	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	109,34
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	324,64
4	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	226,35

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Fiscalización
Municipalidad de Asuncion

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO : 021-215 081	"CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO" -LOTE 1 - ID: 421.421	CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 01 MES Y AÑO: ENERO/2024

Contrato UOC3 Nº: 05/2023		Orden de Inicio: 29/12/2023	
Fecha de Contrato:	30/10/2023	Plazo Contractual: 180 dias	
Monto de los trabajos:	7.000.000.000		
Fondo de Difusión:		Fondo de Reparo 5%:	350.000.000
Monto del Contrato:	7.000.000.000		

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	3,90%	3,90%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC.	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
1	Excavación en tosca	Metros cúbicos	1,00			0,00	90.695	-	-	-
2	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	1,00		109,34	109,34	35.012	-	3.828.212	3.828.212
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	1,00		324,64	324,64	778.173	-	252.626.083	252.626.083
4	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1,00		226,35	226,35	73.822	-	16.709.610	16.709.610
5	Gaviones	Metros cúbicos	1,00			0,00	996.117	-	-	-
6	Colchones Reno	Metros cuadrados	1,00			0,00	312.305	-	-	-
7	Hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	1,00			0,00	945.600	-	-	-
8	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	1,00			0,00	2.331.330	-	-	-
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1,00			0,00	93.330	-	-	-
10	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	1,00			0,00	695.874	-	-	-
11	Baranda de protección prefabricada de hormigon armado	Metros	1,00			0,00	119.748	-	-	-
12	Baranda de protección de caño	Metros	1,00			0,00	345.666	-	-	-
TOTAL GENERAL								0	273.163.905	273.163.905

.....
Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

.....
Fiscalización
Municipalidad de Asuncion

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

25 (veinticinco)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS						
	"CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO" -LOTE 1 - ID: 421.421					CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 01 MES Y AÑO: ENERO/2024	
	Contrato UOC3 Nº: 05/2023 Fecha de Contrato: 30/10/2023 Contrato principal 7.000.000.000 Convenio Modificarorio N° 1 0 Monto total 7.000.000.000			Orden de Inicio: 29/12/2023 Plazo Contractual: 180 dias Fondo de Reparo 5%: 350.000.000			
DESCRIPCION	Monto del Contrato:	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO - LOTE 1	7.000.000.000	0,00%	0	3,90%	273.163.905	3,90%	273.163.905
TOTALES	7.000.000.000						273.163.905

	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICAC. ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
a - Monto total de los trabajos	7.000.000.000		273.163.905	273.163.905
b - Devolucion de Anticipo 20%	1.400.000.000		54.632.781	54.632.781
c - Fondo de Reparo 5%	350.000.000		13.658.195	13.658.195
SALDO NETO	5.250.000.000	0	204.872.929	204.872.929

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Ivan Cañete
Obras
de Obras Municipales

26 (veinte y seis)

27 (veinti siete)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	"CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO" -LOTE 1 - ID: 421.421	
	Contrato UOC3 Nº: 05/2023	
	Fecha de Contrato: Monto total Gs.	30/10/2023 7.000.000.000
	CERTIFICADO Nº 01	
a		Guaranies
a.1	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	273.163.905
a.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
a.3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	273.163.905
	MONTO CONTRACTUAL	7.000.000.000
b	DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
b.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	273.163.905
b.2	REAJUSTE DEL MES	0
b.3	SUB TOTAL	273.163.905
b.4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL PRESENTE MES	54.632.781
b.5	RETENCION DE FONDO DE REPAROS	13.658.195
b.6	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
b.7	MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	218.531.124
c	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
c.1	ANTICIPO	
c.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1.400.000.000
c.1.b	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0
c.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	54.632.781
c.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	54.632.781
c.1.e	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.345.367.219
c.2	REAJUSTE DE PRECIOS	
c.2.a	REAJUSTE DEL MES	0
c.2.b	REAJUSTE ACUMULADO AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.2.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.3	RETENCION DEL FONDO DE REPARO	350.000.000
c.3.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	13.658.195
c.3.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.3.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	13.658.195
c.4	FISCALIZACION, RECEPCION, VERIFICACION DE COSTO Y CERTIFICADO DE OBRAS	
c.4.a	DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.4.b	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4.c	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5	RESUMEN	
c.5.a	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	273.163.905
c.5.b	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.345.367.219
c.5.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.d	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	13.658.195
c.5.e	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.f	MONTO DEVENGADO A LA FECHA	1.604.872.929

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

28 (veintiocho)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

FOTOS MES ENERO - "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO " - ID: 421.421

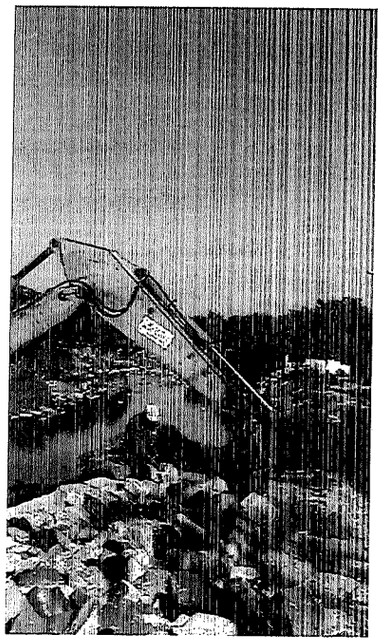

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

2a Continuación

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A

Municipalidad de Asunción

FOTOS MES ENERO - "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO " - ID: 421.421

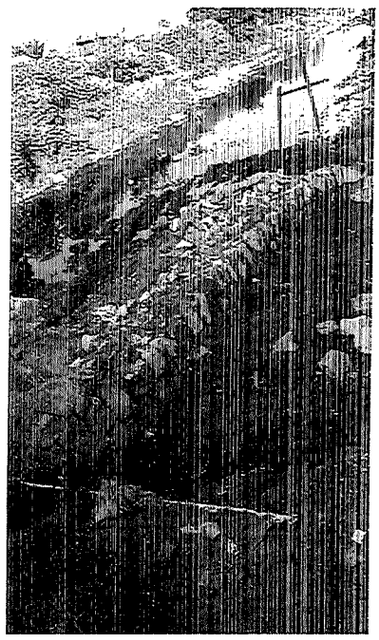






Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

30 (Treinta)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

FOTOS MES ENERO - "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO " - ID: 421.421

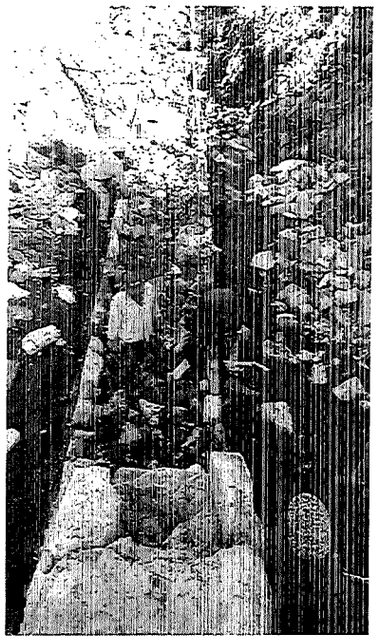

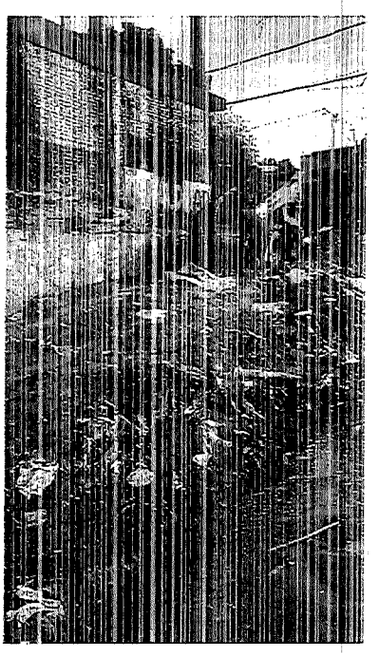


Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Copia.

Municipalidad de Asunción

Municipalidad de Asunción

Usuario CARLOS PAREDES
Fecha 07/03/24
Hora 08:32:25

Expediente

Número	Año
10896	2024

Fecha Creación 07/03/2024
Grupo EGRESOS
SubGrupo PAGOS
Tipo PAGO A PROVEEDORES-SERVICIOS

Asunto PAGO A PROVEEDORES

Certificado: 1

Información Complementaria

Datos del titular

Nombre COVIPA
Telefono 021215.081/4
Documentos
RUC 80012708-0
Direcciones
Domicilio gral.andrada 779
Loc, Dpto asuncion, CENTRAL

Datos del compareciente

Nombre CINDY LORENA TAMAYO OCAMPOS
Dirección GRAL ANDRADA N°779 C/BRUNO GUGGGIARI
Telefono 021-215.081
Mail

RECIBIDO HOY
Fecha: 07 MAR 2024
Hora:
GEO_EXPEDIENTES
DPTO. PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección de Gastos Municipales
RECIBIDO: ...
FECHA: 18 ABR 2024
HORA: 12:25

1 (uno)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y
VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Nota Nº 01-2024
Asunción, 05 de Marzo del 2024.

Señores:
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Presente

Ref.: Contrato N° 05/2023 "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 421.421

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar le pago del Certificado N° 1, correspondiente al periodo Enero del 2024.
El monto a ser pagado es de 218.531.124 Gs. (Doscientos dieciocho millones quinientos treinta y uno mil ciento veinticuatro.-) IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N° 1 (Enero/2024)
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 421.421
Contratista	Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.
Monto Contrato	Gs 7.000.000.000
% de Avance Físico Financiero	
Fecha de Contrato	30 de octubre del 2023
Plazo de ejecución Original	180 días
Orden de Inicio	29 de diciembre del 2023

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

MESA DE ENTRADA
O.S.A.P.
Hora: 09:40 Fecha: 07 MAR 2024

10 (Diez)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.-

LIBRO DE OBRA

00000050

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

ALCIDES ARAMDOVAL
ESCRIBANO PUBLICO
Tel. 207.210 - 333.421
Sajonia 1578 - Lambaré

De: ..... A: .....

Fecha: 08 / 01 / 2024 Estado de tiempo: .....

Asunto: ORDEN DE INICIO - INICIO DE LOS TRABAJOS

Anexos: .....

En la ciudad de Asunción en fecha 08/01/2024 se recibe la orden de inicio de la obra "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN".

El computo del plazo inicia el 08/01/2024.

Se habilita este libro de obra TOMO 1 desde la numeración 00050 al 00060 como medio de comunicación ej el contratista y la Fiscalización

El libro queda bajo custodia de la contratista a libre disponibilidad de las partes.

ORDEN DE INICIO Nº 22/2023/DGO-DOM
ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2024

Recibido por: Ivan D. Cañete C. Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Ing. Cindy Tamayo COVIPA S.A. Fecha: ...../...../.....

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

11 (once)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

N° 0000051

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO ND: 421421

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ESCRIBANO PÚBLICA Nº 15 - Lambaré

De: Contratista A:

Fecha: 09 / 01 / 2024 Estado de Tiempo:

Asunto: INICIO DELOS TRABAJOS

29/01/2024 inicio general + 10 días Movilización

Anexos: 8/01/2024 inicio de la 1era orden de servicio. N°: 01/2024

- ARROYO LAMBARE:

Ejecución de la excavación según plano recibido para ejecución y se coloca la piedra de base.

"base 1m por debajo del lecho de agua"

- ARROYO FERREIRA = (TRAMO 1)

Se inicia los trabajos de excavación y la elevación del muro de base.

Diseño del muro 0,8 de base ; 0,8 de coronamiento y altura variable.

10/01/2024

Sin Actividad por lluvia.

11/01/2024

Sin actividad por lluvia.

Recibido por: Ivan D. Cañete. L Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Cindy Tamayo Ing. Cindy Tamayo COVIPA S.A. Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

12 (DOCE)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000052

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 12 / 01 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Continuamos con los trabajos de elevación de base y muro en ambos arroyos.
sección del arroyo Lambaré base 1,80 x 1 x X, muro 3,20 x 1,60 - 0,8 x X
sección del Tramo 1 de Ferrera 0,8 x 0,30 x X.

13/01/2024

Idem al día anterior + colocación de cajas con geotextil.

14/01/2024

Sin Actividad por Domingo.

15/01/2024

Sin Actividad por lluvia.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
AIDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. No 787
Tel. 207-210 - 333-151
Saconia 1578 - Lambaré

Recibido por: Juan D. Cañete C. Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Ing. Cindy Tamayo COVIPA S.A. Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

B (TRECE)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000053

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 16 / 01 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Seguimos con las mismas actividades en ambos arroyos Lambare y Ferreira; excavación y elevación del muro de contención.

del 17 al 20 /01/ 2024

Idem al día anterior.

21/01/2024

Sin Actividad por lluvia.

22/01/2024

continuamos con los trabajos de muro en ambos arroyos.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONCEPT
ALIDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Tel. 207.210 - 333.151
Sajonia 1575 - Lambaré

Recibido por: Ivan D. Cañete L. Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Ing. Cindy Tamayo COVIPA S.A. Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

14 (Cuatorce)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

000005

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 23 / 01 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE:
AIDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Tel.: 207.210 - 333.151
Sajonia 1576 - Lambaré

Lamentamos informar que por fuerza mayor tuvimos que suspender las actividades en ambos arroyos. ya que hemos sufrido un robo de todos los equipos menores en el arroyo Lambaré y el personal se retira por no tener garantía en el trabajo y es una perdida para ellos.

por lo que deciden retirarse de la obra y nosotros como contratista, estamos en la búsqueda de otro equipo de trabajo.

Del 24 al 26 /01/ 2024

Sin actividad a consecuencia del robo. hemos tenido varias reuniones en estos días con otras personas para que puedan trabajar en ambos arroyos

en el arroyo Lambaré el día 27/01/2024 damos el inicio de las actividades nuevamente, pero en referencia aun seguimos en la búsqueda.

Recibido por: Ivan D. Cañete C. Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Ing. Cindy Tamayo COVIPA S.A. Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 de 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

15 (Quince)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000055

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 27 / 01 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.
ADRIANA DIAZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Tel.: 207.210 - 333.151
Sajonia 1578 e/ 7 y 8 Lambaré

Comenzamos nuevamente con trabajos en Lambaré con un nuevo contratista, luego de roto su Frido por el Grupo anterior.

En el arroyo Ferreira aun no podemos volver a trabajar.

28/01/2024

Sin Actividades por día Domingo.

29/01/2024 al 31/01/2024

Continuamos con los trabajos en el arroyo Lambaré con la excavación, base y elevación del muro de piedra bruta colocada.

Recibido por: Juan D. Cañete L. Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Ing. Cindy Tamayo COVIPA S.A. Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A

Municipalidad de Asunción

47

00000041

PLANO DE UBICACIÓN - "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO " - ID: 421.421

2922-

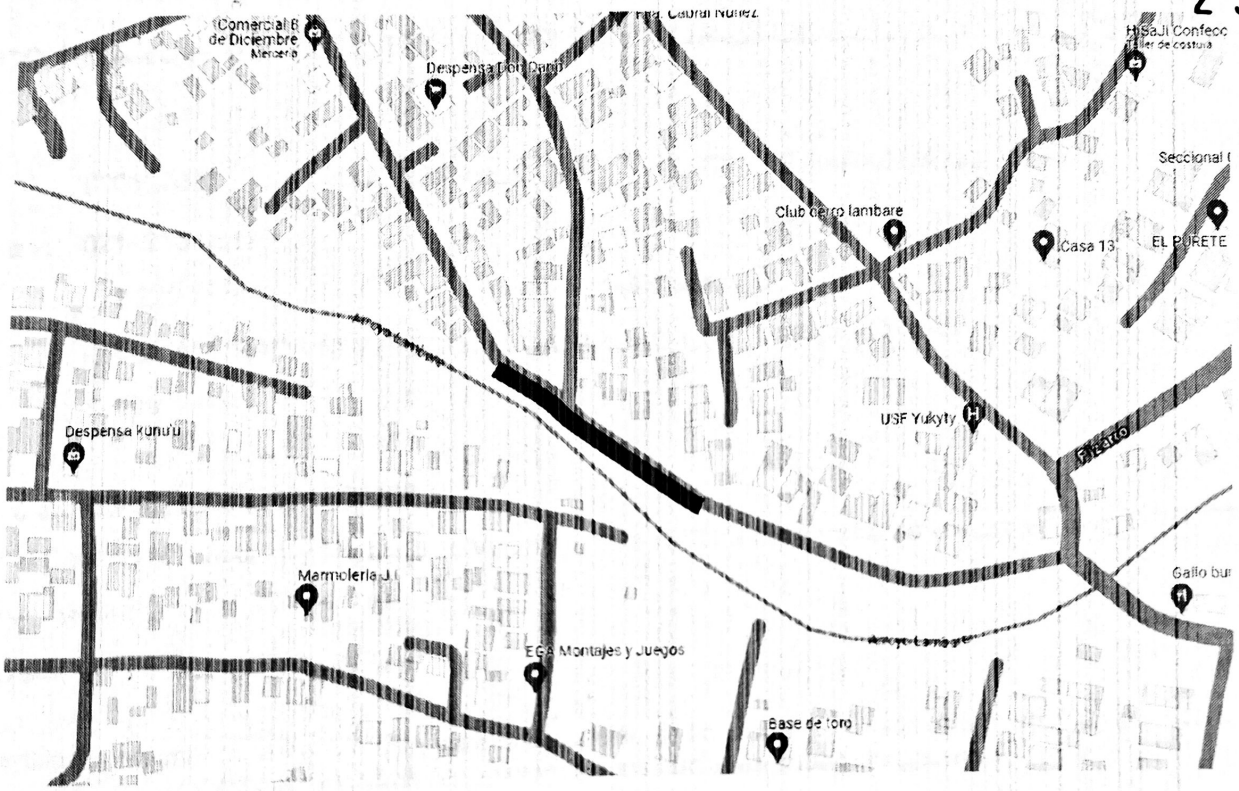

Arroyo Lambare.

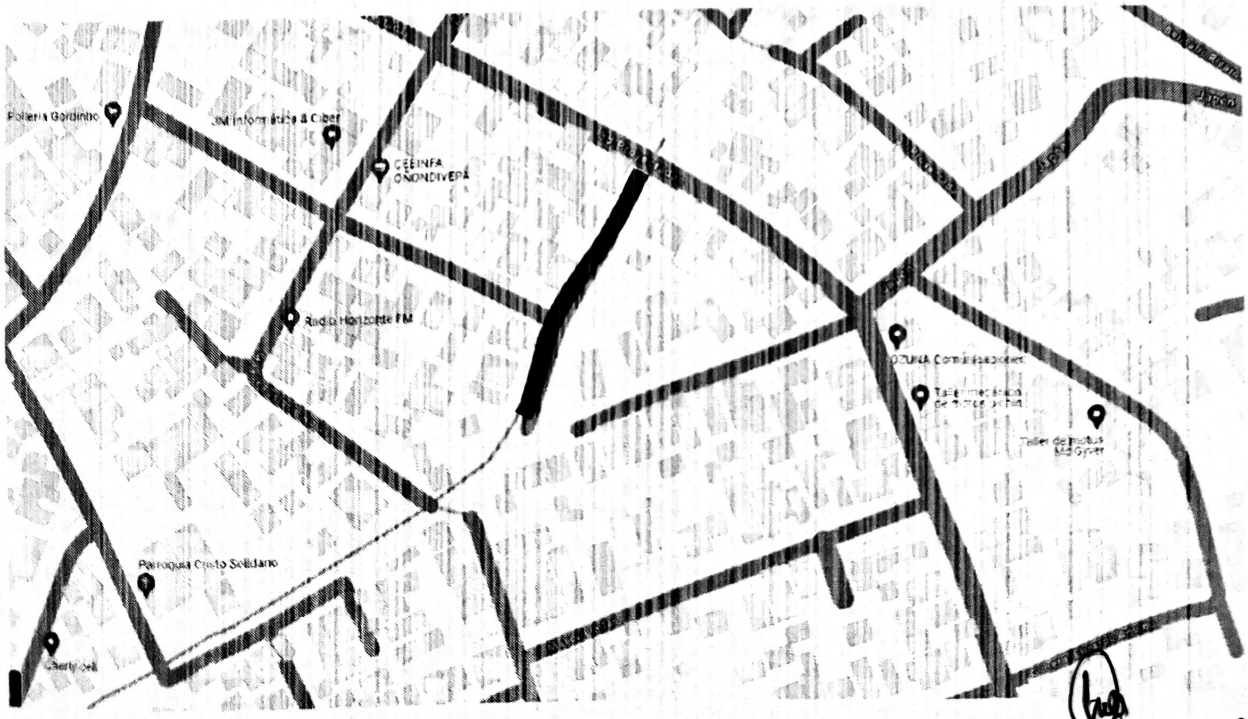

Arroyo Ferreira.

Ing. Iván Canete
