**Gobernación de Itapúa**
**Secretaría de Obras Públicas**

**Resumen Certificado Básico N°: 4**
**Periodo: abr'24/may'24**

**OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira**

| Posición | Conceptos | Importes Autorizados | | Importes Certificados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hasta Certificado Anterior | | Presente Certificado | | Total a la Fecha | |
| | | % | (1) | % | (2) | % | (3) | % | (2+3) |
| A | Certificados por Obra Ejecutada | | | | | | | | |
| A.1 | Lote 2 | 100,00% | 398.621.800 | 50,78% | 202.429.250 | 16,91% | 67.402.500 | 67,69% | 269.831.750 |
| **AII** | **Totales por Obra** | **100,00%** | **398.621.800** | **50,78%** | **202.429.250** | **16,91%** | **67.402.500** | **67,69%** | **269.831.750** |
| B | Certificados por Obra Ejecutada | | | | | | | | |
| B.1 | Devolución de Anticipo | 20% | 79.724.360 | | 40.485.850 | | 13.480.500 | | 53.966.350 |
| B.2 | Para Fondo de Reparo | 0% | - | | | | | | |
| B.3 | Otras Deducciones | 0% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **BII** | **Total Deducciones** | | **79.724.360** | | **40.485.850** | | **13.480.500** | | **53.966.350** |

| | | |
|---|---|---|
| C.1 | Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B) | 53.922.000 |
| C.2 | Multas | 0 |
| **C.** | **Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)** | **53.922.000** |

**Son Gs.: Cincuenta y tres millones novecientos veintidós mil.-**

**Resumen de Certificado Básico N° 4**
**Periodo abr'24/may'24**

**Contrato N° 74/23**

**Monto Total 398.621.800**

**Contratista: Lapacho Construcciones**
Fecha de Inicio: 20/12/2023
Terminación: 18/05/2024
Plazo de ejecución: 150 días
Ampliación de plazo: 64 días
Nueva fecha de terminación: 21/07/2024

**Gobernación de Itapúa**
**Secretaría de Obras Públicas**

**Mesa de Entrada**

*Gregorio Vera Jara*
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Contratista Cnel. Bogado
Representante

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

2

**ACTA DE MEDICIÓN**

**CERTIFICADO BASICO Nº 04**

**CONTRATO Nº 74/23**

**REFERENCIA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira**

**CONTRATISTA:** Lapacho Construcciones – Gregorio Vera Jara

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 31 días del mes de mayo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Carlos Amarilla, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Señor Gregorio Vera Jara, Representante legal de la Empresa Lapacho Construcciones para la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira**

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el periodo de abril/mayo 2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py -

Representante Legal

Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

| GOBERNACIÓN DE ITAPÚA | | | | | | | | | | | | | | | | | | abr'24/may'24 | Cert. N° 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Planilla I | |
| Precio Contratación Gs: | 398.621.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | MONTO EJECUTADO EN GS. | | | | |
| | | UNIDAD | CANT | P. UNITARIO | P. TOTAL | INCIDENCIA | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUM. TOTAL | | |
| 1 | Cartel metalico con soporte - | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,0028 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0028 | 0,0000 | 0,0028 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.100.000 | - | 1.100.000 | | |
| 2 | Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización | Unidad Medida Global | 1 | 5.650.000 | 5.650.000 | 0,0142 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0142 | 0,0000 | 0,0142 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5.650.000 | - | 5.650.000 | | |
| 3 | Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación | Metro lineal | 760 | 7.500 | 5.700.000 | 0,0143 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0143 | 0,0000 | 0,0143 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 5.700.000 | - | 5.700.000 | | |
| 4 | Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. | Metros cúbicos | 609,38 | 21.000 | 12.796.980 | 0,0321 | 90,26% | 0,00% | 90,26% | 0,0290 | 0,0000 | 0,0290 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 11.550.000 | - | 11.550.000 | | |
| 5 | Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. | Metros cúbicos | 263,25 | 34.000 | 8.950.500 | 0,0225 | 66,86% | 24,69% | 91,55% | 0,0150 | 0,0055 | 0,0206 | 176,00 | 65,00 | 241,00 | 5.984.000 | 2.210.000 | 8.194.000 | | |
| 6 | Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes | Unidad | 14 | 81.500 | 1.141.000 | 0,0029 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0029 | 0,0000 | 0,0029 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 1.141.000 | - | 1.141.000 | | |
| 7 | Construcción de empedrado de piedra basalto | Metros cuadrados | 4.693,4 | 31.000 | 145.495.400 | 0,3650 | 36,22% | 29,83% | 66,05% | 0,1322 | 0,1089 | 0,2411 | 1.700,00 | 1.400,00 | 3.100,00 | 52.700.000 | 43.400.000 | 96.100.000 | | |
| 8 | Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado | Metros cúbicos | 4.693,4 | 7.000 | 32.853.800 | 0,0824 | 43,68% | 22,37% | 66,05% | 0,0360 | 0,0184 | 0,0544 | 2.050,00 | 1.050,00 | 3.100,00 | 14.350.000 | 7.350.000 | 21.700.000 | | |
| 9 | Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). incluye relleno de tierra sobre empedrado | Metros cuadrados | 4.693,4 | 2.950 | 13.845.530 | 0,0347 | 33,03% | 3,20% | 36,22% | 0,0115 | 0,0011 | 0,0126 | 1.550,00 | 150,00 | 1.700,00 | 4.572.500 | 442.500 | 5.015.000 | | |
| 10 | Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). | Metros cúbicos | 68,13 | 950.000 | 64.723.500 | 0,1624 | 56,92% | 7,34% | 64,26% | 0,0924 | 0,0119 | 0,1043 | 38,78 | 5,00 | 43,78 | 36.841.000 | 4.750.000 | 41.591.000 | | |
| 11 | Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. | Metro lineal | 8 | 1.150.000 | 9.200.000 | 0,0231 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0231 | 0,0000 | 0,0231 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 9.200.000 | - | 9.200.000 | | |
| 12 | Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos | Metros cúbicos | 4,79 | 1.800.000 | 8.622.000 | 0,0216 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0216 | 0,0000 | 0,0216 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 8.622.000 | - | 8.622.000 | | |
| 13 | Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre. | Metro lineal | 8 | 5.100.000 | 40.800.000 | 0,1024 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,1024 | 0,0000 | 0,1024 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 40.800.000 | - | 40.800.000 | | |
| 14 | Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. | Metros cúbicos | 20,42 | 1.850.000 | 37.777.000 | 0,0948 | 0,00% | 24,49% | 24,49% | 0,0000 | 0,0232 | 0,0232 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | - | 9.250.000 | 9.250.000 | | |

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

| GOBERNACIÓN DE ITAPÚA | | | | | | | | | | | | | | | | abr'24/may'24 | | | Cert. N° 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Planilla I | | |
| Precio Contratación Gs: | 398.621.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | MONTO EJECUTADO EN GS. | | | | | |
| | | UNIDAD | CANT | P. UNITARIO | P. TOTAL | INCIDENCIA | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUM. TOTAL | | | |
| 15 | Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño | Metro lineal | 6 | 605.000 | 3.630.000 | 0,0091 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | | | |
| 16 | Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.693,4 | 1.350 | 6.336.090 | 0,0159 | 66,58% | 0,00% | 66,58% | 0,0106 | 0,0000 | 0,0106 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 4.218.750 | - | 4.218.750 | | | |
| PRECIO TOTAL | | | | | 398.621.800 | 1,00 | | | | 50,78% | 16,91% | 67,69% | | | | 202.429.250 | 67.402.500 | 269.831.750 | | | |

CONTRATISTA

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

# GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

## CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

### Lapacho Construcciones

**R.U.C.: 1.218.178 - 1**

**OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira**

| Item | Rubros | Unidad | Cantidad | Precio unitario IVA Incluido Gs. | Precio Total Gs. | PERIODO 1 enero | 2 febrero | 3 marzo | 4 abril | 5 mayo | 6 junio | 7 julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte - | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | | |
| 2 | Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización | Unidad Medida Global | 1 | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 | | | | | | |
| 3 | Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación | Metro lineal | 760 | 7.500 | 5.700.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | | | |
| 4 | Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. | Metros cúbicos | 609,38 | 21.000 | 12.796.980 | 2.559.396 | 2.559.396 | 2.559.396 | | 2.559.396 | 2.559.396 | |
| 5 | Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. | Metros cúbicos | 263,25 | 34.000 | 8.950.500 | 2.237.625 | 2.237.625 | 2.237.625 | | 2.237.625 | | |
| 6 | Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes | Unidad | 14 | 81.500 | 1.141.000 | - | | 1.141.000 | | | | |
| 7 | Construcción de empedrado de piedra basalto | Metros cuadrados | 4.693,4 | 31.000 | 145.495.400 | 29.099.080 | 29.099.080 | 14.549.540 | | 14.549.540 | 29.099.080 | 29.099.080 |
| 8 | Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado | Metros cúbicos | 4.693,4 | 7.000 | 32.853.800 | 8.213.450 | 8.213.450 | 8.213.450 | | 8.213.450 | | |
| 9 | Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado | Metros cuadrados | 4.693,4 | 2.950 | 13.845.530 | | 2.769.106 | 2.769.106 | | 2.769.106 | 2.769.106 | 2.769.106 |
| 10 | Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). | Metros cúbicos | 68,13 | 950.000 | 64.723.500 | 12.944.700 | 22.653.225 | 12.944.700 | 3.236.175 | 6.472.350 | 6.472.350 | |
| 11 | Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. | Metro lineal | 8 | 1.150.000 | 9.200.000 | - | | | 9.200.000 | | | |
| 12 | Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos | Metros cúbicos | 4,79 | 1.800.000 | 8.622.000 | - | | | | 4.311.000 | 4.311.000 | |
| 13 | Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre. | Metro lineal | 8 | 5.100.000 | 40.800.000 | - | | 20.400.000 | 20.400.000 | | | |
| 14 | Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. | Metros cúbicos | 20,42 | 1.850.000 | 37.777.000 | - | | | | 12.592.333 | 25.184.667 | |
| 15 | Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño | Metro lineal | 6 | 605.000 | 3.630.000 | - | | | | | | 3.630.000 |
| 16 | Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.693,4 | 1.350 | 6.336.090 | 3.168.045 | | | | | | 3.168.045 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | | **398.621.800** | **66.397.296** | **68.956.882** | **66.239.817** | **34.261.175** | **53.704.800** | **70.395.599** | **38.666.231** |
| | | | | | **Avance Programado Gs** | 66.397.296 | 68.956.882 | 66.239.817 | 34.261.175 | 53.704.800 | 70.395.599 | 38.666.231 |
| | | | | | **Avance Programado Acumulado Gs** | 66.397.296 | 135.354.178 | 201.593.995 | 235.855.170 | 289.559.970 | 359.955.569 | 398.621.800 |
| | | | | | **% Programado** | 16,66% | 17,30% | 16,62% | 8,59% | 13,47% | 17,66% | 9,70% |
| | | | | | **% Programado Acumulado** | 16,66% | 33,96% | 50,57% | 59,17% | 72,64% | 90,30% | 100,00% |

**Gregorio Vera Jara**
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py -

**CONTRATISTA**

**GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

## GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

| | |
|---|---|
| **Contrato N°: 74/23** | |
| **Monto del Contrato: 398.621.800 Gs** | **Term. Prevista: 18/05/2024** |
| **Plazo Contractual:** 150 días | **Ampliaciones: 64 días** |
| **Inicio de Obra: 20/12/2023** | **Nueva fecha de terminación: 21/07/2024** |
| | **Periodo: abr'24** |

**CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO**

**Contrato N°: 73/23**

| PERIODO | PREVISTO GS. | | EJECUTADO GS. | | PREVISTO % | | EJECUTADO % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO |
| INICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| enero | 66.397.296 | 66.397.296 | 97.617.750 | 97.617.750 | 16,66% | 16,66% | 24,49% | 24,49% |
| febrero | 68.956.882 | 135.354.178 | 70.118.000 | 167.735.750 | 17,30% | 33,96% | 17,59% | 42,08% |
| marzo | 66.239.817 | 201.593.995 | 34.693.500 | 202.429.250 | 16,62% | 50,57% | 8,70% | 50,78% |
| abril | 34.261.175 | 235.855.170 | 3.370.125 | 205.799.375 | 8,59% | 59,17% | 0,85% | 51,63% |
| mayo | 53.704.800 | 289.559.970 | 64.032.375 | 269.831.750 | 13,47% | 72,64% | 16,06% | 67,69% |
| junio | 70.395.599 | 359.955.569 | | | 17,66% | 90,30% | | |
| julio | 38.666.231 | 398.621.800 | | | 9,70% | 100,00% | | |

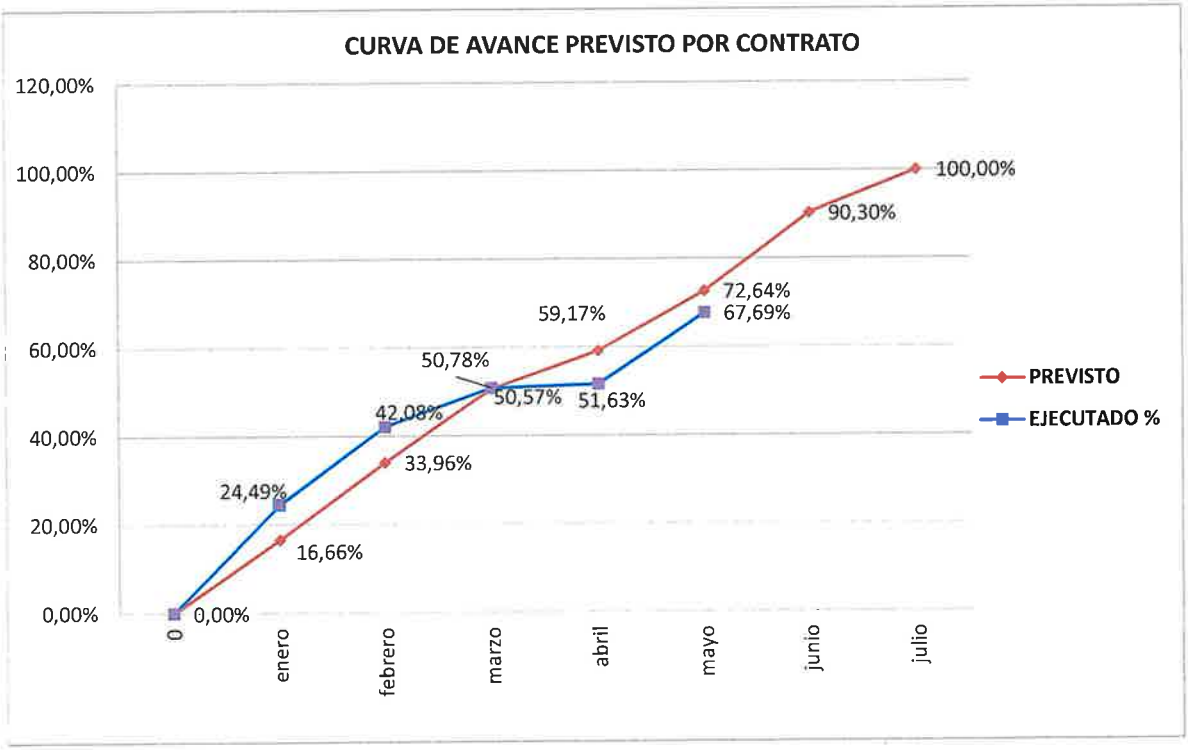


Gregorio Vera Jara
Capacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado
Contratista

Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos Javier A...
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

7

## INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO NRO 4

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO DE HORMIGÓN - MARIA AUXILIADORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA CONTRATISTA:** SR. GREGORIO VERA JARA | **Nº DE TELÉFONO:** 0985 - 916562 | **Nº CONTRATO:** 74/2023 **MODALIDAD:** CO Nº 36/2023 | **MONTO DEL CONTRATO:** 398.621.800 Gs. |
| **FECHA DE INICIO:** 19-12-2023 **PLAZO CONTRACTUAL:** 150 DÍAS | **TERMINACIÓN PREVISTA:** 18-05-2024. | **PRORROGA: RES. N° 655/2024** 64 DÍAS | **FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA:** 21-07-2024. |

**Fiscal a Cargo:** Secretaria de Obras Públicas.

**Fecha de Visita:** 31 de MAYO del 2023

**Avance de Obra:** 67.69%

**OBSERVACIONES GENERALES:**

La obra posee atraso con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto. Se ha remitido Orden de Servicio solicitando acelerar el avance de la obra.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se está ejecutando actualmente pavimento tipo empedrado.

Se anexa registro fotográfico de avances.

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Javier Arrúa
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Carlos Javier Ant...
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
