Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Resumen Certificado Básico N°: 2
Periodo: feb'24

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Lote 2	100,00%	398.621.800	24,49%	97.617.750	17,08%	68.093.000	41,57%	165.710.750
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**398.621.800**	**24,49%**	**97.617.750**	**17,08%**	**68.093.000**	**41,57%**	**165.710.750**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	20%	79.724.360		19.523.550		13.618.600		33.142.150
B.2	Para Fondo de Reparo	0%	-						
B.3	Otras Deducciones	0%	0		0		0		0
BII	**Total Deducciones**		**79.724.360**		**19.523.550**		**13.618.600**		**33.142.150**
C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)						54.474.400		
C.2	Multas						0		
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**						**54.474.400**		

Son Gs.: Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos.-

Resumen de Certificado Básico N° 2
Periodo feb'24

Contrato N° 74/23

Monto Total (398.621.800

Contratista: Lapacho Construcciones
Fecha de Inicio: 20/12/2023
Terminación: 18/05/2024
Plazo de ejecución: 150 días

Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Mesa de Entrada

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 3...
Cnel. Bogado

Contratista
Representante

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretario de Obras Públicas

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 02

CONTRATO Nº 74/23

REFERENCIA: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 y Tramo 3 Distrito de Alborada

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones – Gregorio Vera Jara

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 29 del mes de febrero del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Carlos Amarilla, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Señor Gregorio Vera Jara, Representante legal de la Empresa Lapacho Construcciones para la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira**

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de febrero 2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

ANEXO 1

Comparación de Precios del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

CONTRATO N° 74/2023 - PLAZO 150 DIAS

					GREGORIO VERA JARA		AVANCE EN CANTIDAD			AVANCE EN PORCENTAJE			AVANCE EN INCIDENCIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte -	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	0,003	0,000	0,003
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	0,014	0,000	0,014
3	72131601-9974	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	760	7.500	5.700.000	250,00	510	760,00	33%	67%	100%	0,005	0,010	0,014
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	609,38	21.000	12.796.980	325,00	85	410,00	53%	14%	67%	0,017	0,004	0,022
5	72131701-002	Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	263,25	34.000	8.950.500	96,00	80	176,00	36%	30%	67%	0,008	0,007	0,015
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	14	81.500	1.141.000	0,00	14,00	14,00	0%	100%	100%	0,000	0,003	0,003
7	72131701-002	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	4.693,4	31.000	145.495.400	1.550,00	0,00	1.550,00	33%	0%	33%	0,121	0,000	0,121
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	4.693,4	7.000	32.853.800	387,50	0,00	387,50	8%	0%	8%	0,007	0,000	0,007
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado	Metros cuadrados	4.693,4	2.950	13.845.530	1.550,00	0,00	1.550,00	33%	0%	33%	0,011	0,000	0,011
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	68,13	950.000	64.723.500	22,50	0,00	22,50	33%	0%	33%	0,054	0,000	0,054
11	72131701-002	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre.	Metro lineal	8	1.150.000	9.200.000	0,00	8	8,00	0%	100%	100%	0,000	0,023	0,023
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos	Metros cúbicos	4,79	1.800.000	8.622.000	0,00	5	4,79	0%	100%	100%	0,000	0,022	0,022
13	72131701-002	Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre.	Metro lineal	8	5.100.000	40.800.000	0,00	8	8,00	0%	100%	100%	0,000	0,102	0,102
14	72131701-002	Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	20,42	1.850.000	37.777.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000
15	72131701-002	Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metro lineal	6	605.000	3.630.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000
16	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.693,4	1.350	6.336.090	1.625,00	0,00	1.625,00	35%	0%	35%	0,006	0,000	0,006
Precio Total						**398.621.800**							**24,49%**	**17,08%**	**41,57%**

Gregorio Vera Jara
Ingeniero Constructor
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA | feb'24 | Cert. N° 2

Secretaría de Obras Públicas | Planilla I

Precio Contratación Gs: **398.621.800**

PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
		UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Cartel metalico con soporte -	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	0,0028	100,00%	0,00%	100,00%	0,0028	0,0000	0,0028	1,00	0,00	1,00	1.100.000	-	1.100.000
2	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000	0,0142	100,00%	0,00%	100,00%	0,0142	0,0000	0,0142	1,00	0,00	1,00	5.650.000	-	5.650.000
3	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	760	7.500	5.700.000	0,0143	32,89%	67,11%	100,00%	0,0047	0,0096	0,0143	250,00	510,00	760,00	1.875.000	3.825.000	5.700.000
4	Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	609,38	21.000	12.796.980	0,0321	53,33%	13,95%	67,28%	0,0171	0,0045	0,0216	325,00	85,00	410,00	6.825.000	1.785.000	8.610.000
5	Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	263,25	34.000	8.950.500	0,0225	36,47%	30,39%	66,86%	0,0082	0,0068	0,0150	96,00	80,00	176,00	3.264.000	2.720.000	5.984.000
6	Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	14	81.500	1.141.000	0,0029	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0029	0,0029	0,00	14,00	14,00	-	1.141.000	1.141.000
7	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	4.693,4	31.000	145.495.400	0,3650	33,03%	0,00%	33,03%	0,1205	0,0000	0,1205	1.550,00	0,00	1.550,00	48.050.000	-	48.050.000
8	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	4.693,4	7.000	32.853.800	0,0824	8,26%	0,00%	8,26%	0,0068	0,0000	0,0068	387,50	0,00	387,50	2.712.500	-	2.712.500
9	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado	Metros cuadrados	4.693,4	2.950	13.845.530	0,0347	33,03%	0,00%	33,03%	0,0115	0,0000	0,0115	1.550,00	0,00	1.550,00	4.572.500	-	4.572.500
10	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	68,13	950.000	64.723.500	0,1624	33,03%	0,00%	33,03%	0,0536	0,0000	0,0536	22,50	0,00	22,50	21.375.000	-	21.375.000
11	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre.	Metro lineal	8	1.150.000	9.200.000	0,0231	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0231	0,0231	0,00	8,00	8,00	-	9.200.000	9.200.000
12	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos	Metros cúbicos	4,79	1.800.000	8.622.000	0,0216	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0216	0,0216	0,00	4,79	4,79	-	8.622.000	8.622.000
13	Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre.	Metro lineal	8	5.100.000	40.800.000	0,1024	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,1024	0,1024	0,00	8,00	8,00	-	40.800.000	40.800.000
14	Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	20,42	1.850.000	37.777.000	0,0948	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
15	Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metro lineal	6	605.000	3.630.000	0,0091	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
16	Limpieza de obra - Limpieza Inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.693,4	1.350	6.336.090	0,0159	34,62%	0,00%	34,62%	0,0055	0,0000	0,0055	1.625,00	0,00	1.625,00	2.193.750	-	2.193.750
PRECIO TOTAL					**398.621.800**	**1,00**				**24,49%**	**17,08%**	**41,57%**				**97.617.750**	**68.093.000**	**165.710.750**

Gregorio Vera Jara
Ingeniero Constructor
Tel. (0975) 804 803
Chel. Bogado - Pte.

CONTRATISTA

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Contrato N°: 74/23	
Monto del Contrato: 398.621.800 Gs	**Term. Prevista: 18/05/2024**
Plazo Contractual: 150 días	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 20/12/2023	**Periodo: feb'24**

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 73/23

PERIODO	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dic'23/ene'24	97.617.750	97.617.750	97.617.750	97.617.750	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%
ene'24/feb'24	141.384.535	239.002.285	68.093.000	165.710.750	35,47%	59,96%	17,08%	41,57%
feb'24/mar'24	72.200.695	311.202.980			18,11%	78,07%		
mar'24/abr'24	45.566.750	356.769.730			11,43%	89,50%		
abr'24/may'24	41.852.070	398.621.800			10,50%	100,00%		

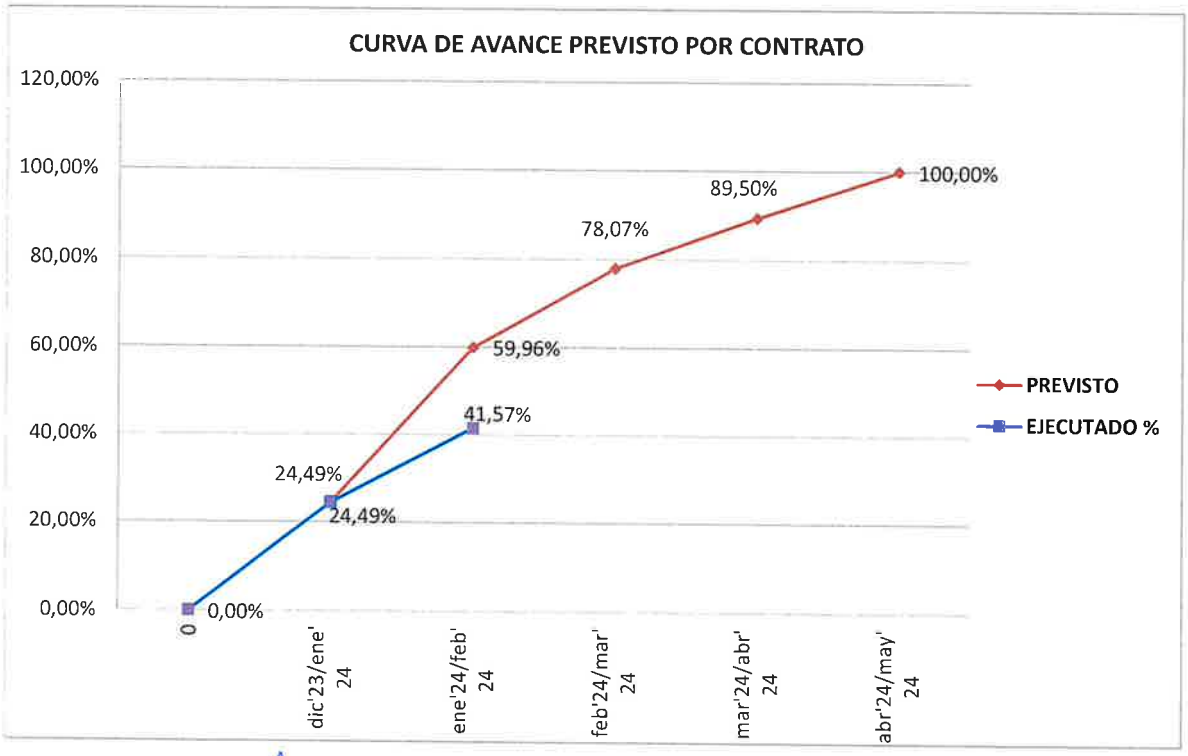

Contratista

Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Lapacho Construcciones

R.U.C.: 1.218.178 - 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA Incluido Gs.	Precio Total Gs.		PERIODO 1	2	3	4	5
						0	dic'23/ene'24	ene'24/feb'24	feb'24/mar'24	mar'24/abr'24	abr'24/may'24
1	Cartel metalico con soporte -	Unidad	1	1.100.000	1.100.000		1.100.000				
2	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000		5.650.000				
3	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	760	7.500	5.700.000		1.875.000	1.900.000	1.925.000		
4	Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	609,38	21.000	12.796.980		6.825.000	4.265.660	1.706.320		
5	Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	263,25	34.000	8.950.500		3.264.000	5.686.500			
6	Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	14	81.500	1.141.000		-	1.141.000			
7	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	4.693,4	31.000	145.495.400		48.050.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	24.945.400
8	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	4.693,4	7.000	32.853.800		2.712.500	6.850.000	6.850.000	8.560.000	7.881.300
9	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado	Metros cuadrados	4.693,4	2.950	13.845.530		4.572.500	2.850.000	1.650.000	3.520.000	1.253.030
10	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	68,13	950.000	64.723.500		21.375.000	16.180.875	16.180.875	10.986.750	
11	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre.	Metro lineal	8	1.150.000	9.200.000		-	9.200.000			
12	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos	Metros cúbicos	4,79	1.800.000	8.622.000		-	8.622.000			
13	Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre.	Metro lineal	8	5.100.000	40.800.000		-	40.800.000			
14	Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	20,42	1.850.000	37.777.000		-	18.888.500	18.888.500		
15	Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metro lineal	6	605.000	3.630.000		-				3.630.000
16	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.693,4	1.350	6.336.090		2.193.750				4.142.340
	PRECIO TOTAL				**398.621.800**		**97.617.750**	**141.384.535**	**72.200.695**	**45.566.750**	**41.852.070**
							Avance Programado Gs	97.617.750	141.384.535	72.200.695	45.566.750	41.852.070
							Avance Programado Acumulado Gs	97.617.750	239.002.285	311.202.980	356.769.730	398.621.800
							% Programado #	24,49%	35,47%	18,11%	11,43%	10,50%
							% Programado Acumulado #	24,49%	59,96%	78,07%	89,50%	100,00%

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalizacion de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.885

INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO NRO 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO DE HORMIGÓN - MARIA AUXILIADORA

EMPRESA CONTRATISTA: SR. GREGORIO VERA JARA	**Nº DE TELÉFONO:** 0985 - 916562	**Nº CONTRATO:** 74/2023	**FECHA DE INICIO:** 19-12-2023
MODALIDAD / LOTE: CO Nº 36/2023	**PLAZO CONTRACTUAL:** 150 DÍAS	**MONTO DEL CONTRATO:** 398.621.800 Gs.	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 18-05-2023.

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: 30 ENERO del 2023

Avance de Obra: 41.57%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee atraso con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto. Se ha remitido Orden de Servicio solicitando acelerar el avance de la obra.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se está ejecutando actualmente pavimento tipo empedrado.

Se anexa registro fotográfico de avances.

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.885

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Teléf: +59571204668
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Carlos [illegible]
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.865

Fiscalización de Obras
Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
