electrointec

Asunción, 07 agosto de 2024
NOTA_CEI_179 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Presente:

Ref.: LPN 1647/2021 Contratación de Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución. ID Nº 398.415
Contrato N° 8767/2022

Asunto: Presentación de informe mensual.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de presentar el:

INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE julio **2024**, del contrato de referencia;

La versión digital y las copias impresas, como descrito en los Términos de Referencia, serán entregados al Administrador del Contrato.

Sin otro particular, nos despedimos.

.....
Lic. Julio Esteban Mendoza Ortega, MBA
Representante Legal

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000074278

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	C.I. CIVIL / 2040407
Tipo de solicitante:	Particular
Nombre y apellidos:	JULIO ESTEBAN MENDOZA ORTEGA
Correo electrónico:	cobranzas@intec.com.py (no validado)
Teléfono celular:	981766855
Dirección:	charles da gaulle numero 1575
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000074278, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 78277182-1000074278-78275462

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000074278

Fecha de creación:	**07/08/2024 13:21:23h**
Número de expediente:	1000074278
Número interno:	78277182-1000074278-78275462
Objeto del documento:	PRESENTAR INFORMES
Descripción del objeto:	presentación del informe correspondiente al mes de julio 2024. consorcio electrointec.
NIS:	
Observaciones del doc.:	no aplica
Fecha del doc. externo:	07/08/2024
Número de ref. externo:	no aplica
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	no aplica

Archivos adjuntos: Anexado correctamente el archivo 'scan_20240807115531.pdf'

electrointec

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

INFORME N.° 023/2022

“SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN” CONVENIO ANDE - ITAIPU

Contrato N.° 8767/2022

Referencia: Mes de julio de 2024

electrointec

ÍNDICE

1 PRESENTACIÓN **3**
2 INFORMACIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN **4**
2.1. Personal de la Fiscalización 4
2.2. Equipamientos de la Fiscalización 6
2.3. Certificaciones de la fiscalización 6
2.4. ACTIVIDADES CONFORME EL ALCANCE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 7
2.4.1 Gerenciamiento y planeamiento 7
2.4.2 Fiscalización de obras 8
2.4.3 Actividades complementarias 11
3. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y REMITIDAS 18
3.1. Notas Recibidas 18
3.2. Notas remitidas 19
4. CONCLUSIONES 20
ANEXOS 21

1 PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo relatar el avance de las actividades realizadas por el Consorcio ElectroIntec responsable por los Servicios Profesionales de Supervisión Técnica, correspondiente a las obras para mejoramiento y refuerzo del sistema de distribución, durante el mes de julio de 2024.

2 INFORMACIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN

2.1. Personal de la Fiscalización

El personal afectado durante el mes de referencia se presenta en el siguiente cuadro:

electrointec

N.º	CARGO	NOMBRE	INCORPORACION	CTO. / LICITACIÓN
1	Ingeniero	Fernando Alegre	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1647/21
2	Ingeniero	Fernando Fretes	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1647/21
3	Ingeniero	Walter Noldin	Incorporado	N.º 8767/2022 – LPN 1647/21
4	Ingeniero	Eduardo Juvinel	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
5	Ingeniero	Richard Arroyo	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
6	Ingeniero	Guillermo Vera	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
7	Ingeniero	Félix Fernández	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
8	Fiscal de obras	María Inés Torres	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1647/21
9	Fiscal de obras	Santiago Joel Benítez	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1647/21
10	Fiscal de obras	Catalino Chaparro	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1647/21
11	Fiscal de obras	Patrocinio Diaz	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
12	Fiscal de obras	Diego Zalazar	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
13	Fiscal de obras	Cristhian Delgado	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
14	Fiscal de obras	Claudio Martínez	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
15	Fiscal de obras	Derlis Acosta	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
16	Fiscal de obras	Gloria Riveros	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
17	Fiscal de obras	Saulo Cano	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
18	Fiscal de obras	Wilson Espínola	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
19	Fiscal de obras	Guillermo Arguello	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
20	Fiscal de obras	Federico Maldonado	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
21	Fiscal de obras	José Luis Céspedes	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
22	Fiscal de Obras	Eduardo Oviedo	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
23	Operador de PC	Victoria Nuñez	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
24	Operador de PC	Pedro Ferreira	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
25	Operador de PC	José Acosta	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
26	Especialista en Sistemas Informáticos	Iván Samudio	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
27	Especialista en Sistemas Informáticos	Alcides Fernández	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
28	Inspector de materiales	Blas Escobar	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
29	Especialista Ambiental/ Social/ Seguridad del trabajo	Leticia Espínola	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
30	Fiscal de Obras	Roberto Ferreira	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
31	Operador de PC	Alexander Dick	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21

2.2. Equipamientos de la Fiscalización

A continuación, se presenta un listado que contiene los equipamientos, inmuebles y la movilidad que se empleará por la fiscalización.

Nro.	DESCRIPCION	CANTIDAD	INCORPORACIÓN
1	Vehículo doble cabina 4x4 con previsión de combustible	10	Incorporado

2.3. Certificaciones de la fiscalización

Mes	Certificado	Monto Certificado Mensual	Monto Total del Contrato	Monto Certificado Acumulado	Monto Neto
	[Nro.]	[Gs]	[Gs]	[Gs]	[Gs]
			18.726.468.600		
Set/22	1	108.553.348	18.618.460.769	108.007.831	108.007.831
Oct/22	2	258.251.015	18.360.209.754	366.258.846	366.258.846
Nov/22	3	264.927.933	18.095.281.821	631.186.779	631.186.779
Dic/22	4	255.820.311	17.838.461.510	888.007.090	888.007.090
Ene/23	5	302.976.315	17.535.485.195	1.190.983.405	1.190.983.405
Feb/23	6	318.460.242	17.217.024.953	1.509.443.647	1.509.443.647
Mar/23	7	358.857.644	16.858.167.309	1.868.301.291	1.868.301.291
Abr/23	8	399.689.089	16.458.444.795	2.268.023.805	2.268.023.805
May/23	9	429.431.388	16.029.013.407	2.697.455.193	2.697.455.193
Jun/23	10	429.431.388	15.599.582.019	3.126.886.581	3.126.886.581
Jul/23	11	429.431.388	15.170.150.631	3.556.317.969	3.556.317.969
Agos/23	12	429.431.388	14.740.719.243	3.985.749.357	3.985.749.357
Set/23	13	336.570.379	14.404.148.864	4.322.319.736	4.322.319.736
Oct/23	14	284.378.366	14.119.770.498	4.606.698.102	4.606.698.102
Nov/23	15	324.538.404	13.795.232.094	4.931.236.506	4.931.236.506
Dic/23	16	214.153.386	13.581.078.708	5.145.389.892	5.145.389.892
Ene/24	17	223.712.437	13.357.366.271	5.369.102.329	5.369.102.329
Feb/24	18	351.107.708	13.006.258.563	5.720.210.037	5.720.210.037
Mar/24	19	370.727.110	12.623.604.765	6.102.863.835	6.102.863.835
Abr/24	20	386.887.772	12.236.716.993	6.489.751.607	6.489.751.607
May/24	21	396.894.263	11.839.822.730	6.886.645.870	6.886.645.870
Jun/24	22	398.814.460	11.441.008.270	7.285.460.330	7.285.460.330
Jul/24	23	416.153.239	11.024.309.514	7.702.159.086	7.702.159.086

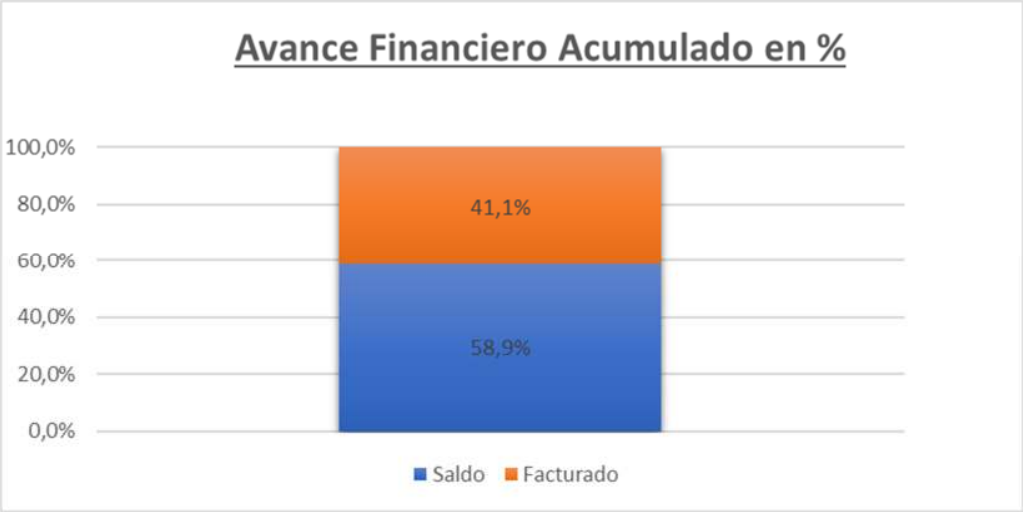

2.4. ACTIVIDADES CONFORME EL ALCANCE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.4.1 Gerenciamiento y planeamiento

Las principales actividades realizadas durante el mes se detallan a continuación:

- Elaboración de Informe Mensual de las Actividades del Consultor correspondientes al mes de julio de 2024.
- Recibir, procesar, remitir y seguimiento de documentos correspondientes a las obras de mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica.
- Reuniones periódicas con la Unidad Administradora de Contrato.
- Elaboración de Registro diario con el planeamiento de las actividades de todas las contratistas de los lotes de la licitación 1207/2017.
- Verificación del listado de trabajos pendientes de calidad de cada Lote de la LPI 1207/17
- Gestión de solicitudes de cortes de tensión y estados de precaución presentadas por las contratistas.
- Comunicación continua a través de los grupos de WhatsApp con las operadoras de Telecomunicaciones respecto a los retiros de postes comprometidos por fibras, así como avisos en caso de tener incidentes por avería de algunos puntos por motivos accidentales de manera a tener una pronta respuesta para minimizar el tiempo de fueras de servicios de los abonados.

- Apoyo a los diferentes Departamentos de la ANDE.
- Soporte a la LPI ANDE N° 1614/21 – Fase II.
- Soporte a la LPI ANDE 1749/23 – Fase III.

2.4.2 Fiscalización de obras

A continuación, se detallan los trabajos en los distintos lotes que componen la LPI 1207/17:

Lote 02 – San Lorenzo – Consorcio San Lorenzo

TRABAJOS PENDIENTES

Se resolvieron 132 puntos pendientes, quedan 1.054 puntos pendientes a realizarse.

CUADRILLAS

El Consorcio actualmente con dos cuadrillas para trabajos menores.

Lote 03 – Puerto Botánico – Consorcio Metropolitano

TRABAJOS PENDIENTES.

- En el presente mes se resolvieron 695 unidades quedando así **2.560 unidades** de pendientes **resueltos** en total.

A continuación, la planilla Resumen de los trabajos pendientes del Consorcio Metropolitano

electrointec

ESTATUS DE PENDENCIAS							
ALIMENTADOR	CANTIDAD	RESUELTO	RESUELTO PARCIAL	NO APLICA	PTBT/PTMT ROBADO	POSTE CON FIBRA ÓPTICA	TOTAL PENDIENTES
BCP 02	3	2	-	-	-	-	1
BCP 03	48	18	17	-	-	-	30
MBU 03	14	14	-	-	-	-	-
MBU 04	323	288	2	24	1	1	11
MRA 01	125	100	1	13	-	7	12
MRA 02	215	161	13	11	7	5	43
MRA 03	109	91	5	4	2	1	14
MRA 04	743	544	60	18	12	-	181
MRA 05	129	101	3	7	10	2	21
MRA 06	145	130	1	1	-	3	14
MRA 07	70	57	4	1	-	1	12
MRA 12	201	181	2	10	1	1	10
PBO 01	39	35	-	2	-	2	2
PBO 03	153	126	1	18	1	2	9
PBO 04	229	168	6	16	4	32	45
PBO 05	22	17	-	4	-	-	1
PBO 06	18	14	-	-	-	1	4
PBO 08	26	24	-	-	-	2	2
PBO 10	158	101	11	3	8	5	54
PBO 15	599	388	80	31	27	-	180
	3.369	**2.560**	**206**	**163**	**73**	**65**	**508**

- Como se visualiza en la planilla anterior, hubo un importante avance en la resolución de los trabajos pendientes por parte del Consorcio Metropolitano, comprometiéndose a disminuir la cantidad de trabajos pendientes hasta el 30 de julio del presente mes.
- Esta fiscalización, realiza la verificación de la resolución de los trabajos pendientes, con el acompañamiento del Representante Técnico del Consorcio Metropolitano, el Ing. Oscar Moreno, y los demás Residentes de Obras de las Empresas Tecnoplus, 14 de Julio y T&C.

Lote 06 – Consorcio Los Nogales

TRABAJOS PENDIENTES.

- El Consorcio Los Nogales culminaron los trabajos pendientes finalizando así la resolución de los mismos.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

- El Consorcio, realizó la entrega de 765 unidades de perchas en el depósito de ANDE – BOGGIANI, y entregó la cantidad de 7.974 metros de cable protegido de 70mm2 en el depósito de ANDE – SAN LORENZO. Con esto culmina la entrega de materiales nuevos sobrantes importados.

Actividades en la LPI ANDE 1614/2021 FASE II

- Elaborar y remitir informes a UAC/ANDE de producción y calidad, relacionados a los trabajos realizados en campo LPI 1551/2024.

- Realizar capacitaciones para el uso del Sistema Informático REDMAIN.

- Elaborar actividades programadas para el día siguiente.

- Cargar archivos digitales al Google drive corporativo.

- Control de producción semanal y mensual.

- Control de avance físico, monitoreo de avance previsto vs ejecutado.

- Configuración de equipos de red (impresoras, notebook, scanner).

- Estaqueo en los alimentadores **ACY01, ACY02, ACY03 y ACY04.**
- Reunión con la Unidad Administradora de Contrato y el Consorcio Eléctrico CCS.
- Reuniones con el personal técnico de la ANDE DTE y empresas arrendatarias de Fibra óptica.
- Elaboración de Registro diario de obras.

2.4.3 Actividades complementarias.

Departamento de Normalización de Equipos y Materiales de Distribución (DD/NEM). ANDE-Sede Central

Trabajos realizados por:

- **Ing. Eduardo Juvinel**

- Atención de Consultas previas.
- Análisis y elaboración de informe de factibilidad técnica.
- Tareas asignadas por los superiores (reuniones, fiscalizaciones, etc.)

Trabajos realizados por:

- **Ing. Gloria Riveros**

- Análisis y elaboración de informes de factibilidad técnica.
- Acompañamiento en Misión de trabajo en zona Sur, departamento de Ñeembucú (alimentadores BROI, BR02, BR03 y PIL 5). Configuración y descarga de datos en bancos de reguladores de tensión, medición de parámetros eléctricos y acompañamiento de maniobras y refaseo de principales derivaciones y usuarios monofásicos para equilibrio de tensión y de demanda por fase.
- Estudio eléctrico y elaboración de informe de los alimentadores (BROI, BRO 2, BRO 3 y PIL 5).

- Convenio FIUNA-ANDE.
- Tareas asignadas por los superiores (reuniones, fiscalizaciones, etc.).

Sección de Normalización de Operación (DD/DNO). ANDE-Sede Central.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Richard Arroyo**

- Validación de ajustes de protección, estado de comunicación, análisis de los Registros, fallas, y descarga de datos de carga de los equipos de protección instalados sobre el alimentador VHA 3, a cargo del centro de operación Regional Chaco.
- Validación de ajustes de protección, estado de comunicación, análisis de los Registros, fallas, y descarga de datos de carga de los equipos de protección instalados sobre el alimentador CNU 05, a cargo del centro de operación Regional Chaco.
- Validación de ajustes de protección, estado de comunicación, análisis de los Registros, fallas, y descarga de datos de carga de los equipos de protección instalados sobre el alimentador ALT 12, a cargo del Centro de Operación Regional Central.
- Validación de ajustes de protección, estado de comunicación, análisis de los Registros, fallas, y descarga de datos de carga de los equipos de protección instalados sobre el alimentador ELA 09, a cargo del Centro de Operación Regional Central.
- Análisis de coordinación de curvas de protección de relé de cabecera, Reconectadores trifásicos y fusibles de calibres 6k, 10k, 15k, 25k y 40k.
- Análisis de coordinación de los reconectadores trifásicos instalados en el Alimentador ELA 04, a cargo del Centro de Operación Regional Central.

- Acompañamiento en el relevamiento de puntos para el montaje de puestos de distribución Subterráneo.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Félix Fernández**

- Participación de presentación virtual. Tema: Big Jumper compacto, funcionamiento, estructura, desenvolvimiento. EDP - ANDE.
- Participación de presentación virtual. Tema: Crucetas y postes de fibra de vidrio.
- Participación de presentación virtual. Tema: Solución antihurto para redes en MT y BT. Multimetal -ANDE.
- Participación de presentación virtual. Tema: Soluciones con cámaras termográficas para mantenimiento de redes de distribución.
- Estudio de régimen de operación normal de la ANDE en 23 kV.
- Estudio de régimen de operación en contingencia de la ANDE en 23 kV.
- Configuraciones y ajustes de las protecciones para los regímenes de operación mencionados anteriormente.

Trabajos realizados por:

- **Wilson Espínola**

- Informe de análisis de capacidad de transporte de potencia para configuración de cable unipolar de cobre subterráneo de media tensión con aislación EPR/HEPR-ST2 y cable protegido con aislación multicapa para media tensión.
- Elaboración del borrador de E.E.T.T del dispositivo para la telesupervisión de actuaciones de reconectador monofásico tripsaver 11.

- Informe de motivos de fuera de servicio de alimentadores a causa de averías de transformadores de distribución.
- Seguimiento del informe del proyecto piloto fusible limitador de corriente aéreo Fault Tamer, de la marca S&C.
- Seguimiento y control diario al proyecto piloto detectores de ausencia de media tensión TS200MT, de la marca TECSYS, mediante la plataforma Red Sigfox, WhatsApp, Telegram y para el parte diario la plataforma de Small World.
- Informe de investigación sobre la perdida de polimerización del papel kraft causado por sobrecarga y circuito en los transformadores de distribución.

Trabajos realizados por:

- **Saulo Cano**

- Elaboración de Informes de Averías para las Divisiones de Gestiones Regionales, sus Agencias y Secciones correspondientes de averías constatadas del GRA.

- Extracción de datos de Alimentadores del Smallworld y cambio de formato con QGIS a GEOJSON para la posterior carga del trazado de Alimentadores en el GRA.

- Apoyo a la DR/ ARI con la configuración y capacitación de funcionarios del área de distribución en el uso del sistema GRA, que atienden a las ciudades dependientes de la Agencia Regional Itapúa, Sección de Atención al

Cliente, Coronel Bogado DR/ ARIS y la Sección de Atención al Cliente Colonias Unidas DR/ ARI8.

- Apoyo a la DR/ ASP con la configuración y capacitación de funcionarios del área de distribución en el uso del sistema GRA, que atienden a las ciudades dependientes de la Agencia Regional San Pedro, Sección de Distribución de San Pedro del Ycuamandiyu.

- Apoyo a la DR/CAN con la configuración y capacitación de funcionarios del área de distribución en el uso del sistema GRA, que atienden a las ciudades dependientes de la Agencia Regional Canindeyú, Sección de Distribución Salto del Guaira DR/CAN2; la Sección de Atención al Cliente Curuguaty DR/CAN6; la Sección de Atención al Cliente, Catuete DR/CANS y el SARD Nueva Esperanza.

Sección de Normalización de Equipos de Distribución (DD/NEM1). ANDE-Sede Central.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Walter Noldin**

- Acompañamiento en elaboración de borrador de Normativa de acceso de Generación Distribuida a la red de distribución, correspondiente a la **LEY N° 6977 *"QUE REGULA EL FOMENTO, GENERACIÓN, PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLES NO CONVENCIONALES NO HIDRÁULICAS".***
- Tareas asignadas por los superiores (reuniones, fiscalizaciones, etc.)

Trabajos realizados por:

- **Ing. Claudio Martínez**

- Informe de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública Nº 1686 ''Adquisición de postes de hormigón armado''.
- Elaboración de Especificaciones Técnicas ''POSTE DE HORMIGÓN ARMADO PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN''.
- Elaboración de Especificaciones Técnicas ''POSTE DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA ACOMETIDAS''.

Departamento de Desarrollo del Sistema de Redes de Distribución (DD/ADS). ANDE-Sede Boggiani.

Trabajos realizados por:

- **Lic. Alcides Fernández**

- Capacitación e implementación de Sistema GRA a operadores y coordinadores en los centros de atención.
- Evaluación de uso de Sistema GRA.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Ivan Samudio.**

- Capacitación e implementación de Sistema GRA a operadores y coordinadores en los centros de atención.
- Evaluación de uso de Sistema GRA.

División de Gestión Regional Chaco (DR/CH). ANDE-Sede Central.

- **Ing. Federico Maldonado**

- Control de migración de la Subestación MES al software ElectricOffice.
- Corrección de errores de migración de la subestación MES y publicación en el ElectricOffice.
- Participación en reuniones de coordinación e información.

- **Ing. Guillermo Arguello**

- Control de migración de la Subestación FIL en el software ElectricOffice.
- Corrección de errores de migración de la Subestación FIL y publicación en el software ElectricOffice.

Departamento de Obras – Área de Fiscalización y Control Final (DO/AFC), de la Administración Nacional de Electricidad ANDE - Sede Central.

- **Ing. Blas Escobar**

- Control de calidad de las obras ejecutadas y certificadas en el mes marzo 2024 de la Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 - "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales-Fase II".
- Relevamiento del estado de los pendientes de calidad de la empresa Tecnoplus Ingeniería S.A. (Consorcio Metropolitano – Lote 03) – Licitación Pública Internacional ANDE LPI N°1207/17.
- Elaboración de informes técnicos.

- Tareas asignadas por la superioridad (reuniones, fiscalizaciones, etc.)

3. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y REMITIDAS

3.1. Notas Recibidas

UAC ANDE a Consorcio ELECTROINTEC

En el mes de referencia se tuvieron ordenes de ejecución emitidas por la UAC ANDE.

N°	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
39	02/07/24	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°39_2024. Aprobación para la contratación de personal para el cargo de Operador de PC.
40	03/07/24	UAC-ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°40_2024. Asignación de tareas por la superioridad.
41	05/07/24	UAC-ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°41_2024. Asignación de tareas por la superioridad.
42	08/07/24	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°42_2024. Aprobación para la contratación de personal para el cargo de Especialista Ambiental/Social/Seguridad del trabajo.
43	09/07/24	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°43_2024. Aprobación para la contratación de personal para el cargo de Fiscal de Obras.
44	12/07/24	UAC-ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°44_2024. Asignación de tareas por la superioridad.
45	12/07/24	UAC-ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°45_2024. Asignación de tareas por la superioridad.
46	22/07/24	UAC-ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°46_2024. Asignación de tareas por la superioridad.
47	25/07/24	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°47_2024. Aprobación para la contratación de personal para el cargo de Operador de PC.

3.2. Notas remitidas

Consorcio ELECTROINTEC a UAC ANDE

N°	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
CEI_159-2024	01/07/2024	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.
CEI_163-2024	02/07/2024	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.
CEI_165-2024	04/07/2024	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.
CEI_167-2024	08/07/2024	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.

4. CONCLUSIONES

En cuanto a las actividades desarrolladas por el contratista y a la luz de la supervisión efectuada por el Consorcio ELECTROINTEC se formula los siguientes comentarios:

1. Para el Lote 02, Actualmente se resolvieron 132 pendientes. Quedan pendientes 1.054 trabajos a realizarse.
2. Para el Lote 03, se resolvieron durante el mes la cantidad de pendientes: 695 unidades, y en total faltan por resolver 508 unidades. Esta cantidad refleja los trabajos que siguen pendientes y otros trabajos que se han resuelto de forma parcial.
3. Para el Lote 06, se resolvieron los trabajos pendientes, culminando así los mismos y se entregó 765 unidades de perchas y 7.974 metros de cable protegido de 70mm2. De esta forma se culmina la entrega de los materiales nuevos sobrantes.
4. Esta fiscalización se encuentra brindando apoyo a la LPI ANDE 1614/21 FASE II y a la LPI ANDE 1749/23 FASE III.
5. El personal de la Consultora ha llevado a cabo con éxito sus responsabilidades en los distintos departamentos de la ANDE, trabajando de manera integral y bajo la supervisión directa de los respectivos jefes de departamento."

ANEXOS

ANDE **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

Orden de Ejecución Nº 39

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 02 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 159 – 2024, de fecha 01 de julio de 2024, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000070583, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación del Victoria Nuñez Acosta, para el cargo de Operador de Computadoras, presentando el Currículum de la candidata mencionada.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum de la candidata propuesta, cumplimos en informarle que la misma cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 40

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 03 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de comunicarles la asignación de tareas a los Sres. Ivan Samudio, Saulo Cano y Alcides Fernandez, quienes estuvieron dando apoyo en la configuración y capacitación de funcionarios de ésta ANDE, en el uso del Sistema GRA, en las ciudades de San Estanislao, General Aquino y Villa del Rosario.

La partida de los mismos fue el día lunes 24/06/2024, a las 08:00 hs y el regreso el día sábado 29/06/2024, a las 18:00 hs

Se adjunta copia del Memorándum DD/ADS/5293/2024, de la Unidad donde los mismos actualmente prestan servicio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 41

A: Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)

Dirección: Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.

Fecha: Asunción, 05 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de comunicarles la asignación de tareas a los Sres. Ivan Samudio, Saulo Cano y Alcides Fernandez, quienes estarán dando apoyo en la configuración y capacitación de funcionarios de ésta ANDE, en el uso del Sistema GRA, en las ciudades de Coronel Bogado y Colonias Unidas.

La partida de los mismos está prevista para el día lunes 08/07/2024, a las 08:00 hs y el regreso para el día sábado 13/07/2024, a las 18:00 hs

Se adjunta copia del Memorándum DD/ADS/5294/2024, de la Unidad donde los mismos actualmente prestan servicio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

MEMORÁNDUM DD/ADS/5299/2024

A : Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

De : Dpto. de Adm. y Desarrollo del Sistema de Gestión de Redes de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 5 de julio de 2.024

Objeto: Solicitar acompañamiento de consultores en misión de trabajo a la DR/ARC relacionado con los trabajos de implementación del Sistema de Gestión de Reclamos - GRA

Se recomienda encaminar a la DO/UA, a fin de solicitar el acompañamiento de los Sres. Iván Samudio, Saulo Cano y Alcides Fernandez que prestan servicio en esta unidad DD/ADS para los siguientes trabajos:

Apoyo a la DR/ARI con la configuración y capacitación de funcionarios del área de distribución en el uso del sistema GRA, que atienden a las ciudades dependientes de la Agencia Regional Itapua, Sección de Atención al Cliente Coronel Bogado DR/ARI5 y la Sección de Atención al Cliente Colonias Unidas DR/ARI8. Fecha de salida 08/07/2024, 08:00 hs. Fecha de regreso 13/07/2024 18:00 hs.

En caso de ser favorable se ruega viabilizar las gestiones para la asignación del pago de viáticos por parte de la empresa contratista.

Atentamente,

ID 75397812

Lic. Victor M. Bogado
Jefatura DD/ADS
ANDE

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

mecip 2015

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 42

A: Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)

Dirección: Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.

Fecha: Asunción, 08 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 165 – 2024, de fecha 04 de julio de 2024, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000071125, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación del Leticia Beatriz Espínola Infante, para el cargo de Especialista Ambiental/Social/Seguridad del trabajo, presentando el Currículum de la candidata mencionada.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum de la candidata propuesta, cumplimos en informarle que la misma cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achóm F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 43

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 09 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 167 – 2024, de fecha 08 de julio de 2024, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000071409, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación de Roberto Vidal Ferreira Carballo, para el cargo de Fiscal de Obras, presentando el Currículum del candidato mencionado.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum del candidato propuesto, cumplimos en informarle que el mismo cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 44

A: Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)

Dirección: Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.

Fecha: Asunción, 12 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de comunicarles la asignación de tareas a los Sres. Ivan Samudio, Saulo Cano y Alcides Fernandez, quienes estarán dando apoyo en la configuración y capacitación de funcionarios de ésta ANDE, en el uso del Sistema GRA, en las ciudades de San Pedro del Paraná y María Auxiliadora.

La partida de los mismos está prevista para el día lunes 15/07/2024, a las 08:00 hs y el regreso para el día sábado 20/07/2024, a las 18:00 hs

Se adjunta copia del Memorándum DD/ADS/5295/2024, de la Unidad donde los mismos actualmente prestan servicio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

MEMORÁNDUM DD/ADS/5295/2024

A : Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

De : Dpto. de Adm. y Desarrollo del Sistema de Gestión de Redes de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 12 de julio de 2.024

Objeto: Solicitar acompañamiento de consultores en misión de trabajo a la DR/ARI relacionado con los trabajos de implementación del Sistema de Gestión de Reclamos - GRA

Se recomienda encaminar a la DO/UA, a fin de solicitar el acompañamiento de los Sres. Iván Samudio, Saulo Cano y Alcides Fernandez que prestan servicio en esta unidad DD/ADS para los siguientes trabajos:

Apoyo a la DR/ARI con la configuración y capacitación de funcionarios del área de distribución en el uso del sistema GRA, que atienden a las ciudades dependientes de la Agencia Regional Itapua, Sección de Atención al Cliente San Pedro del Paraná DR/ARI6 y la Sección de Atención al Cliente María Auxiliadora DR/ARI7. Fecha de salida 15/07/2024, 08:00 hs. Fecha de regreso 20/07/2024 18:00 hs.

En caso de ser favorable se ruega viabilizar las gestiones para la asignación del pago de viáticos por parte de la empresa contratista. Además, solicitamos formalmente que, en caso de excederse el presupuesto asignado para los viáticos, se contemple cubrir dicho excedente para asegurar el éxito de las actividades planificadas.

Atentamente,

ID 76026727

Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución — Fecha: 1 JUL 2024

DO	DO/AFC	✓ DD	
DO/CA	DO/UA	DD/CD	
DO/ACD	DO/ACD	DD/PD	
Otros:	✓ Ing. Zalupf		

Para orden de siguiente al Gerente Administrativo

Lic. Victor M. Bogado
Jefatura DD/ADS

Ing. Christian Acuña Fernandez
Jefe Dpto. de Adm. y Desarrollo de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

mecip 2015

electrointec

Al DO/UA
Se adjunta boneda de OE Nº 44
Atte,

Ing. Eladio Yaluff
Unidad de Administración de Contratos para Obras
de Mejoras en Distribución - ANDE
12/07/2024

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 45

A: Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)

Dirección: Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.

Fecha: Asunción, 12 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de comunicarles la asignación de tareas a la Ing. Gloria Riveros, quien estuvo dando apoyo en los trabajos de relevamiento de los alimentadores BRO 01, BRO 02, BRO 03 y PILAR 05, en el Departamento de Ñeembucú, entre los días 11 al 13 de julio, misión de 2 días y 3 noches.

Se adjunta copia del Memorándum DD/NEM/5193/2024, de la Unidad donde la misma actualmente presta servicio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

R/A Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/NEM/5193/2024

A	:	División de Estudios de Ingeniería de Distribución - DD/ID.
De	:	Departamento de Normalización de Equipos y Materiales - DD/NEM.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 10 de Julio de 2.024.-

Objeto: Solicitar acompañamiento de Consultor en Misión de Trabajo en la zona de Ñeembucu-Itapua
Código interno de proceso: 75911747

Se recomienda encaminar a la Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución (DO/UA), a fin de solicitar el acompañamiento de la ingeniera ***Gloria Riveros***, para el trabajo de relevamiento de los alimentadores BRO 1, BRO 2, BRO 3 y PIL 5 en el Departamento de Ñeembucu, entre la fecha de salida 11 de julio, misión de 3 días y 2 noches.

Se adjunta cronograma de trabajo.

Atentamente,

Ing. Carlos J. Rodríguez Cáceres
DD/NEM

SECRETARIA DD/ID | FECHA: 11/07/24
DO/UA ☑ | DD/ ☐
DD/NSD ☐ | DD/NOM ☐
OTROS:
Con el VB de esta división para el pago solicitado
11/07/24
Ing. Miriam Medina
Div. Est. de Ingeniería de Distribución

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, buscando la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de servicios.

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 11 JUL 2024
DO	DO/AFC	✓ CD
DO/CA	DO/AM	DD/CD
DO/ACO	DO/ACO	DD/PD
OTROS:	✓ Ing Yaluff.	

Para avan de ejecución al Consorcio Electrointec

Ing. Christian Acosta Fernández
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

al DO/UA:

x adjunto boletín de OE Nº 45

Atte,

Ing. Eladio Yaluff
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE
12/07/24

ANDE

MEMORÁNDUM

Cronograma de actividades

Día 01	Visita técnica y descarga de datos en la SE BRO Relevamiento de la topología de red de los alimentadores BRO 01, BRO 02 & BRO 03 (tramo SE BRO – Localidad de Zanjita) Identificación y georreferencia de cargas y derivaciones importantes (tramo SE BRO – Localidad de Zanjita) Identificación y georreferencia y captura de datos de equipos telecomandados (tramo SE BRO – Localidad de Zanjita) Identificación, georreferencia y captura de datos de reguladores de tensión (tramo SE BRO – Localidad de Zanjita)
Día 02	Levantamiento de datos para modelo de motores trifásicos (Cargas industriales) Relevamiento de la topología de red de los alimentadores BRO 01, BRO 02 & BRO 03 (tramo Localidad de Zanjita - Alberdi) Identificación y georreferencia de cargas y derivaciones importantes (tramo Localidad de Zanjita – Alberdi) Identificación y georreferencia de equipos telecomandados (tramo Localidad de Zanjita – Alberdi) Identificación, georreferencia y captura de datos de reguladores de tensión (tramo Localidad de Zanjita – Alberdi)
Día 03	Reunión con la DR/DRS (Coronel Bogado) Visita técnica y descarga de datos en la SE PIL Relevamiento de la topología de red del alimentador PIL 05 (tramo Pilar – Alberdi) Levantamiento de datos para modelo de motores trifásicos (Cargas industriales) Identificación y georreferencia de cargas y derivaciones importantes (tramo Pilar – Alberdi) Identificación y georreferencia de equipos telecomandados (tramo Pilar – Alberdi) Identificación, georreferencia y captura de datos de reguladores de tensión (tramo Pilar – Alberdi) Retorno a ANDE Sede Central para el análisis de los datos y elaboración del estudio

Se estima que la distancia total del recorrido será de aprox. 1092 km (Asunción – Alberdi – Pilar – Coronel Bogado – Asunción)

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 46

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 22 de julio de 2024 **Hoja Nº 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de comunicarles la asignación de tareas a los Sres. Ivan Samudio, Saulo Cano y Alcides Fernandez, quienes estarán dando apoyo en la configuración y capacitación de funcionarios de ésta ANDE, en el uso del Sistema GRA, en las ciudades de Salto del Guairá, Curuguaty, Catueté y Nueva Esperanza.

La partida de los mismos está prevista para el día lunes 22/07/2024, a las 08:00 hs y el regreso para el día sábado 27/07/2024, a las 18:00 hs

Se adjunta copia del Memorándum DD/ADS/5296/2024, de la Unidad donde los mismos actualmente prestan servicio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 47

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 25 de julio de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 163– 2024, de fecha 02 de julio de 2024, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000071790, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación del Sr. Alexander Dick, para el cargo de Operador de Computadoras, presentando el Currículum del candidato mencionado.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum del candidato propuesto, cumplimos en informarle que el mismo cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

electrointec

CERTIFICADO

Por el presente documento, se deja constancia que dicho informe fue estudiado, corroborado y avalado por los responsables más abajo citados, dando fe y veracidad a este documento.

CONSORCIO ELECTROINTEC
Fernando Alegre
Ingeniero
