GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

RESUMEN DE PAGO

Correspondiente al Mes: Marzo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID Nº 412692 - CONTRATO Nº LPN 09-2022

Ítem	Conceptos	Importes Autorizados		Importes certificados					
				Hasta certificado anterior		Presente Certificado		Total certificado a la fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%	34.040.000.000	78,31%	26.657.294.478	0,00%	1.246.814.022	81,97%	27.904.108.500
A.2	Precios Unitarios	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
A	Total Guaranies	0,00%	34.040.000.000	78,31%	26.657.294.478	3,66%	1.246.814.022	81,97%	27.904.108.500

Gobernacion de Ñeembucu

Contrato Nº LPN 09/2022

Monto Gs. 34.040.000.000.-

Contratista: CONSORCIO ITACORA

Fecha de Inicio: 17 - Noviembre - 22

Plazo de Ejecucion (dias): 540

Fecha de Terminación: 17 - Mayo - 24

B	Deducciones a la fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.1	Devolución del Anticipo	20,00%	0	0	0	0
B.2	Para fondo de Reparo	5,00%	0	0	0	0
B.3	Otras deducciones		0	0	0	0
BII	Total deducciones		0	0	0	0

Gobernacion de Ñeembucu

Secretaria de Obras Publicas

Mesa de Entrada

C.1	IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	1.246.814.022
C.2	MULTAS	0
C	**IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)**	**1.246.814.022**

SON GUARANÍES: Uno mil doscientos cuarenta y seis mil ochocientos catorce mil veinte y dos guaranies .----------

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 11 TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Marzo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	9,30	1,00	10,3	2,0	83,7%	93.000.000	10.000.000	103.000.000	20.000.000	83,74%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	3,00	0,00	3,00	1,0	75,0%	67.539.000	0	67.539.000	22.513.000	75,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	45.358,00	1.500,00	46.858,00	9.841,00	82,6%	1.020.555.000	33.750.000	1.054.305.000	221.422.500	82,64%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	52.861,00	1.800,00	54.661,00	9.730,00	84,9%	1.189.372.500	40.500.000	1.229.872.500	218.925.000	84,89%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	92.832,71	5.367,29	98.200,00	23.682,00	80,6%	2.088.735.978	120.764.022	2.209.500.000	532.845.000	80,57%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	82.264,00	10.000,00	92.264,00	19.912,00	82,2%	2.303.392.000	280.000.000	2.583.392.000	557.536.000	82,25%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	287.000,00	18.500,00	305.500,00	97.000,00	75,9%	9.471.000.000	610.500.000	10.081.500.000	3.201.000.000	75,90%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	360,00	70,00	430,00	90,00	82,7%	378.000.000	73.500.000	451.500.000	94.500.000	82,69%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	504,00	0,00	504,00	16,00	96,9%	378.000.000	0	378.000.000	12.000.000	96,92%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	330,00	30,00	360,00	42,50	89,4%	429.000.000	39.000.000	468.000.000	55.250.000	89,44%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00	90,0%	67.500.000	0	67.500.000	7.500.000	90,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	85,7%	33.000.000	0	33.000.000	5.500.000	85,71%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	58,00	20,00	78,00	38,00	67,2%	81.200.000	28.000.000	109.200.000	53.200.000	67,24%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	3.000,00	1.200,00	4.200,00	1.300,00	76,4%	27.000.000	10.800.000	37.800.000	11.700.000	76,36%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	11,00	0,00	11,00	1,00	91,7%	6.270.000.000	0	6.270.000.000	570.000.000	91,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	5,00	0,00	5,00	1,00	83,3%	2.760.000.000	0	2.760.000.000	552.000.000	83,33%
		TOTAL				34.040.000.000						26.657.294.478	1.246.814.022	27.904.108.500	6.135.891.500	81,97%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA RESUMEN POR TRAMO GENERAL: 57,5 km

Correspondiente al Mes: Marzo	Año: 2024

	Tramos de Caminos a Enrripiar	Km	Costo Guaranies	Ejecutado Guaranies	Saldo Guaranies	Porcentaje de Avance
1	Villa Oliva	11	6.095.613.000	6.095.613.000	-	100,00%
2	Potrero Piru	20	13.894.682.500	13.894.682.500	-	100,00%
3	Calles de la Ciudad de Pilar	5	2.062.750.000	2.062.750.000	-	100,00%
4	Calles de la Ciudad de Alberdi	5	2.107.000.000	2.107.000.000	-	100,00%
5	Villalbin a Teniente Sanches	8	5.795.641.500	3.744.063.000	2.051.578.500	64,60%
6	Paso Pindo a Apipe	8,5	4.084.313.000	-	4.084.313.000	0,00%
	Total General	57,5	34.040.000.000	27.904.108.500	6.135.891.500	81,97%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

AVANCE	
Mes:	Marzo

CONTRATISTA : CONSORCIO ITACORA

PAVIMENTOS ENRRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - LPN 09 -2022 - ID N° 412.692

CURVA CONTRACTUAL Y AVANCE

	AVANCE FINANCIERO				AVANCE %				DESVÍO + -	
	PREVISTO Gs.		EJECUTADO Gs.		PREVISTO		EJECUTADO			
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%		
nov-22	3.000.000.000	3.000.000.000	3.203.121.500	3.203.121.500	8,81%	8,81%	9,41%	9,41%	0,60%	Ok
dic-22	6.916.215.421	9.916.215.421	6.713.093.500	9.916.215.000	20,32%	29,13%	19,72%	29,13%	0,00%	Ok
ene-23	5.023.784.579	14.940.000.000	2.644.550.000	12.560.765.000	14,76%	43,89%	7,77%	36,90%	-6,99%	atraso
feb-23	3.500.000.000	18.440.000.000	5.149.513.000	17.710.278.000	10,28%	54,17%	15,13%	52,03%	-2,14%	atraso
mar-23	2.000.000.000	20.440.000.000	1.947.250.000	19.657.528.000	5,88%	60,05%	5,72%	57,75%	-2,30%	atraso
abr-23	2.000.000.000	22.440.000.000	1.365.000.000	21.022.528.000	5,88%	65,92%	4,01%	61,76%	-4,16%	atraso
may-23	1.500.000.000	23.940.000.000	1.953.517.500	22.976.045.500	4,41%	70,33%	5,74%	67,50%	-2,83%	atraso
jun-23	1.500.000.000	25.440.000.000	1.124.750.000	24.100.795.500	4,41%	74,74%	3,30%	70,80%	-3,93%	atraso
jul-23	0	25.440.000.000	0	24.100.795.500	0,00%	74,74%	0,00%	70,80%	-3,93%	atraso
ago-23	0	25.440.000.000	0	24.100.795.500	0,00%	74,74%	0,00%	70,80%	-3,93%	atraso
sept-23	0	25.440.000.000	0	24.100.795.500	0,00%	74,74%	0,00%	70,80%	-3,93%	atraso
oct-23	300.000.000	25.740.000.000	0	24.100.795.500	0,88%	75,62%	0,00%	70,80%	-4,82%	atraso
nov-23	401.894.478	26.141.894.478	2.041.098.978	26.141.894.478	1,18%	76,80%	6,00%	76,80%	0,00%	Ok
dic-23	0	26.141.894.478	0	26.141.894.478	0,00%	76,80%	0,00%	76,80%	0,00%	Ok
ene-24	1.000.000.000	27.141.894.478	0	26.141.894.478	2,94%	79,74%	0,00%	76,80%	-2,94%	atraso
feb-24	500.000.000	27.641.894.478	515.400.000	26.657.294.478	1,47%	81,20%	1,51%	78,31%	-2,89%	atraso
mar-24	500.000.000	28.141.894.478	1.246.814.022	27.904.108.500	1,47%	82,67%	3,66%	81,97%	-0,70%	atraso
abr-24	5.898.105.522	34.040.000.000	0	0	17,33%	100,00%	0,00%	81,97%	0,00%	Ok
TOTALES	34.040.000.000				100,00%					

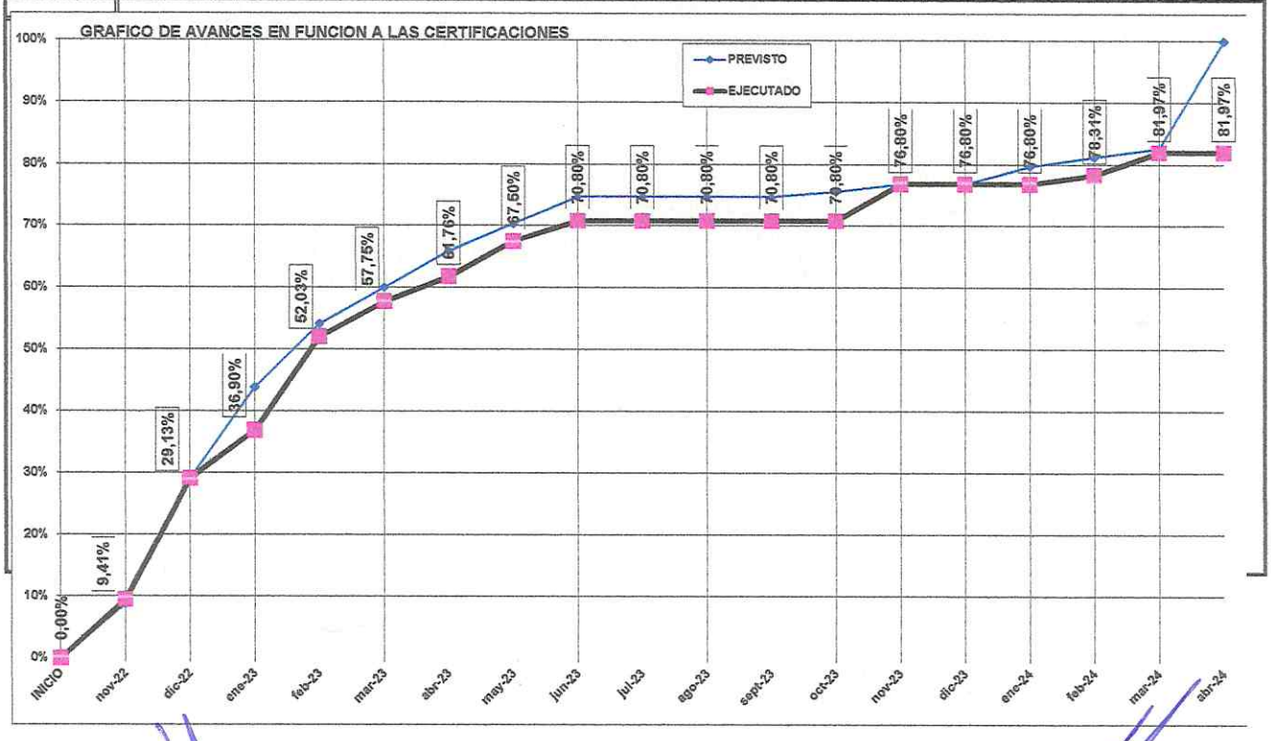

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 11 km - Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Marzo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	10.000.000	30.000.000	3,0	0,0	3,0	0,0	100,0%	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	15.500,0	0,0	15.500,0	0,0	100,0%	348.750.000	0	348.750.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	15.500,0	0,0	15.500,0	0,0	100,0%	348.750.000	0	348.750.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.500	495.000.000	22.000,0	0,0	22.000,0	0,0	100,0%	495.000.000	0	495.000.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	28.000	862.400.000	30.800,0	0,0	30.800,0	0,0	100,0%	862.400.000	0	862.400.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	33.000	2.541.000.000	77.000,0	0,0	77.000,0	0,0	100,0%	2.541.000.000	0	2.541.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	1.050.000	159.600.000	152,0	0,0	152,0	0,0	100,0%	159.600.000	0	159.600.000	0	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml													
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	1.300.000	78.000.000	60,0	0,0	60,0	0,0	100,0%	78.000.000	0	78.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	29,0	0,0	29,0	0,0	100,0%	40.600.000	0	40.600.000	0	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	13.500.000	0	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	570.000.000	570.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	570.000.000	0	570.000.000	0	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				6.095.613.000						6.095.613.000	0	6.095.613.000	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Marzo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	5,3	0,0	5,3	0,0	100,0%	53.000.000	0	53.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	23.858,0	0,0	23.858,0	0,0	100,0%	536.805.000	0	536.805.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	25.161,0	0,0	25.161,0	0,0	100,0%	566.122.500	0	566.122.500	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	54.100,0	0,0	54.100,0	0,0	100,0%	1.217.250.000	0	1.217.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	46.464,0	0,0	46.464,0	0,0	100,0%	1.300.992.000	0	1.300.992.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0	100,0%	4.620.000.000	0	4.620.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	208,0	0,0	208,0	0,0	100,0%	218.400.000	0	218.400.000	0	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	40,0	0,0	40,0	0,0	100,0%	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0%	130.000.000	0	130.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	29,0	0,0	29,0	0,0	100,0%	40.600.000	0	40.600.000	0	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	13.500.000	0	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	8,0	0,0	8,0	0,0	100,0%	4.560.000.000	0	4.560.000.000	0	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				13.894.682.500						13.894.682.500	0	13.894.682.500	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Jullan Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Correspondiente al Mes: Marzo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	22.500	67.500.000	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	100,0%	67.500.000	0	67.500.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	22.500	29.250.000	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	100,0%	29.250.000	0	29.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	100,0%	1.155.000.000	0	1.155.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-				0,0						
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	750.000	168.000.000	224,0	0,0	224,0	0,0	100,0%	168.000.000	0	168.000.000	0	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	1.300.000	91.000.000	70,0	0,0	70,0	0,0	100,0%	91.000.000	0	91.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.062.750.000						0	0	2.062.750.000	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Correspondiente al Mes: Marzo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	22.500	72.000.000	3.200,0	0,0	3.200,0	0,0	100,0%	72.000.000	0	72.000.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	22.500	18.000.000	800,0	0,0	800,0	0,0	100,0%	18.000.000	0	18.000.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	100,0%	1.155.000.000	0	1.155.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-										
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	750.000	180.000.000	240,0	0,0	240,0	0,0	100,0%	180.000.000	0	180.000.000	0	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0%	130.000.000	0	130.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.107.000.000						0	0	2.107.000.000	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922 5-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Correspondiente al Mes: Marzo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	1,0	1,0	2,0	0,0	100,0%	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	22.500	198.922.500	6.000,0	1.500,0	7.500,0	1.341,0	84,8%	135.000.000	33.750.000	168.750.000	30.172.500	84,83%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	22.500	203.175.000	6.000,0	1.800,0	7.800,0	1.230,0	86,4%	135.000.000	40.500.000	175.500.000	27.675.000	86,38%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	22.500	499.095.000	14.632,7	5.367,3	20.000,0	2.182,0	90,2%	329.235.978	120.764.022	450.000.000	49.095.000	90,16%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	28.000	501.536.000	5.000,0	10.000,0	15.000,0	2.912,0	83,7%	140.000.000	280.000.000	420.000.000	81.536.000	83,74%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	33.000	1.848.000.000	0,0	18.500,0	18.500,0	37.500,0	33,0%	0	610.500.000	610.500.000	1.237.500.000	33,04%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	1.050.000	100.800.000	0,0	70,0	70,0	26,0	72,9%	0	73.500.000	73.500.000	27.300.000	72,92%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml			-										
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	1.300.000	52.000.000	0,0	30,0	30,0	10,0	75,0%	0	39.000.000	39.000.000	13.000.000	75,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	20,0	20,0	9,0	69,0%	0	28.000.000	28.000.000	12.600.000	68,97%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	1.200,0	1.200,0	300,0	80,0%	0	10.800.000	10.800.000	2.700.000	80,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	570.000.000	1.710.000.000	2,0	0,0	2,0	1,0	66,7%	1.140.000.000	0	1.140.000.000	570.000.000	66,67%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				5.795.641.500						0	1.246.814.022	3.744.063.000	2.051.578.500	64,60%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Jullan Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8,5 km - Paso Pimdó a Apipe

Correspondiente al Mes: Marzo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0%	0	0	0	20.000.000	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	22.500	483.750.000	0,0	0,0	0,0	21.500,0	0,0%	0	0	0	483.750.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	28.000	476.000.000	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0%	0	0	0	476.000.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	33.000	1.963.500.000	0,0	0,0	0,0	59.500,0	0,0%	0	0	0	1.963.500.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	1.050.000	67.200.000	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0%	0	0	0	67.200.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	750.000	12.000.000	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0%	0	0	0	12.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	1.300.000	42.250.000	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0%	0	0	0	42.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	15.000	7.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	7.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	11.000	5.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	5.500.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	9.000	9.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	9.000.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	552.000.000	0,00%
		TOTAL				4.084.313.000						0	0	0	4.084.313.000	0,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

57,5km - TOTAL GENERAL

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	9,30	1,00	10,30	83,74%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	3,00	0,00	3,00	75,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	45.358,00	1.500,00	46.858,00	82,64%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	52.861,00	1.800,00	54.661,00	84,89%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	92.832,71	5.367,29	98.200,00	80,57%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	82.264,00	10.000,00	92.264,00	82,25%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	287.000,00	18.500,00	305.500,00	75,90%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	360,00	70,00	430,00	82,69%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	504,00	0,00	504,00	96,92%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	330,00	30,00	360,00	89,44%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	85,71%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	58,00	20,00	78,00	67,24%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00	76,36%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	11,00	0,00	11,00	91,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	5,00	0,00	5,00	83,33%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

11 km - Villa Oliva

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	3,00	0,00	3	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	152,00	0,00	152	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml					
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	60,00	0,00	60,0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	29,00	0,00	29	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

20 km Tramo Potrero Pirú

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	23.858,00	0,00	23.858,00	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	25.161,00	0,00	25.161,00	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	46.464,00	0,00	46.464,00	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	208,00	0,00	208,00	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%

Viviana Núñez Carolini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo					Año: 2024			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	100,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml					
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	224,00	0,00	224	100,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	70,00	0,00	70	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo					Año: 2024			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	800,00	0,00	800	100,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml				-	
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	240,00	0,00	240	100,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	100,00	0,00	100	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo					Año: 2024			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	1,00	1,00	2	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	6.000,00	1.500,00	7.500	84,83%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	6.000,00	1.800,00	7.800	86,38%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	14.632,71	5.367,29	20.000	90,16%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	5.000,00	10.000,00	15.000	83,74%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	0,00	18.500,00	18.500	33,04%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	0,00	70,00	70	72,92%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml				-	
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	0,00	30,00	30	75,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	20,00	20	68,97%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200	80,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	2,00	0,00	2	66,67%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8,5km - Paso Pimdó a Apipe

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Marzo					Año: 2024			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO					-	
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370
