GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

RESUMEN DE PAGO

Correspondiente al Mes: Mayo	Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID Nº 412692 - CONTRATO Nº LPN 09-2022

Ítem	Conceptos	Importes Autorizados		Importes certificados					
				Hasta certificado anterior		Presente Certificado		Total certificado a la fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%	34.040.000.000	0,00%	21.022.528.000	0,00%	1.953.517.500	0,00%	22.976.045.500
A.2	Precios Unitarios	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
A	Total Guaranies	0,00%	34.040.000.000	61,76%	21.022.528.000	5,74%	1.953.517.500	67,50%	22.976.045.500

Gobernacion de Ñeembucu

Contrato Nº LPN 09/2022

Monto Gs. 34.040.000.000.-

Contratista: CONSORCIO ITACORA

Fecha de Inicio: 17 - Noviembre - 22

Plazo de Ejecucion (dias): 540

Fecha de Terminación: 17 - Abril - 24

B	Deducciones a la fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.1	Devolución del Anticipo	20,00%	0	0	0	0
B.2	Para fondo de Reparo	5,00%	0	0	0	0
B.3	Otras deducciones		0	0	0	0
BII	Total deducciones		0	0	0	0

Gobernacion de Ñeembucu

Secretaria de Obras Publicas

Mesa de Entrada

C.1	IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	1.953.517.500
C.2	MULTAS	0
C	**IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)**	**1.953.517.500**

SON GUARANÍES: Un mil novecientos cincuenta y tres millones quinientos diez y siete mil quinientos guaranies .----------

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

AVANCE	
Mes:	Mayo

CONTRATISTA : CONSORCIO ITACORA

PAVIMENTOS ENRRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - LPN 09 -2022 - ID N° 412.692

CURVA CONTRACTUAL Y AVANCE

	AVANCE FINANCIERO				AVANCE %				DESVÍO + -	
	PREVISTO Gs.		EJECUTADO Gs.		PREVISTO		EJECUTADO			
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%		
nov-22	3.000.000.000	3.000.000.000	3.203.121.500	3.203.121.500	8,81%	8,81%	9,41%	9,41%	0,60%	Ok
dic-22	6.916.215.421	9.916.215.421	6.713.093.500	9.916.215.000	20,32%	29,13%	19,72%	29,13%	0,00%	Ok
ene-23	5.023.784.579	14.940.000.000	2.644.550.000	12.560.765.000	14,76%	43,89%	7,77%	36,90%	-6,99%	atraso
feb-23	3.500.000.000	18.440.000.000	5.149.513.000	17.710.278.000	10,28%	54,17%	15,13%	52,03%	-2,14%	atraso
mar-23	2.000.000.000	20.440.000.000	1.947.250.000	19.657.528.000	5,88%	60,05%	5,72%	57,75%	-2,30%	atraso
abr-23	2.000.000.000	22.440.000.000	1.365.000.000	21.022.528.000	5,88%	65,92%	4,01%	61,76%	-4,16%	atraso
may-23	1.500.000.000	23.940.000.000	1.953.517.500	22.976.045.500	4,41%	70,33%	5,74%	67,50%	-2,83%	atraso
jun-23	1.500.000.000	25.440.000.000	0	0	4,41%	74,74%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
jul-23	1.500.000.000	26.940.000.000	0	0	4,41%	79,14%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
ago-23	1.000.000.000	27.940.000.000	0	0	2,94%	82,08%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
sept-23	1.000.000.000	28.940.000.000	0	0	2,94%	85,02%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
oct-23	1.000.000.000	29.940.000.000	0	0	2,94%	87,96%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
nov-23	1.000.000.000	30.940.000.000	0	0	2,94%	90,89%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
dic-23	1.000.000.000	31.940.000.000	0	0	2,94%	93,83%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
ene-24	1.000.000.000	32.940.000.000	0	0	2,94%	96,77%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
feb-24	500.000.000	33.440.000.000	0	0	1,47%	98,24%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
mar-24	500.000.000	33.940.000.000	0	0	1,47%	99,71%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
abr-24	100.000.000	34.040.000.000	0	0	0,29%	100,00%	0,00%	67,50%	0,00%	Ok
TOTALES	34.040.000.000				100,00%					

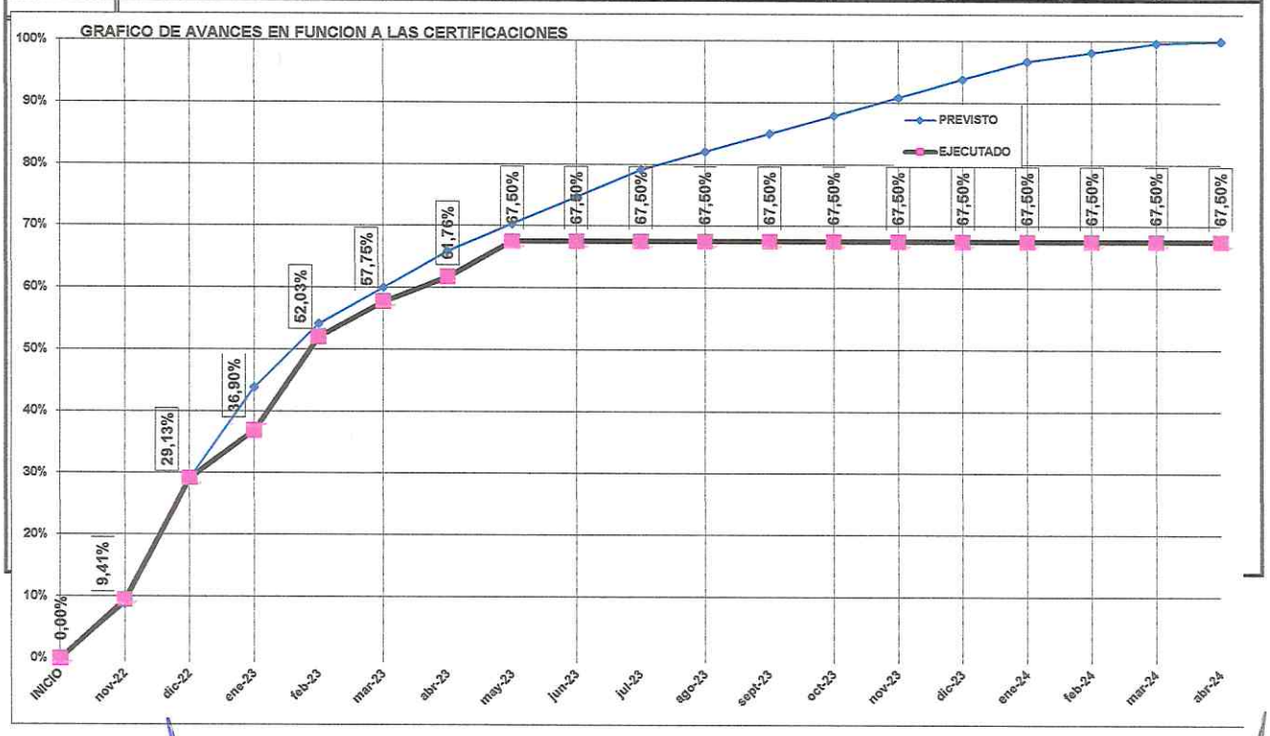

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA RUC 80129225-5

César D. Julian Balcazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA RESUMEN POR TRAMO GENERAL: 57,5 km

Correspondiente al Mes: Mayo	Año: 2023

	Tramos de Caminos a Enrripiar	Km	Costo Guaranies	Ejecutado Guaranies	Saldo Guaranies	Porcentaje de Avance
1	Villa Oliva	11	6.095.613.000,00	5.086.513.000	1.009.100.000	83,45%
2	Potrero Piru	20	13.894.682.500,00	13.344.282.500	550.400.000	96,04%
3	Calles de la Ciudad de Pilar	5	2.062.750.000,00	1.803.750.000	259.000.000	87,44%
4	Calles de la Ciudad de Alberdi	5	2.107.000.000,00	1.797.000.000	310.000.000	85,29%
5	Villalbin a Teniente Sanches	8	5.795.641.500,00	944.500.000	4.851.141.500	16,30%
6	Paso Pindo a Apipe	8,5	4.084.313.000,00	-	4.084.313.000	0,00%
	Total General	57,5	34.040.000.000,00	22.976.045.500	11.063.954.500	67,50%

Viviana Núñez Carbin
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Ba
Representante L
Consorcio ITACO

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 6 TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	9,30	0,00	9,3	3,0	75,6%	93.000.000	0	93.000.000	30.000.000	75,61%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	2,00	0,00	2,00	2,0	50,0%	45.026.000	0	45.026.000	45.026.000	50,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	41.570,00	288,00	41.858,00	14.841,00	73,8%	935.325.000	6.480.000	941.805.000	333.922.500	73,82%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	48.620,00	1.741,00	50.361,00	14.030,00	78,2%	1.093.950.000	39.172.500	1.133.122.500	315.675.000	78,21%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	84.090,00	1.110,00	85.200,00	36.682,00	69,9%	1.892.025.000	24.975.000	1.917.000.000	825.345.000	69,90%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	74.530,00	434,00	74.964,00	37.212,00	66,8%	2.086.840.000	12.152.000	2.098.992.000	1.041.936.000	66,83%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	243.814,00	38.186,00	282.000,00	120.500,00	70,1%	8.045.862.000	1.260.138.000	9.306.000.000	3.976.500.000	70,06%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	546.000.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	390.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	0,00	0,00	0,00	402,50	0,0%	0	0	0	523.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	60,0%	45.000.000	0	45.000.000	30.000.000	60,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	57,1%	22.000.000	0	22.000.000	16.500.000	57,14%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	0,00	29,00	29,00	87,00	25,0%	0	40.600.000	40.600.000	121.800.000	25,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	1.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	27,3%	13.500.000	0	13.500.000	36.000.000	27,27%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	7,00	1,00	8,00	4,00	66,7%	3.990.000.000	570.000.000	4.560.000.000	2.280.000.000	66,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	5,00	0,00	5,00	1,00	83,3%	2.760.000.000	0	2.760.000.000	552.000.000	83,33%
		TOTAL				34.040.000.000						21.022.528.000	1.953.517.500	22.976.045.500	11.063.954.500	67,50%

Viviana Núñez Carloni
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 11 km - Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	10.000.000	30.000.000	3,0	0,0	3,0	0,0	100,0%	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	15.000,0	0,0	15.000,0	500,0	96,8%	337.500.000	0	337.500.000	11.250.000	96,77%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	15.000,0	0,0	15.000,0	500,0	96,8%	337.500.000	0	337.500.000	11.250.000	96,77%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.500	495.000.000	21.000,0	0,0	21.000,0	1.000,0	95,5%	472.500.000	0	472.500.000	22.500.000	95,45%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	28.000	862.400.000	29.500,0	0,0	29.500,0	1.300,0	95,8%	826.000.000	0	826.000.000	36.400.000	95,78%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	33.000	2.541.000.000	75.000,0	0,0	75.000,0	2.000,0	97,4%	2.475.000.000	0	2.475.000.000	66.000.000	97,40%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	1.050.000	159.600.000	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0%	0	0	0	159.600.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml													
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	1.300.000	78.000.000	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0%	0	0	0	78.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	570.000.000	570.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	570.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				6.095.613.000						5.086.513.000	0	5.086.513.000	1.009.100.000	83,45%

Viviana Núñez Carbin
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázo
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	5,3	0,0	5,3	0,0	100,0%	53.000.000	0	53.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	22.570,0	288,0	22.858,0	1.000,0	95,8%	507.825.000	6.480.000	514.305.000	22.500.000	95,81%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	24.020,0	1.141,0	25.161,0	0,0	100,0%	540.450.000	25.672.500	566.122.500	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	52.190,0	910,0	53.100,0	1.000,0	98,2%	1.174.275.000	20.475.000	1.194.750.000	22.500.000	98,15%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	45.030,0	434,0	45.464,0	1.000,0	97,8%	1.260.840.000	12.152.000	1.272.992.000	28.000.000	97,85%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	134.814,0	2.186,0	137.000,0	3.000,0	97,9%	4.448.862.000	72.138.000	4.521.000.000	99.000.000	97,86%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0%	0	0	0	218.400.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	30.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	29,0	29,0	0,0	100,0%	0	40.600.000	40.600.000	0	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	13.500.000	0	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	7,0	1,0	8,0	0,0	100,0%	3.990.000.000	570.000.000	4.560.000.000	0	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				13.894.682.500						12.596.765.000	747.517.500	13.344.282.500	550.400.000	96,04%

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcazo
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	22.500	67.500.000	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	100,0%	67.500.000	0	67.500.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	22.500	29.250.000	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	100,0%	29.250.000	0	29.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	34.000,0	1.000,0	35.000,0	0,0	100,0%	1.122.000.000	33.000.000	1.155.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-				0,0						
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	750.000	168.000.000	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0%	0	0	0	168.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	1.300.000	91.000.000	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0%	0	0	0	91.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.062.750.000						0	33.000.000	1.803.750.000	259.000.000	87,44%

Viviana Núñez Carbin
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	22.500	72.000.000	2.600,0	600,0	3.200,0	0,0	100,0%	58.500.000	13.500.000	72.000.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	22.500	18.000.000	600,0	200,0	800,0	0,0	100,0%	13.500.000	4.500.000	18.000.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	0,0	35.000,0	35.000,0	0,0	100,0%	0	1.155.000.000	1.155.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-										
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	750.000	180.000.000	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0%	0	0	0	180.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.107.000.000						0	1.173.000.000	1.797.000.000	310.000.000	85,29%

Viviana Muñez Caubin
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	1,0	0,0	1,0	1,0	50,0%	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	50,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	22.500	198.922.500	4.000,0	0,0	4.000,0	4.841,0	45,2%	90.000.000	0	90.000.000	108.922.500	45,24%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	22.500	203.175.000	4.000,0	0,0	4.000,0	5.030,0	44,3%	90.000.000	0	90.000.000	113.175.000	44,30%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	22.500	499.095.000	9.000,0	0,0	9.000,0	13.182,0	40,6%	202.500.000	0	202.500.000	296.595.000	40,57%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	28.000	501.536.000	0,0	0,0	0,0	17.912,0	0,0%	0	0	0	501.536.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	33.000	1.848.000.000	0,0	0,0	0,0	56.000,0	0,0%	0	0	0	1.848.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	1.050.000	100.800.000	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0%	0	0	0	100.800.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml			-										
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	1.300.000	52.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	52.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	22.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	11.000.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	570.000.000	1.710.000.000	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0%	0	0	0	1.710.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				5.795.641.500						0	0	944.500.000	4.851.141.500	16,30%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8,5 km - Paso Pimdó a Apipe

Correspondiente al Mes: Mayo | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0%	0	0	0	20.000.000	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	22.500	483.750.000	0,0	0,0	0,0	21.500,0	0,0%	0	0	0	483.750.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	28.000	476.000.000	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0%	0	0	0	476.000.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	33.000	1.963.500.000	0,0	0,0	0,0	59.500,0	0,0%	0	0	0	1.963.500.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	1.050.000	67.200.000	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0%	0	0	0	67.200.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	750.000	12.000.000	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0%	0	0	0	12.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	1.300.000	42.250.000	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0%	0	0	0	42.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	15.000	7.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	7.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	11.000	5.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	5.500.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	9.000	9.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	9.000.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	552.000.000	0,00%
		TOTAL				4.084.313.000						0	0	0	4.084.313.000	0,00%

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

57,5km - TOTAL GENERAL

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	9,30	0,00	9,30	75,61%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	2,00	0,00	2,00	50,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	41.570,00	288,00	41.858,00	73,82%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	48.620,00	1.741,00	50.361,00	78,21%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	84.090,00	1.110,00	85.200,00	69,90%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	74.530,00	434,00	74.964,00	66,83%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	243.814,00	38.186,00	282.000,00	70,06%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	57,14%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	0,00	29,00	29,00	25,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	27,27%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	7,00	1,00	8,00	66,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	5,00	0,00	5,00	83,33%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembuc

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

11 km - Villa Oliva

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	3,00	0,00	3	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000	96,77%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000	96,77%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	21.000,00	0,00	21.000	95,45%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	29.500,00	0,00	29.500	95,78%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	75.000,00	0,00	75.000	97,40%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml					
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	0,00	0,00	0,0	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

20 km Tramo Potrero Pirú

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.570,00	288,00	22.858,00	95,81%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	24.020,00	1.141,00	25.161,00	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	52.190,00	910,00	53.100,00	98,15%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	45.030,00	434,00	45.464,00	97,85%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	134.814,00	2.186,00	137.000,00	97,86%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	29,00	29,00	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	7,00	1,00	8,00	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%

Viviana Núñez Toppin
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	100,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	34.000,00	1.000,00	35.000	100,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml					
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	2.600,00	600,00	3.200	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	600,00	200,00	800	100,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000	100,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml				-	
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

Viviana Núñez Corbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	1,00	0,00	1	50,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	4.000,00	0,00	4.000	45,24%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	4.000,00	0,00	4.000	44,30%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	9.000,00	0,00	9.000	40,57%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml				-	
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	0,00	0,00	-	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8,5km - Paso Pimdó a Apipe

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Mayo					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO					-	
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

Viviana Núñez Cerbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembuc

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370
