PLANO DE MEDICION

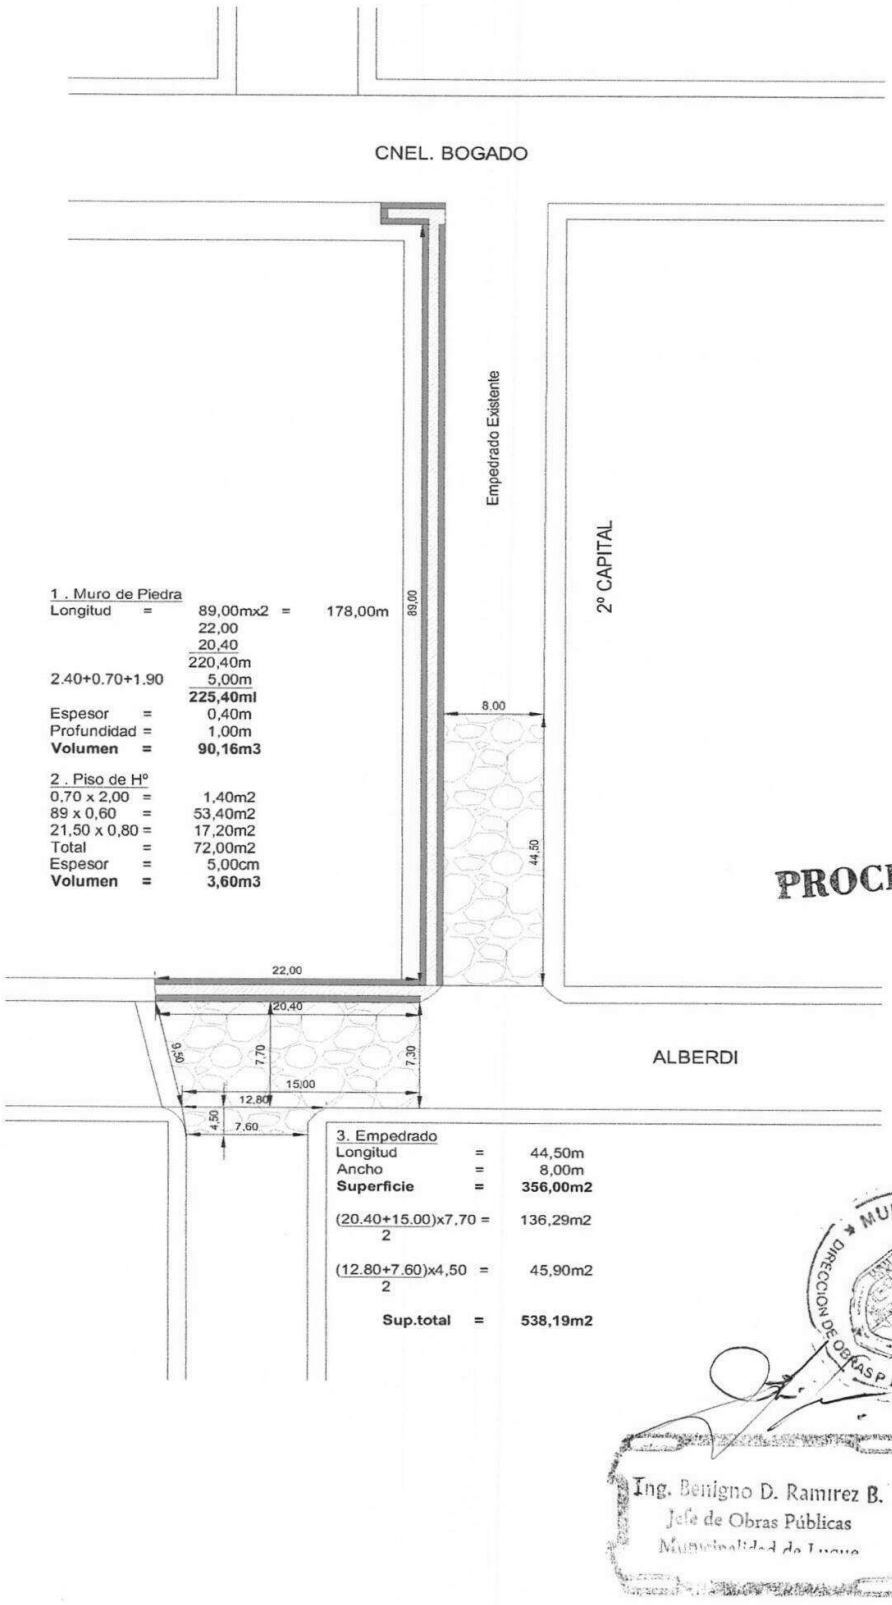

1 . Muro de Piedra

Longitud	=	89,00mx2 =	178,00m
		22,00	
		20,40	
		220,40m	
2.40+0.70+1.90		5,00m	
		225,40ml	
Espesor	=	0,40m	
Profundidad	=	1,00m	
Volumen	=	**90,16m3**	

2 . Piso de Hº

0,70 x 2,00	=	1,40m2
89 x 0,60	=	53,40m2
21,50 x 0,80	=	17,20m2
Total	=	72,00m2
Espesor	=	5,00cm
Volumen	=	**3,60m3**

3. Empedrado

Longitud	=	44,50m
Ancho	=	8,00m
Superficie	=	**356,00m2**
$\frac{(20.40+15.00)}{2}$ x7,70	=	136,29m2
$\frac{(12.80+7.60)}{2}$ x4,50	=	45,90m2
Sup.total	=	**538,19m2**

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS *

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Dos días del mes de Setiembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Sr. Marcelino Vera en representación de la firma MULTISERVIS, a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **"Obras: "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE 2° CAPITAL E/CNEL. BOGADO Y ALBERDI LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE."** Adjudicataria según **Contrato N°59/2022.**Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 01 de Setiembre del 2022 correspondiente al Certificado de Obra N° 1 en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

1. Muro de Piedra

89 x 2	=	178,00ml
		22,00ml
		20,40ml
		220,40ml
2.40 + 0.70 +1.90	=	5,00ml
		225,40ml
Espesor	=	0,40m
Profundidad	=	1,00m
Volumen	=	90,16m3

2. Empedrado

44,50 x 8,00	=	356,00m2
$(\frac{20.40+15.00}{2})$ x7,70	=	136,29m2
$(\frac{12.80+7.60}{2})$ x4,50	=	45,90m2
Total	**=**	**538,19m2**

3. Piso de H°

0,70 x 2,00	=	1,40m2
89 x 0,60	=	53,40m2
21,50 x 0,80	=	17,20m2
Total	**=**	**72,00m2**
Espesor	=	5,00cm
Volumen	**=**	**3,60m3**

PROCESADO

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS *

Contratista.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Fiscalización de Obras.

TOMAS FOTOGRAFICAS

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

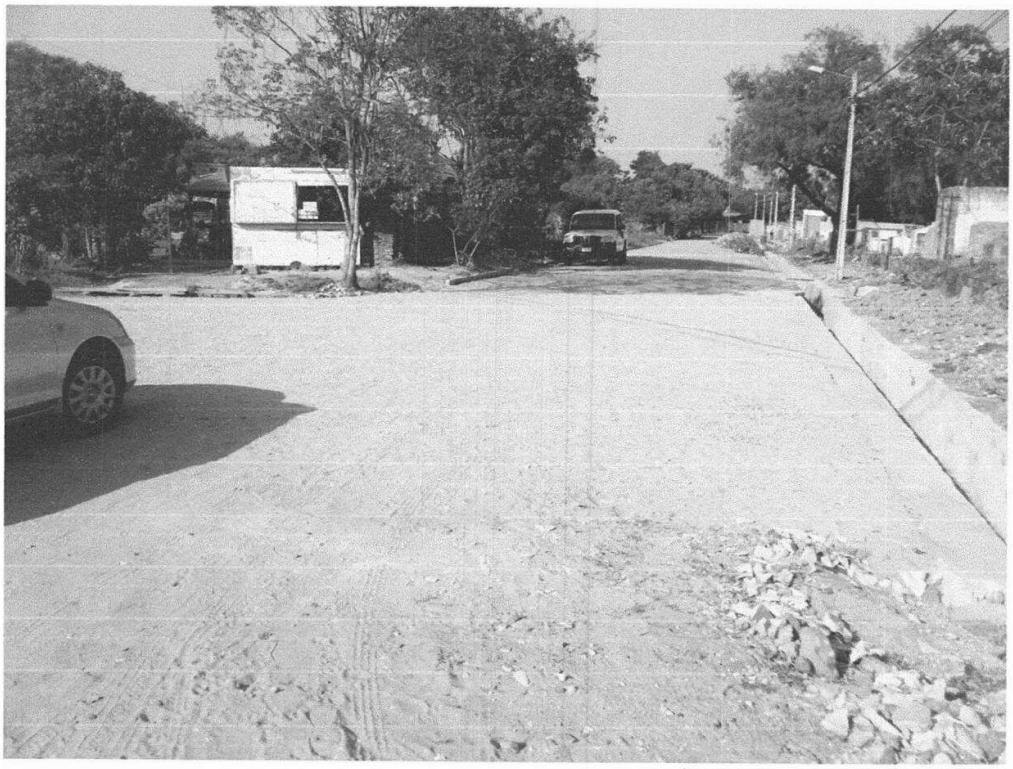

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
