COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 29 de DICIEMBRE 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 02

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 01** del ***Contrato* 98/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (480.683.371).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	480.683.371
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	24.034.169
RETENCION IVA 30%	13.109.546
TOTAL NETO	**443.539.656**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

.....
Juan Bautista Pérez Bolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3618
FECHA 29-12-23 HORA 11:31
CANT HOJAS 6
NUMERO DE CEL:
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 2

ID N°: 435.207

DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	832.761.087	42,28%	57,72%	100,00%	352.077.716	480.683.371	832.761.087
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	41.638.054	2,11%	2,89%	5,00%	17.603.886	24.034.169	41.638.054
B	TOTAL DEDUCCIONES	41.638.054	2,11%	2,89%	5,00%	17.603.886	24.034.169	41.638.054
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	791.123.033	40,16%	54,84%	95,00%	334.473.830	456.649.203	791.123.033

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

REPRESENTANTE LEGAL COPCI S.A.
COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

DIRECCION DE OBRAS DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD
ZONA: KM 5
ID Nº:435.207

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/12/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº2

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	6.512	5.700	37.118.400	6512	0	6512	100%	Unidad	37.118.400	0	37.118.400
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	6.512	5.900	38.420.800	6512	0	6512	100%	Unidad	38.420.800	0	38.420.800
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.384	38.000	52.592.000	480	904	1384	100%	Unidad Medida Global	18.240.000	34.352.000	52.592.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	68,22	1.845.670	125.911.607	19,8	48,42	68,22	100%	Metros cuadrados	36.544.266	89.367.341	125.911.607
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	29,6	2.117.300	62.672.080	12,5	17,1	29,6	100%	Metros cuadrados	26.466.250	36.205.830	62.672.080
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.860	54.480	319.252.800	2400	3460	5860	100%	Metros cuadrados	130.752.000	188.500.800	319.252.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	5.860	5.890	34.515.400	2400	3460	5860	100%	Metros cuadrados	14.136.000	20.379.400	34.515.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	5.860	4.100	24.026.000	0	5860	5860	100%	Metros cúbicos	0	24.026.000	24.026.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena)	Metros cuadrados	6.512	21.000	136.752.000	2400	4112	6512	100%	Metros cúbicos	50.400.000	86.352.000	136.752.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				832.761.087				100,00%		352.077.716	480.683.371	832.761.087

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	480.683.371
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	24.034.169
* Total certificado del mes	Gs.	456.649.203
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	456.649.203

CONTRATISTA FECHA DE APROBACIÓN: _29_/12_/_2023_ FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Delgado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 2

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD
ZONA KM 5
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 28/12/2023
ID N°: 435.207

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	6.512	6512		6.512,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	6.512	6512		6.512,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.384	480	904	1.384,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	68,22	19,8	48,42	68,22	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	29,6	12,5	17,1	29,60	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.860	2400	3460	5.860,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	5.860	2400	3460	5.860,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	5.860	0	5860	5.860,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena)	Metros cuadrados	6.512	2400	4112	6.512,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1	0	1	1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Saltos del Guairá, 30 de enero de 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD ´´** con ID: N.º 435.207 Contrato N.º 98/2023, adjudicada a **COPCI SA.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Brugado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero CIVIL
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD

UBICACIÓN: BARRIO FRACCION MORAN

ID NRO: 435.207

CONTRATO NRO: 98/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 02 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Delgado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 30 **DE** ENERO **DE** 2.024

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000307

OBRA: Construcción de Pavimento petreo Fraccion Moran Frente a Senad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 12/01/24

LICITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 13/11/2023 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fraccion Moran Frente a la Senad Km 5

AVANCES DE OBRA

cargamento de baden y colocacion de cordon y cargamento de cuneta

15/01/24 Acopio de materiales, trabajo normales

17/01/24 Extencion de colchon de Arena para acionto de piedra

19/01/24 Colocacion de pavimento petreo

20/01/24 compactacion manual de pavimento petreo colocado

22/01/24 Fabricacion de cordon y carga de Baden

24/01/24 Colocacion de cordon y carga de cuneta

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Espinola Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000308

OBRA: Construcción de pavimento Petreo Fracción Moran Frente a Senad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 26/01/24

LICITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 13/11/2023 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fraccion Moran Frente ala Senad Km5

AVANCES DE OBRA

Colocacion de pavimento Petreo, Avances normales

28/01/24 compactacion de pavimento petreo y limpieza final

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

XOMA

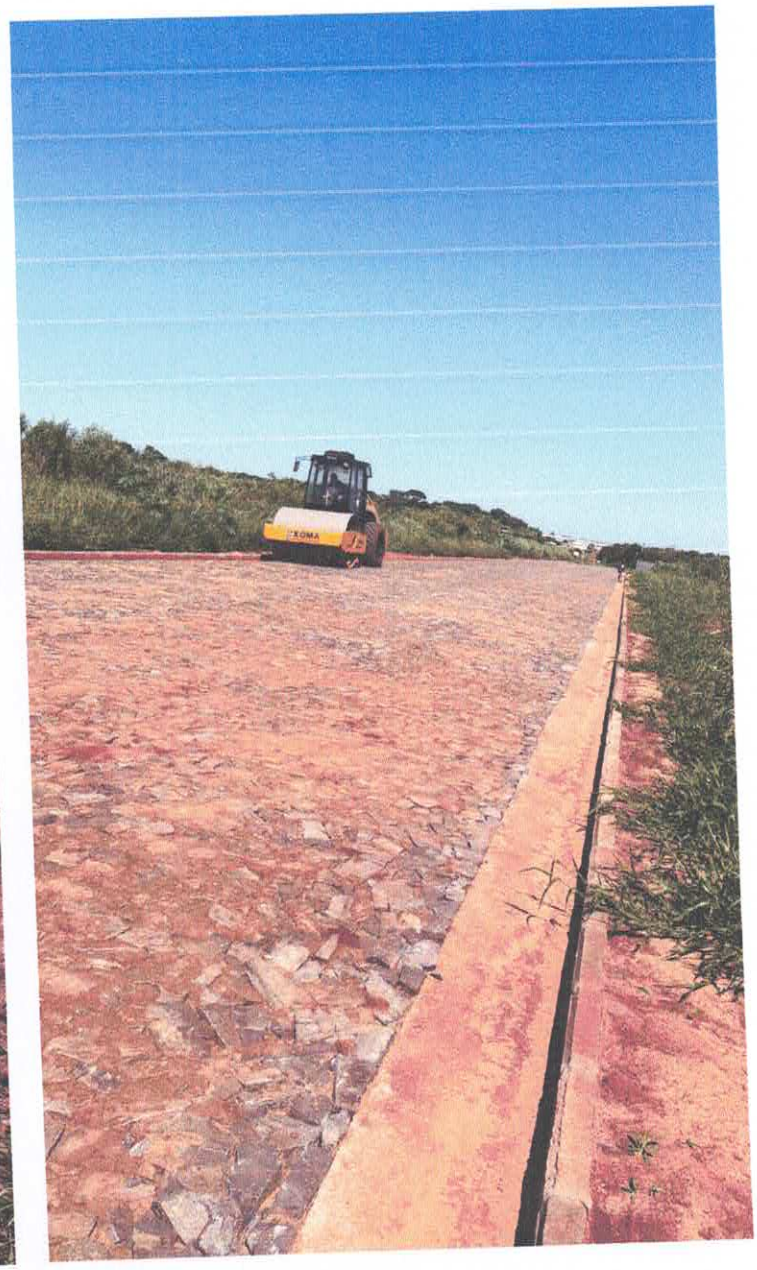
XOMA
