GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 38/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YATYTAY KM 17 – PLURIANUAL – I.D. N° 437.023

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	L.C.D. N° 38/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YATYTAY KM 17 – PLURIANUAL – I.D. N° 437.023	100%	139.183.032	0,00%	0	29,26%	40.719.525	29,26%	40.719.525
A	**Total por Contrato**	**100%**	**139.183.032**	**0,00%**	**0**	**29,26%**	**40.719.525**	**29,26%**	**40.719.525**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	27.836.606	0	8.143.905	8.143.905
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**27.836.606**	**0**	**8.143.905**	**8.143.905**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				32.575.620	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**32.575.620**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**58/2023**
Monto Básico:	**139.183.032**
Contratista:	Dionel Olmedo Núñez
Fecha de Inicio:	**22-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90**
Fecha de terminación prevista:	**21-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Treinta y dos millones, quinientos setenta y cinco mil, seiscientos veinte.----------

Dionel Olmedo Núñez
Contratista - Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel:0985-910439

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 38/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YATYTAY KM 17 – PLURIANUAL – I.D. N° 437.023			
CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	139.183.032	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	21-mar-24
CONTRATO N°:	58/2023	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
L.C.D. N° 38/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YATYTAY KM 17 – PLURIANUAL – I.D. N° 437.023							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metro lineal	425	7.543	3.205.775	0,023	0,00%	0,24%	0,24%		0,000	0,000	0,00	1	1,00	0	7.543	7.543
2	"Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-"	Unidad Medida Global	1	933.438	933.438	0,007	0,00%	100,00%	100,00%		0,007	0,007	0,00	1	1,00	0	933.438	933.438
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad Medida Global	1	4.261.729	4.261.729	0,031	0,00%	100,00%	100,00%		0,031	0,031	0,00	1	1,00	0	4.261.729	4.261.729
4	Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-"	Metros cuadrados	574,6	5.999	3.447.025	0,025	0,00%	30,00%	30,00%		0,007	0,007	0,00	172,38	172,38	0	1.034.108	1.034.108
5	Colocacion de hormigon armado -"CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ ."	Metros cúbicos	40,8	851.071	34.723.697	0,249	0,00%	28,68%	28,68%		0,072	0,072	0,00	11,7	11,70	0	9.957.531	9.957.531
6	Colocacion de hormigon armado - "CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.-"	Metros cúbicos	0,84	908.094	762.799	0,005	0,00%	30,00%	30,00%		0,002	0,002	0,00	0,252	0,25	0	228.840	228.840
7	Construcción de empedrado - "Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-"	Metros cuadrados	2.873	29.107	83.624.411	0,601	0,00%	27,52%	27,52%		0,165	0,165	0,00	790,7187	790,72	0	23.015.449	23.015.449
8	Relleno y compactación para soporte de cordón.	Metros cúbicos	136	31.378	4.267.408	0,031	0,00%	30,00%	30,00%		0,009	0,009	0,00	40,8	40,80	0	1.280.222	1.280.222
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	2.975	1.330	3.956.750	0,028	0,00%	0,02%	0,02%		0,000	0,000	0,00	0,5	0,50	0	665	665
Total					139.183.032	100,00%				0,00%	29,26%	29,26%				0	40.719.525	40.719.525

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel:0985-910459

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

4/wabo/

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 38/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YATYTAY KM 17 – PLURIANUAL – I.D. N° 437.023

Contrato N°: 58/2023			
Monto del Contrato:	139.183.032	**Fecha de terminación prevista:**	21-mar-24
Plazo Contractual:	90	**Prórroga:**	
Inicio de Obra:	22-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	10.379.317	10.379.317	10.379.317	10.379.317	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%
Enero	35.880.917	46.260.234	30.340.208	40.719.525	25,78%	33,24%	21,80%	29,26%
Febrero	56.787.019	103.047.253		40.719.525	40,80%	74,04%		29,26%
Marzo	36.135.779	139.183.032		40.719.525	25,96%	100,00%		29,26%

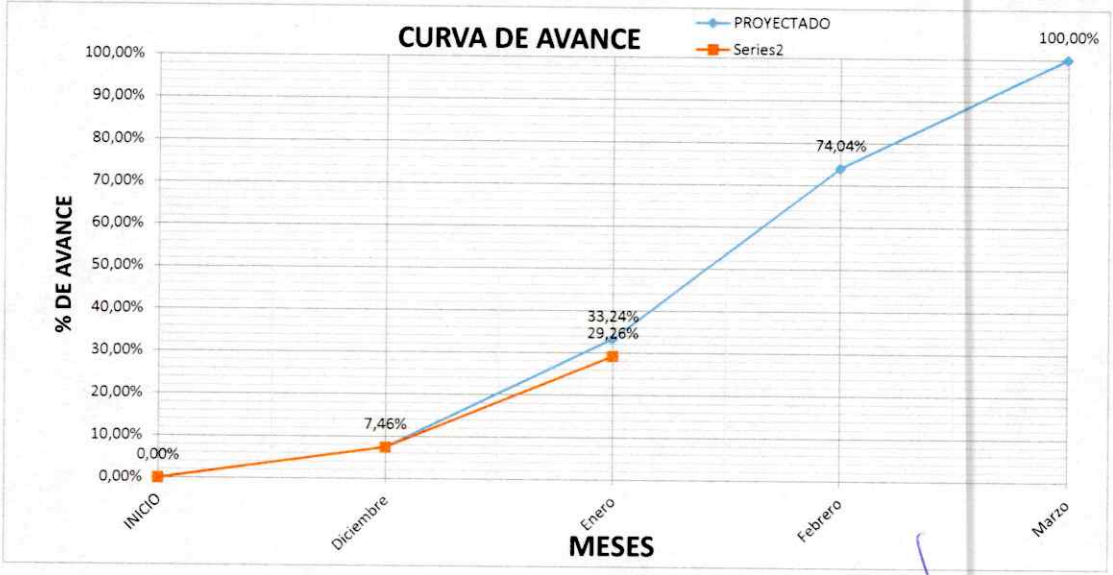

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel:0985-910459

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

5/cinco

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 01 – CERTIFICADO N° 01 DICIEMBRE-ENERO 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 38/2023: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YATYTAY KM. 17" – PLURIANUAL – Contrato N° 58/2023 - I. D. N° 437.023

OBRA: Construcción de Empedrado
BENEFICIARIO: Barrio San Antonio de Yatytay Km. 17
FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni
FECHA DE VISITA: 31/Enero/2024
AVANCE DE OBRA: 29,26%
FISCAL A CARGO: Ing. Fernando Oreggioni

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Construcción de Empedrado en el Barrio San Antonio – Km 17	Yatytay	139.183.032 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Dionel Olmedo Núñez	0985-910-459	58/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	22/12/2023	21/03/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 31/01/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos: replanteo y marcación, colchón de tierra, cordones, relleno y compactación y empedrado.

El avance hasta la fecha es de 29,26%, según su cronograma físico financiero correspondiente a los meses de diciembre y enero.

La ejecución se está dando de forma continua y rápida, cumpliendo los plazos establecidos y las exigencias de calidad de la obra.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

.....
Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte

6/Feb/24

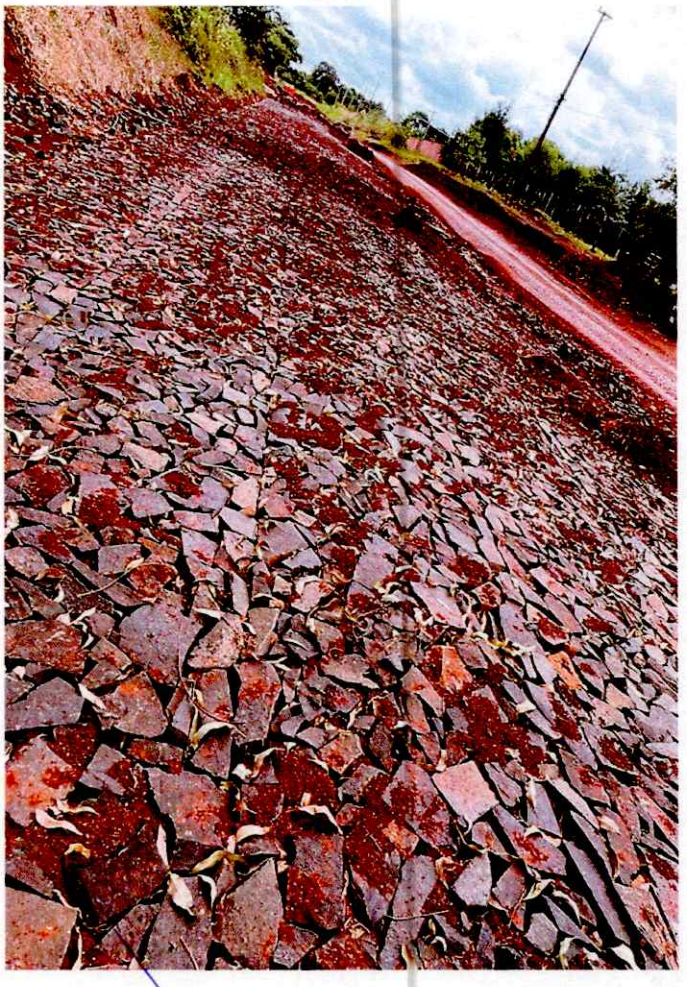

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +595712043868
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

7/siete)
