TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motoyondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC

CERTIFICADO DE OBRAS
OCTUBRE 2022

EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
CONTRATO N° 21/2021
LPN N° 05/2021 - ID 388.700

COLEGIO NACIONAL NACIONES UNIDAS (2da Etapa) - Asunción

ITEM DE CONTRATO	ITEMS UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	Precio PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	Precio total	Avance físico Anterior	Avance físico Presente	Avance físico Acumulado	Monto Certificado Anterior	Monto Certificado Presente	Monto Certificado Total
	1	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS										
	1.1	**Preparación de la Obra**										
	1.1.1	Vallado perimetral protección de obras de... (madera/chapa)	m2	10	170.000	1.700.000	-	10,00	10,00	-	1.700.000	1.700.000
	1.2.2	Remoción de canaletas y bajadas	ml	8,8	20.000	176.000	-	8,80	8,80	-	176.000	176.000
	1.2.3	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	89	50.000	4.450.000	-	89,00	89,00	-	4.450.000	4.450.000
	1.2.24	Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupil)	m2	89	30.400	2.705.600	-	89,00	89,00	-	2.705.600	2.705.600
	1.10.5	De chapa con estruct. metálica, chapa termoacústica	m2	130	385.000	50.050.000	-	130,00	130,00	-	50.050.000	50.050.000
	1.11.1	Interior y Exterior de muros a 1 capa	m2	120	54.900	6.588.000	-	120,00	120,00	-	6.588.000	6.588.000
	1.14.4	Carpeta de regularización-Alisada de cemento (1:3)	m2	50	35.000	1.750.000	-	50,00	50,00	-	1.750.000	1.750.000
	1.20	**Vidrios dobles**					-	-	-	-	-	-
	1.20.1	Vidrios dobles 4mm	m2	30	320.000	9.600.000	-	-	-	-	-	-
	1.41.6	Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriatico	m2	8	100000	800000	-	8,00	8,00	-	800.000	800.000
	1.41.7	Limpieza de revestido de azulejos con ácido muriatico	m2	150	60000	9000000	-	150,00	150,00	-	9.000.000	9.000.000
	1.42	Limpieza					-	-	-	-	-	-
	1.42.1	Limpieza final	m2	20	12.000	240.000	-	18,00	18,00	-	216.000	216.000
	1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	m3	5	40.000	200.000	-	4,00	4,00	-	160.000	160.000
				Total		87.259.600				0	77.595.600	77.595.600

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dirección de Infraestructura

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0986) 450 - 245

SENDERO S.A.
Carmen Desvars
Representante Legal

COLEGIO NACIONAL E.M.D. NACIONES UNIDAS – 2DA. ETAPA

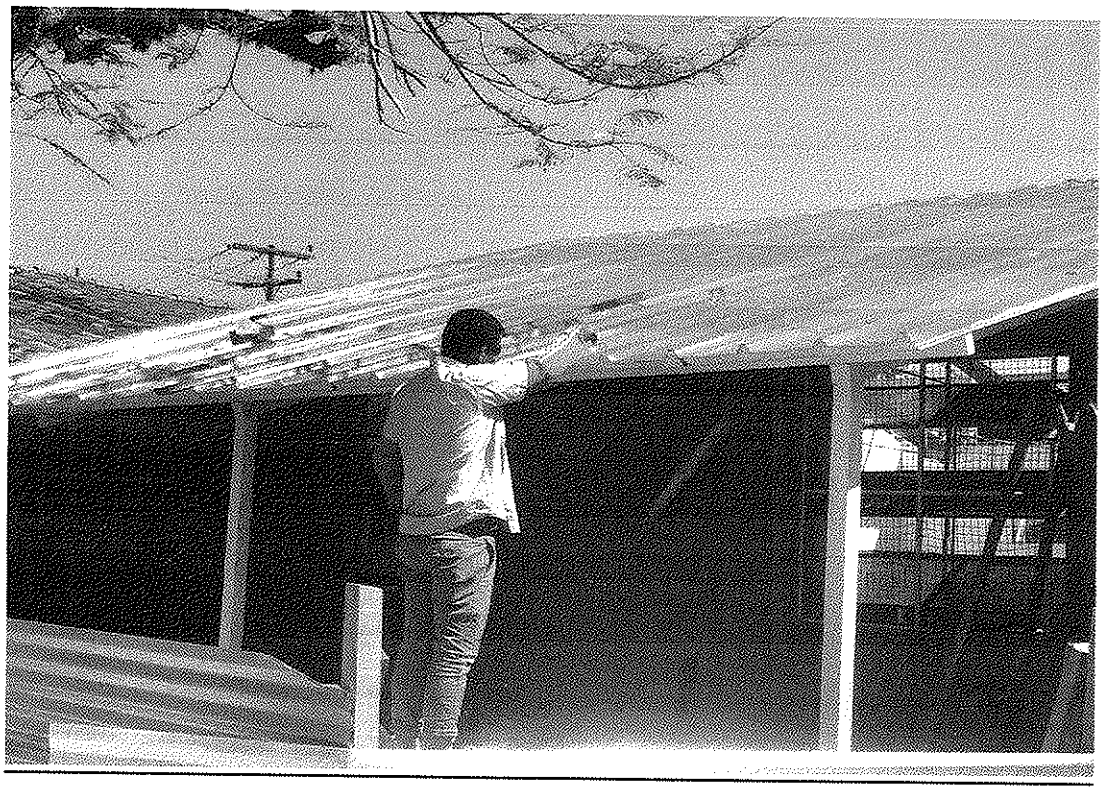

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dirección de Infraestructura

SENDERO S.A.
Carmen Desvars
Representante Legal

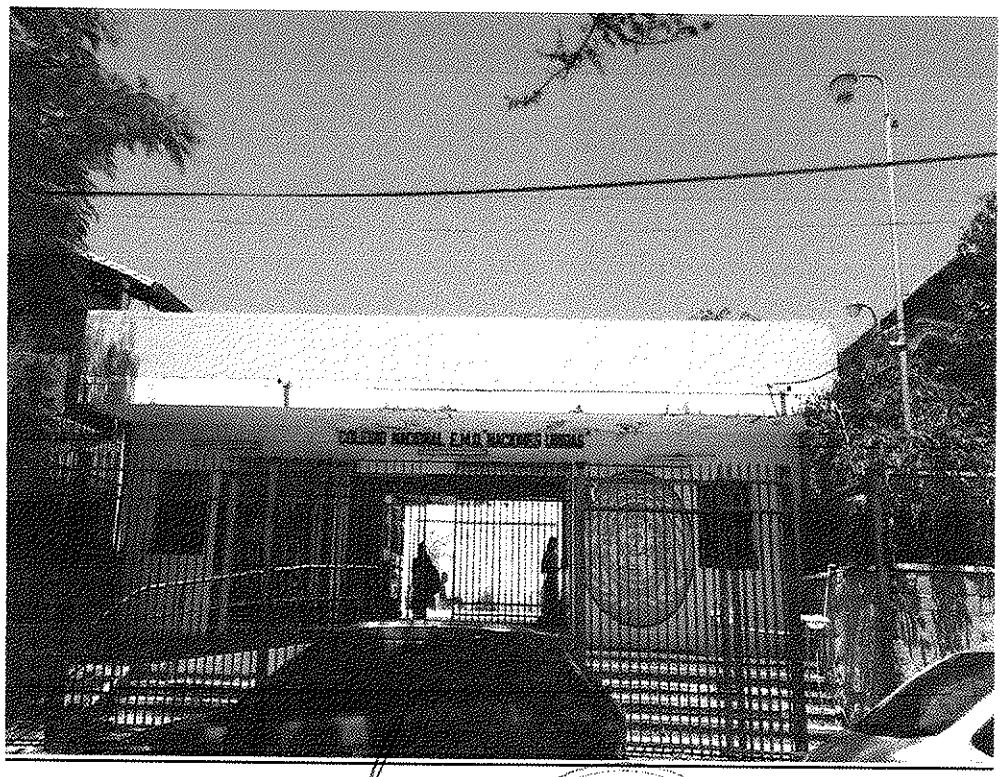

Carmelo Desvars
Representante Legal
