Informe Técnico de Fiscalización N° 40/2023

A: Arq. Adrián González.
Director de Obras Públicas Municipales.

De: Ing. Benigno Ramírez
Fiscal de obras-

Ref.: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE". Adjudicado según contrato N°26/2023.

Fecha: 16/07/2023.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras correspondiente al **CONTRATO DE OBRA N° 26/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN A CONTRATACION DIRECTA N°26/2023 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 430019,** adjudicada a la firma **LBB CONSTRUCCIONES,** a fin de informar los avances de los trabajos realizados hasta la fecha en el marco del contrato detallado anteriormente, y el estado de los mismos en relación al cronograma de ejecución presentado por la empresa contratista. Se aprovecha la ocasión para informar un total del 100% de avance ejecución de la adenda ampliatoria.

Dicho esto, se cumple en informar que los trabajos ya ejecutados por parte de la empresa contratista los cuales forman parte de los rubros ampliatorio. Se han cumplido en cabalidad todo lo plasmado contractualmente en cuanto a la construcción de Badenes y Muro de contención.

El avance ha sido en tiempo y forma y con normalidad.

Para el efecto se presenta los siguientes documentos respaldatorios.

- Acta de Medición.
- Tomas Fotográficas.
- Planos de medición.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCESADO
Es mi informe

Ing. Benigno D. Ramírez B.
de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Dieciséis días del mes de Julio del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Sr. Leopoldo Benítez en representación de la firma LBB CONSTRUCCIONES, a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **"Obras: "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE LUQUE."** Adjudicataria según **Contrato N° 26/2023**. Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 15 de Julio del 2023 correspondiente al Certificado de Obra N° 2 Addenda Ampliatoria y Modificatoria en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

Empedrado

A1 = CALZADA 1	SUPERFICIE 52,00 X 6	=	312,00m2
BOCACALLE SUP. =	$\frac{(9,60 + 6,00)}{2}$ X 2,30	=	17,94m2
	Sub Total	=	**329,94m2**

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Contratista.

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Barrero
RUC 945.927.8

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno Ramirez L
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Fiscalización de Obras.

PROCESADO

PLANO DE MEDICION

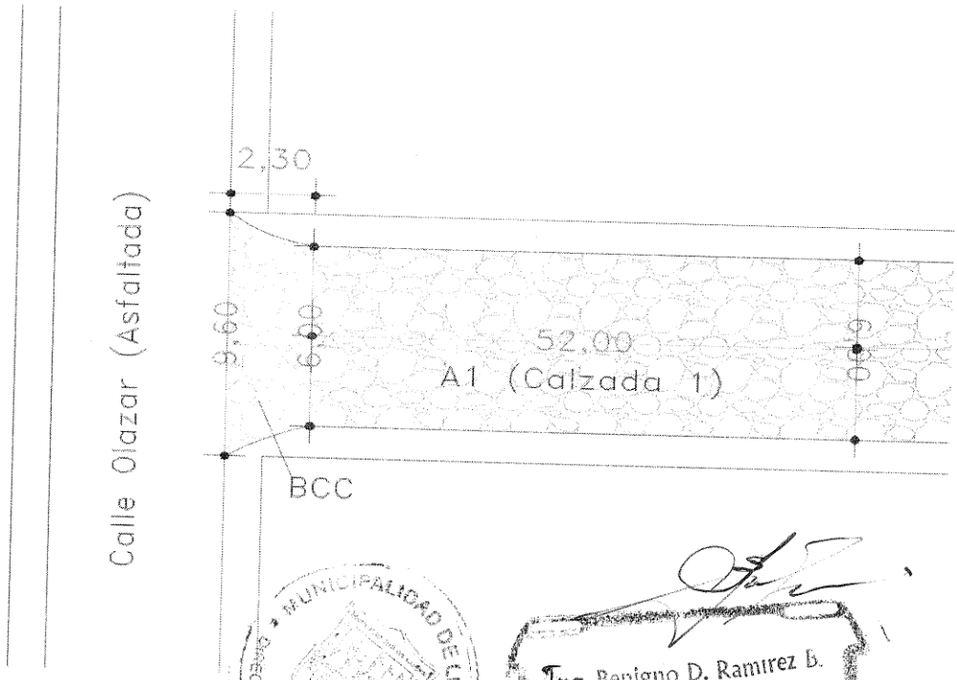

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO

MISIÓN: Brindar servicios de Calidad con Equilibrio entre el desarrollo humano económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

TOMAS FOTOGRAFICAS

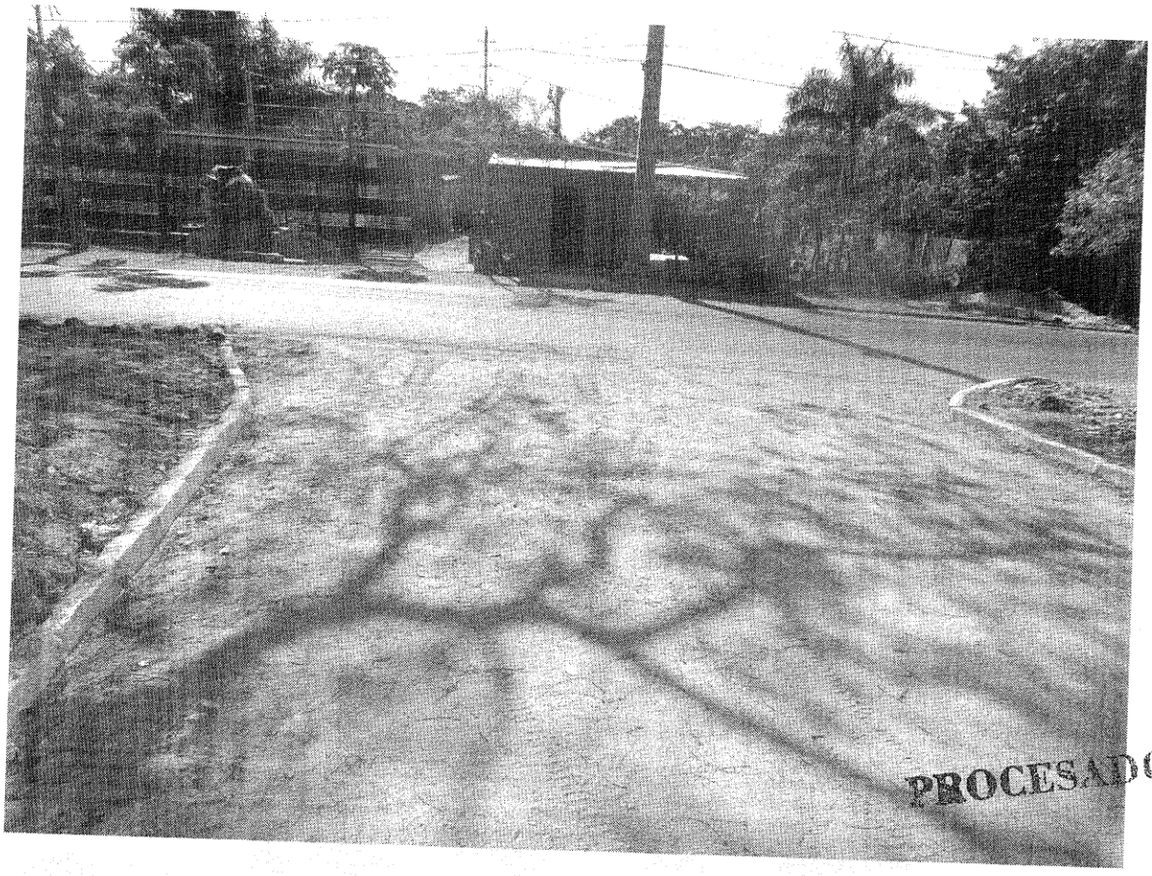

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez L
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
