Proyec 822 STF 74/2022

25/04/2022 10:22

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 3336 **Año:** 2022

Fecha 25/04/2022 **Fecha Ingreso:** 25/04/2022

Fecha Límite: 25/04/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: MEMO N°532 CPI

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Aprobación de Certificados de Obras N°6 de la orden de servicio N°2.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Enrique	Enrique	25/04/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Enrique	CAF	25/04/2022	Coordinación de	Pendiente	

CAF
U.E.P.P. - M.E.C.
Exp. Nº 3336
Recibido por: Milagros

DIA	MES	AÑO	HORA
25	04	22	11:57

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mokonondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

UEPP MEC			
Exp. Nº: 3336			
Recibido por: Liz			
DIA	MES	AÑO	HORA
25	ABR	2022	10:58

MEMORANDUM C.P.I. Nº 532/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Aprobación de Certificado de Obras N° 6 de la orden de servicio N°2.**

Fecha: 25/04/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**ENGINEERING SAECA**	**CONTRATO N°**	41/2020
DEPARTAMENTO	MISIONES	**LOTE N°**	16
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL	Arq. Adrián Dávalos	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA).	
SUPERVISIÓN	Arq. Rubén Duarte	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°:9535/2021
ANTICIPO	SI	PLAZO FINAL	3/01/2022
F.C. CONTRATO	SI	MONTO DE CONTRATO	4.661.326.649
C. T. RIESGO	SI	AVANCE FISICO ACUM.	78,45%
D. TERCEROS	SI	AVANCE FISICO MES	11,62%
OBSERVACIONES:		MONTO DE MULTA	0
		MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
		MONTO NETO DE CERTIFICADO	307.552.132
		MONTO ACUMULADO	2.768.914.564
		ANTICIPO FINANCIERO	932.265.330
		ANTICIPO FINANCIERO | SALDO	378.482.417
		FONDO DE REPARO ACUMULADO	138.445.729

Se establece: dar por **APROBADO** el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa ENGINEERING SAECA; así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes" y da por **APROBADO** el Certificado N° 06 de la Orden de Servicio N° 02.

ELABORADO POR: FELIX DUARTE **VERIFICADO POR: RUBEN DUARTE**

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Moteenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

VERIFICACION DE EXPEDIENTES."CERTIFICADOS"

FECHA	NUMERO DE CERTIFICADO	V° B° - UNIDAD DE CERTIFICACION
8/11/2021	Cert. N°6 O.S 2	Guillermo Godoy ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA:	Enginnering S.A.E.C.A
CONTRATO N°:	41/2020
ID N°:	360.254
LOTE:	16
DEPARTAMENTO:	Misiones

Nº	Documentos	Código	Contiene Si/No	Obs
1	Nota de aprobación de los Certificados y solicitud de trámite de pago según proforma adjunta a este manual (en carácter de Declaración Jurada) Original	PRO-006	SI	
2	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – Original.	PRO-014	SI	
3	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado.	PRO-005	SI	
4	Certificados – Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado (Planilla de cómputo).	PRO-005	SI	
5	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable).	PRO-003	SI	
6	Certificado de Contabilización de Plazos como producto del análisis de los días de lluvia u otro evento consignado en los libros de obras, cálculo de multa si correspondiera y el Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.	PRO - 004	SI	
7	Cronograma Físico-Financiero – Aprobado y debidamente firmado.	PRO - 014	SI	
8	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – Aprobado y debidamente firmado.	PRO - 015	SI	
9	Formulario FC Nº 09 – Hoja de Costos de Inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del Fiscal de Obras y el Representante Legal de la Fiscalizadora.	FC Nº 09	SI	
10	**Libro de Obras, entrega de fojas a la contratante.**	-	SI	
11	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución).	-	SI	
12	Pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo).	-	SI	

05/11/2021 12:26

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 9535 **Año:** 2021

Fecha 05/11/2021 **Fecha Ingreso:** 05/11/2021

Fecha Límite: 05/11/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>FEEI>BIENES Y SERVICIOS>

Referencia: NOTA 0497 UNCA

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remitir Certificado N° 06 de servicios N° 2, correspondiente al Lote 16, presentado por la empresa Contratista ENGINEERING. Anexa 2 biblioratos.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Natalia	Natalia	05/11/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Natalia	Infraestructur	05/11/2021	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

MEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 1103
Firmado por: LUSDAS

DIA	MES	AÑO	HORA
08	11	2021	08:25

ABOG. ALISSON

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"CONSTRUCCIONES,AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU** PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO 6 ORDEN DE SERVICIO 2 **PRO - 006**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY

NOTA UNCA/MEC N° 497 /2021 / LOTE 16

Coronel Oviedo, 05 de noviembre de 2021

Ing. Zoilo Benítez
Coordinador de Proyectos de Infraestructura
Presente:

Nos dirigimos a Usted, a fin de **Aprobar y Solicitar** el pago del **Certificado 6- Orden de Servicio N° 2**, correspondiente al **Lote N° 16**, presentado por la Empresa Contratista ENGINEERING S.A.E.C.A., a través de Nota, como adjudicataria de la Obra del Llamado LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"

Los datos del Contrato que rige, para el presente pedido de pago son los siguientes:

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado N° 06 – Orden de Servicio N° 02.
2	Descripción de la Obra	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI– Plurianual - ID N° 360.254
3	N° de Contrato	41/2020
4	Resolución de Adjudicación N°	Resolución MEC UEPP N° 437 – 10 de Diciembre 2020
5	Lote	16
6	Departamento	Misiones
7	Cantidad de Establecimientos	14
8	Contratista	ENGINEERING S.A.E.C.A.
9	Fiscalización	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
10	Plazo: Orden de Servicio 1	30 días
11	Plazo: Orden de Servicio 2	150 días
12	Fecha de Contrato	11 de Diciembre 2020
13	Orden de Servicio 1	29/12/2020

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 9535
Recibido por: Natalia
DIA | MES | AÑO | HORA
05 NOV 2021 | 11:50

Dirección: Carmelo Peralta e/ Juan A. Benítez, Cnel. Oviedo.
Teléfono: 0521 204 666
http://www.unca.edu.py/
e-mail: framirez@fctunca.edu.py

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

14	Orden de Servicio 2	06/04/2021
15	Inicio Plazo de Ejecución	07 de abril 2021
16	Obras Iniciadas	12
17	Fondo de reparo	20.503.476. Gs.
18	Cronograma fisico-financiero	Aprobado
19	% de Avance Físico Financiero	(78,45% acumulado) - (11,62% del mes)
20	Monto máximo del contrato Lote 16	4.661.326.649.Gs.
21	Monto de Proyecto Ejecutivo	3.529.125.559.Gs.
22	Monto Certificado acumulado	2.768.914.564.Gs.
23	Monto Certificado en el mes	410.069.510.Gs.
24	Monto neto a pagar	307.552.132.Gs.

Conforme a la Planilla de Resumen del **CERTIFICADO 6- Orden de Servicio N°2, LOTE N° 16,** el monto a ser pagado es de guaraníes:**(Gs.307.552.132.)**
GUARANÍES TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS GUARANIES.
En cumplimiento de los deberes y responsabilidades delegados a nuestra empresa fiscalizadora, mediante convenio celebrado con este ministerio, representada por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos como instancia de Gerencia de Obras; y en virtud de la Fiscalización de las Obras del Contrato **N° 41/2020,** manifestamos en carácter de **Declaración Jurada** que de conformidad a las Cláusulas contractuales que rigen para la contratista y los Términos de Referencias que rigen nuestros servicios, y además documentos suscritos en dicho marco, que el presente pedido de pago se ajusta plenamente al Contrato firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la empresa contratista ENGINEERING S.A.E.C.A., y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y en consecuencia CERTIFICADOS por nuestra firma, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de este trámite.
Así mismo, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes.
Por los tramites de rigor, se adjuntan, las siguientes documentaciones en el Orden siguiente:

1	Nota de aprobación de los Certificados y solicitud de trámite de pago según proforma adjunta a este manual (en carácter de Declaración Jurada) – original
2	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – Original

Dirección: Carmelo Peralta e/ Juan A. Benítez, Cnel. Oviedo.
Teléfono: 0521 204 666
http://www.unca.edu.py/
e-mail: framirez@fctunca.edu.py

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

3	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Certificados – Identificando Lote - N° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
5	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N° - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
6	Certificado de Contabilización de Plazos como producto del análisis de los días de lluvia u otro evento consignado en los libros de obra y el Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.
7	Cronograma Físico-Financiero – Aprobado y debidamente firmado
8	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – Aprobado y debidamente firmado
9	Formulario FC N° 09 – Hoja de Costos de Inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del Fiscal de Obras y el Representante Legal de la Fiscalización.
10	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
11	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)

Esta fiscalización luego de verificar las correcciones solicitadas a la contratista, da por APROBADO el CERTIFICADO N° 6 de la Orden de Servicio N° 2 – Contrato N° 41/2020 – Empresa ENGINEERING S.A.E.C.A, para su remisión a efectos de elevar a las instancias correspondientes a fin de realizar el pago.

- Entregada a la Unidad de Fiscalización en fecha **06/10/2021**.
- Pedido de Correcciones por nota UNCA/ENGINEERING N° 61/2021 en fecha **21/10/2021.**
- Correcciones entregadas a la Unidad de Fiscalización en fecha **25/10/2021.**

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Dirección: Carmelo Peralta e/ Juan A. Benítez, Cnel. Oviedo.
Teléfono: 0521 204 666
http://www.unca.edu.py/
e-mail: framirez@fctunca.edu.py

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación""	engineering
	ENGINEERING S.A.E.C.A.	
	PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA **PRO - 014**	

NOTA ENGINEERING S.A.E.C.A. / LOTE 16 / CONTRATO N° 41/2020 LPN/SBE N° 02/2020

Asunción, 22 de octubre de 2021

Señor
Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU
Presente

A la atención de:
Coordinador de Fiscalización

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Certificado N.° 6 de la Orden de Servicio N.° 2, de las obras del **Lote N.° 16**, para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaranies 307.552.132 **(TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS GUARANIES, IVA Incluido)**

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado N° 06 ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021
2	Contratista	ENGINEERING S.A.E.C.A.
3	N° de Contrato	41/2020 LPN/SBE N° 02/2020
4	Resolución de Adjudicación N°	Resolución UEPP-MEC 437
5	Fecha de Contrato	11-12-2020
6	Fecha de Orden de Inicio	07-04-2021
7	Descripción de la Obra	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" ID 360254
8	% de Avance Físico Financiero	(78.45% acumulado) - (11.62% del mes)
9	Plazo de Ejecución	150 DIAS
10	Monto del Contrato	4.661.326.649
11	Monto Planilla Ejecutiva	3.529.125.559
12	Monto Certificado acumulado	2.768.914.564
13	Monto Certificado en el mes	410.069.510
14	Monto Neto a Pagar	307.552.132

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - N° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N° - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC9, correspondientes al período de certificación. Original
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Formulario FC N° 09 – hoja de costos de inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del fiscal de obras y el representante legal de la fiscalizadora
9	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
10	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)
11	Copia de pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo)

Sin otro particular, me despido atentamente

MESA DE ENTRADA

LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
Representante Legal Contratista
ENGINEERING S.A.E.C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

NOTA UNCA / ENGINEERING N° 61/2021 / Lote 16
CC: SUPERVISIÓN CPI

Coronel Oviedo, 21 de octubre de 2021

Señores
ENGINEERING
Presente:

Ref: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID N° 360.254"

Me dirijo a Uds. y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de **solicitar las correcciones del Certificado N° 6 del Lote N° 16.** Los documentos deben ser entregados en físico.

Se solicitan las siguientes modificaciones:

Certificado 6.
- **Pro 014.**
- **FC9.**
- **Resumen General.**
- **Resumen por institución.**
- **Colegio Nacional Pbro. José Agustín Molas. (Certificado).**
- **Curvas.**

Atentamente.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación""	engineering
	ENGINEERING S.A.E.C.A.	
	PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA **PRO - 014**	

NOTA ENGINEERING S.A.E.C.A. / LOTE 16 / CONTRATO N° 41/2020 LPN/SBE N° 02/2020

Asunción, 6 de octubre de 2021

Señor
Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU
Presente

A la atención de:
Coordinador de Fiscalización

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Certificado N.º 6 de la Orden de Servicio N.º 2, de las obras del **Lote N.º 16**, para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaraníes 314.134.907 **(TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE GUARANIES, IVA Incluido)**

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado Nº 06 ORDEN DE SERVICIO N° 02/2021
2	Contratista	ENGINEERING S.A.E.C.A.
3	Nº de Contrato	41/2020 LPN/SBE N° 02/2020
4	Resolución de Adjudicación Nº	Resolución UEPP-MEC 437
5	Fecha de Contrato	11-12-2020
6	Fecha de Orden de Inicio	07-04-2021
7	Descripción de la Obra	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" ID 360254
8	% de Avance Físico Financiero	(78.70% acumulado) - (11.87% del mes)
9	Plazo de Ejecución	150 DIAS
10	Monto del Contrato	4.661.326.649
11	Monto Planilla Ejecutiva	3.529.125.559
12	Monto Certificado acumulado	2.777.691.597
13	Monto Certificado en el mes	418.846.543
14	Monto Neto a Pagar	314.134.907

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC9, correspondientes al período de certificación. Original
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Formulario FC N° 09 – hoja de costos de inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del fiscal de obras y el representante legal de la fiscalizadora
9	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
10	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)
11	Copia de pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo)

Sin otro particular, me despido atentamente

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Clara Martinez

LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
Representante Legal Contratista
ENGINEERING S.A.E.C.A.

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
MISIONES	**VIII**	**LOTE 16-Misiones**	**Del 01-septiembre-2021 a 30-septiembre-2021**	**Nº 06 (septiembre-2021)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 06

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Misiones	
Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A**	
Contrato N.º.	41/2020	
Objeto del Contrato:	**LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"**	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	**11-Diciembre -2020**	
Monto Total del Contrato en Gs.:	4.661.326.649	**Plazo Contrato(Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	**29- diciembre -2020**	**Monto del anticipo (20%):** **Proyecto N° 272: Gs. 932.265.330**
Fecha de inicio efectivo de las obras:	07-abril -2021 - Orden Servicio 2	**Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 03/09/2021

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario – (01-septiembre-2021 al 30- septiembre 2021)	**30**
b.	Cantidad de días de lluvias registradas y sus incidencias (desde el 01-09-2021 al 30-09-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	**13**
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	*
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	*
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 6 (cuyo periodo tiene en total: 30 días)	**17**
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 12 instituciones del Lote N° 16 - Misiones.

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **121 días (6° Fiscalización)**

i. Certificado 1: **16 días.**
ii. Certificado 2: **27 días.**
iii. Certificado 3: **22 días.**
iv. Certificado 4: **26 días.**
v. Certificado 5: **13 días.**
vi. Certificado 6: **17 días.**

c. Plazo Restante (días): **29 días (respecto al plazo de ejecución original)**

c. AVANCE FISICO DE OBRAS: 78,45%

Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 78,45% = Gs. 2.768.914.564.

Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. MULTAS APLICADAS

a. Monto del mes: **Gs. 0**

b. Multa Acumulada (%): **0 %**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

e. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre hasta 31/Enero/2022
   i. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre hasta 31/Enero/2022.
   ii. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

c. Seguro contra accidentes de trabajo:
   i. Cubre hasta 30/Noviembre/2021.
   ii. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

d. Seguro contra los riesgos en zona de obras:
   i. Cubre hasta 30/Noviembre/2021.
   ii. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

Coordinador de Fiscalización

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Cronograma Fisico Financiero

Rubros	Gs	%	M1	M2	M3	M4	M5	M6
olegio Nacional Victor N. Vasconsellos. San Juan autista.	246.227.115	6,98%	0,52%	0,06%	1,10%	0,74%	2,12%	2,44%
olegio Nacional EMD Don Rigoberto Caballero. San gnacio.	244.517.986	6,93%	0,50%	0,06%	1,16%	0,72%	2,10%	2,38%
OLEGIO NACIONAL PEDRO P. PEÑA. SAN JUAN AUTISTA.	314.946.574	8,92%	0,86%	0,06%	1,05%	0,66%	3,88%	2,42%
scuela Basica Nº 392 Santo Angel. San Ignacio.	325.095.966	9,21%	0,68%	0,04%	1,10%	1,22%	2,98%	3,19%
olegio Nacional Pbro. José Agustín Molas , Escuela asica N° 2260 Saul A Maidana R. Sta Maria de Fe - lisiones.	408.474.535	11,57%	0,83%	0,04%	1,81%	1,77%	3,33%	3,79%
OLEGIO NACIONAL SANTA ROSA. SANTA ROSA.	237.201.417	6,72%	0,49%	0,17%	1,11%	0,81%	1,77%	2,38%
SCUELA BASICA Nº: 131 GASPAR RODRIGUEZ DE RANCIA. AYOLAS.	233.654.899	6,62%	0,58%	0,09%	0,72%	2,42%	0,62%	2,19%
OLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ. ANTIAGO.	239.480.177	6,79%	0,49%	0,12%	0,89%	1,16%	1,82%	2,31%
scuela Básica Nº 4791 Villa Universitaria. San Ignacio.	320.950.406	9,09%	0,68%	0,03%	1,29%	1,48%	2,65%	2,97%
scuela Basica Nº 826 Patricio G. Vargas Stark. San liguel.	316.476.195	8,97%	0,41%	0,31%	1,20%	1,24%	2,92%	2,88%
OLEGIO NACIONAL SANTA RITA. SAN IGNACIO.,	235.070.611	6,66%	0,49%	0,06%	0,88%	0,97%	2,20%	2,06%
scuela Basica Nº 3060 Prof. Encarnacion Fernandez onzalez. San Ignacio.	407.029.678	11,53%	0,95%	0,09%	1,45%	1,59%	3,86%	3,59%
otal por Obra	3.529.125.569	100%						
Monto Mensual. Porcentaje (%)			9,39%	1,04%	6,90%	13,10%	21,40%	48,17%
Monto acumulado Mensual. Porcentaje(%)			9,39%	10,43%	17,33%	30,43%	51,83%	100,00%

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente Nº 17.958
Reg[illegible] 3239

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.C.C.A.

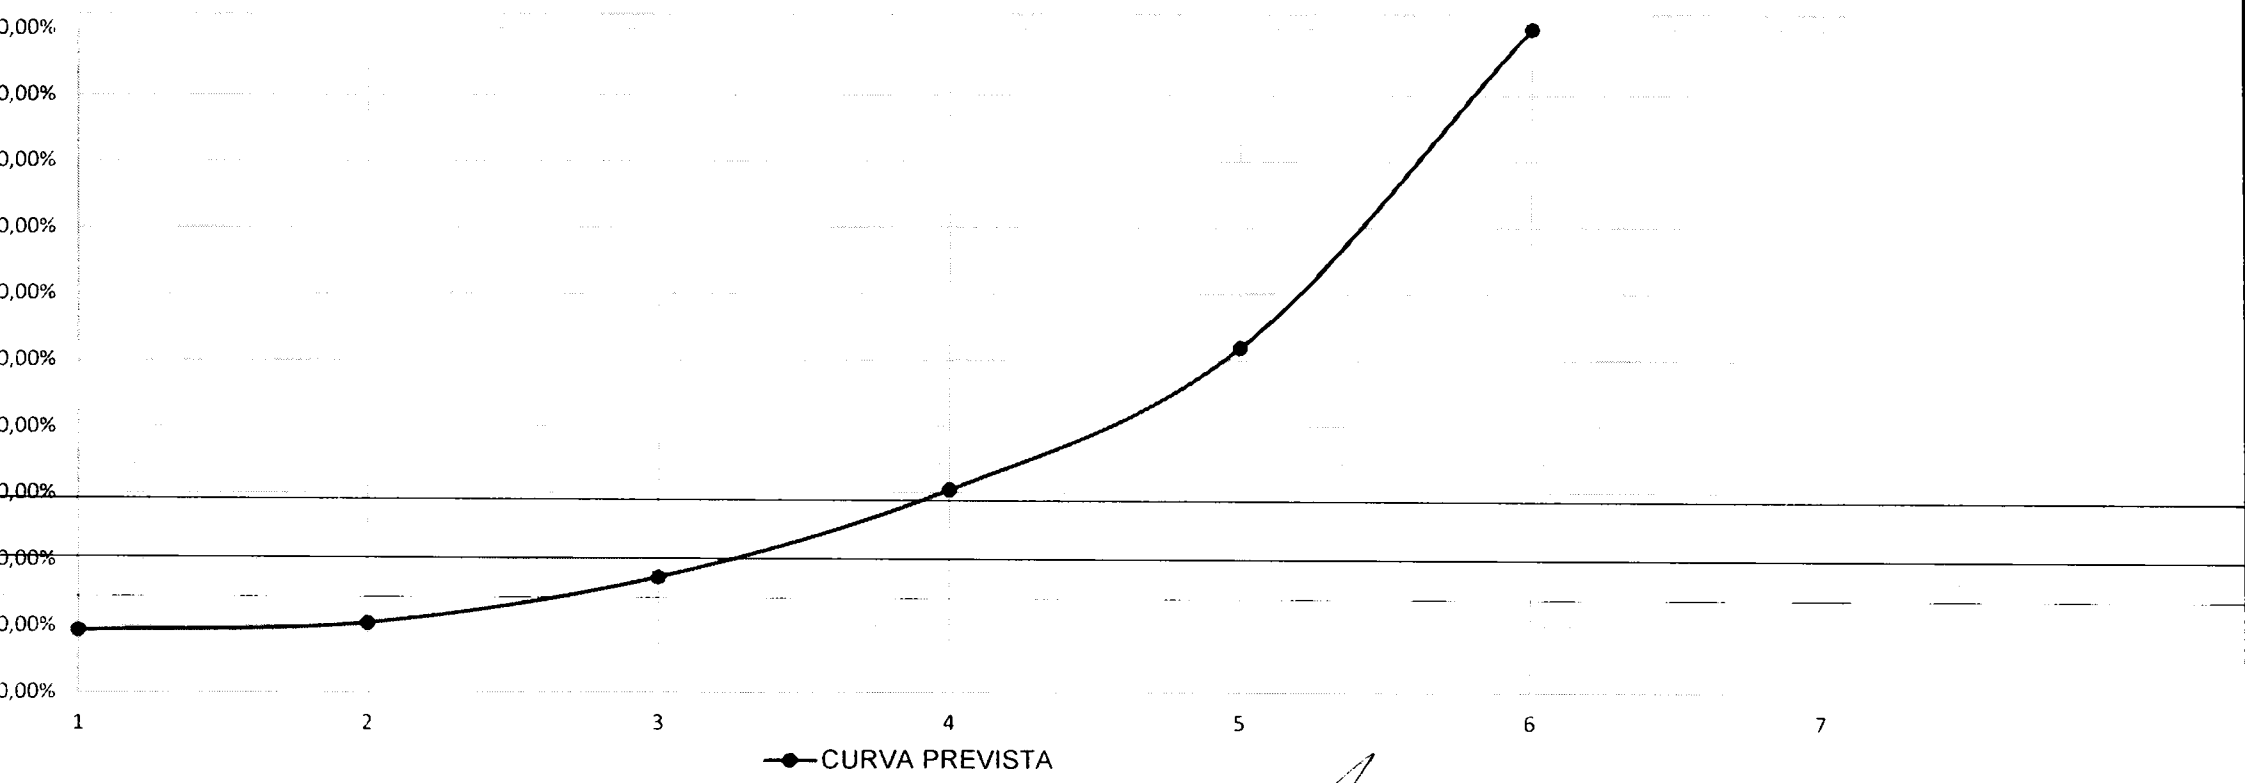

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente Nº 17.958
Registro Judicial Nº 3239

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO Paraguay
NACIONAL de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									1,8			
3									0,0			
4									2,2			
5									0,0			
6									0,0			
7									9,0			
8									2,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									9,2			
14									0,0			
15									1,0			
16									6,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									1,0			
21									12,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									0,0			
28									30,8			
29									30,3			
30									12,0			
31												
Total									117,3			
Máx. 24h									30,8			
Día Máx.									28			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 SEPTIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.E.C.A.** **LOTE 16 - CONTRATO N° 41/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

Curva de avance general del contrato

DETALLE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
% Mensual Previsto	9,39%	1,04%	6,90%	13,10%	21,40%	48,17%		
%Previsto Ajustado por Lluvia	9,39%	10,08%	6,01%	9,61%	17,95%	20,20%	12,37%	15,60%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DIAS LABORABLES	0	24	31	30	31	31	30	26
DIAS NO TRABAJADOS	0	8	4	8	5	18	13	
% de ajuste por lluvias	No APLICA	0,35%	0,89%	3,49%	3,45%	27,97%	5,36%	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
% Mensual Ejecutado	9,39%	2,75%	10,47%	8,05%	27,62%	8,55%	11,82%	
% Acumulado EJECUTADO	9,39%	12,14%	22,61%	30,66%	58,28%	66,83%	78,45%	

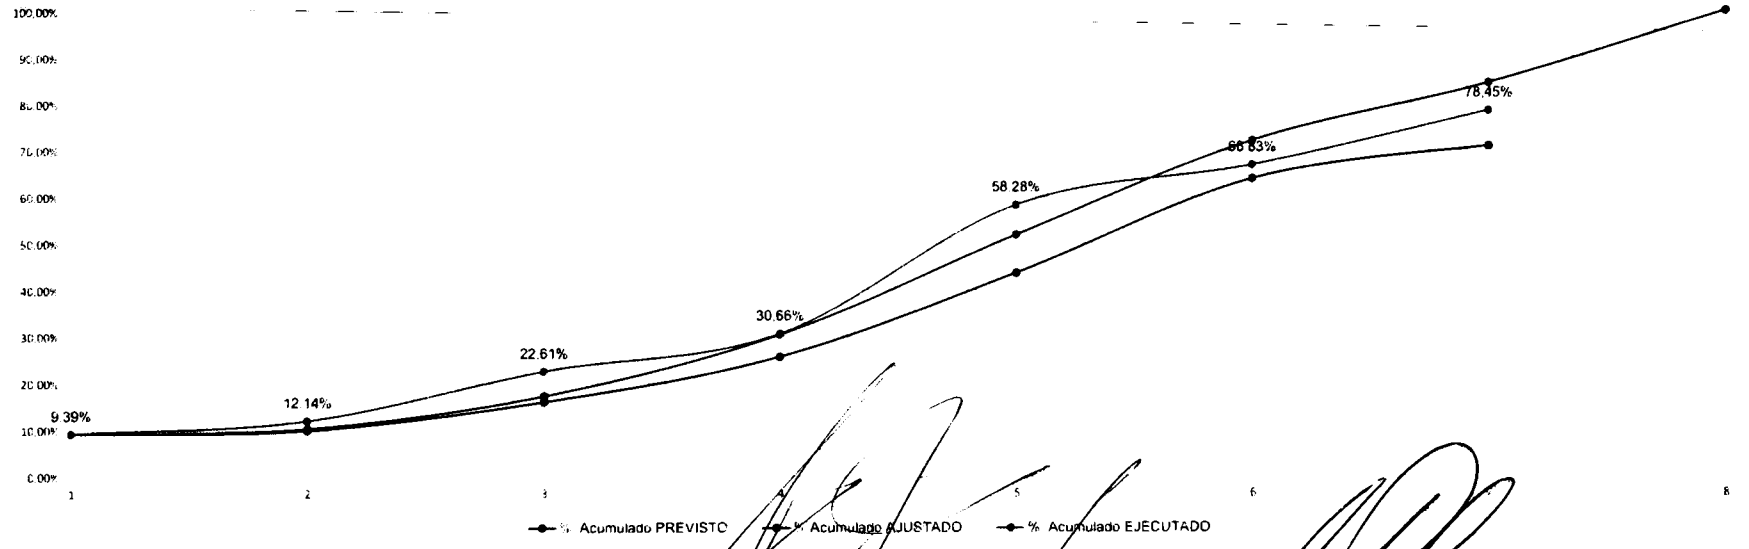

Adrián Davalos F.
Arquitecto
Patente N° 17.958
Registro Judicial N° 3239

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNGA

Ángel Rodríguez González
Rector

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

Corrimiento de plazo – LOTE 16 – CONTRATO 41– ENGINEERING S.A.E.C.A. – ID 360.254

Lotes de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	ORDEN DE INICIO N° 02	SOLICITUD 01	SOLICITUD 02	SOLICITUD 03	SOLICITUD 04	SOLICITUD 05	SOLICITUD 06	SOLICITUD 07
LOTE 16 MISIONES	ENGINEERING S.A.E.C.A. 14 INSTITUCIONES 12 ENTREGADAS	07/04/2021 **150 DÍAS**	PRORROGA POR 8 DÍAS LLUVIA ABRIL	PRORROGA POR 4 DÍAS LLUVIA MAYO	PRORROGA POR 8 DÍASLLUVIA JUNIO	PRORROGA POR 5 DÍAS LLUVIA DE JULIO	PRORROGA POR 16 DÍAS FUERZA MAYOR AGOSTO	PRORROGA POR 02 DÍAS LLUVIA AGOSTO	PRORROGA POR 13 DÍAS LLUVIA SEPTIEMBRE
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		03/09/2021	11/09/2021	15/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	14/10/2021	16/10/2021	29/10/2021

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente Nº 258
Registro Judicial Nº 3239

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitarandeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 SEPTIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA:** ENGINEERING S.A.E.C.A. LOTE 16 - **CONTRATO N° 41/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
ERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
ONTRATO	100,00%	4.661.326.649	331.258.856	3.197.866.703	3.529.125.559	66,83%	2.358.845.054	11,62%	410.069.510	78,45%	2.768.914.564
otal por Obra - (A)	**100,00%**	**4.661.326.649**	**331.258.856**	**3.197.866.703**	**3.529.125.559**	**66,83%**	**2.358.845.054**	**11,62%**	**410.069.510**	**78,45%**	**2.768.914.564**

DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
evolución de Anticipo (20%)	100,00%	932.265.330				50,60%	471.769.011	8,80%	82.013.902	59,40%	553.782.913
ara fondo de reparo (5%)	100,00%	176.456.278				66,83%	117.942.253	11,62%	20.503.476	78,45%	138.445.729
tras deducciones		-					-	0,00%	-		-
otal Deducciones - (B)		**1.108.721.608**					**589.711.264**		**102.517.378**		**692.228.642**

MPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	307.552.132
ULTAS	Gs.	-
MPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	307.552.132

S SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS GUARANIES.-

rma:
ombre: LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
n calidad de: Representante Legal
NGINEERING S.A.E.C.A.

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente Nº 17.9
Registro Judicial

Ángel Rodríguez González
Rector

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIURAA MOPYAHU
Ministerio EDUCACIÓN - CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06
SEPTIEMBRE 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.E.C.A.
LOTE 16 - **CONTRATO N° 41/2020**
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Colegio Nacional Victor N. Vasconsellos. San Juan Bautista.	100%	246.227.115	31.301.616	214.925.499	246.227.115	59,18%	145.712.430	17,03%	41.920.812	76,21%	187.633.242
2	Colegio Nacional EMD Don Rigoberto Caballero. San Ignacio.	100%	244.517.986	31.305.072	213.212.914	244.517.986	60,02%	146.756.399	25,46%	62.248.469	85,48%	209.004.868
3	COLEGIO NACIONAL PEDRO P. PEÑA. SAN JUAN BAUTISTA.	100%	314.946.574	25.055.387	289.891.187	314.946.574	60,36%	190.097.858	18,78%	59.159.669	79,14%	249.257.527
4	Escuela Basica Nº 392 Santo Angel. San Ignacio.	100%	325.095.966	26.433.970	298.661.996	325.095.966	72,12%	234.471.490	5,32%	17.306.920	77,44%	251.778.410
5	Colegio Nacional Pbro. José Agustín Molas , Escuela Basica N° 2260 Saul A Maidana R. Sta Maria de Fe - Misiones.	100%	408.474.535	31.301.616	377.172.919	408.474.535	71,22%	290.931.986	7,18%	29.332.843	78,41%	320.264.829
6	COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA. SANTA ROSA.	100%	237.201.417	25.067.485	212.133.932	237.201.417	72,57%	172.135.895	6,78%	16.071.952	79,35%	188.207.847
7	ESCUELA BASICA Nº 131 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA. AYOLAS.	100%	233.654.899	25.107.236	208.547.663	233.654.899	72,69%	169.848.158	3,85%	9.005.913	76,54%	178.854.071
8	COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ. SANTIAGO.	100%	239.480.177	25.046.745	214.433.432	239.480.177	73,36%	175.673.436	1,01%	2.430.292	74,37%	178.103.728
9	Escuela Básica Nº 4791 Villa Universitaria. San Ignacio.	100%	320.950.406	26.430.168	294.520.238	320.950.406	71,58%	229.738.980	6,77%	21.723.739	78,35%	251.462.719
10	Escuela Basica Nº 826 Patricio G. Vargas Stark. San Miguel.	100%	316.476.195	26.870.884	289.605.311	316.476.195	59,27%	187.584.284	20,01%	63.333.147	79,28%	250.917.431
11	COLEGIO NACIONAL SANTA RITA. SAN IGNACIO.,	100%	235.070.611	25.948.918	209.121.693	235.070.611	72,32%	170.005.089	6,85%	16.107.588	79,17%	186.112.677
12	Escuela Basica Nº 3060 Prof. Encarnacion Fernandez Gonzalez. San Ignacio.	100%	407.029.678	31.389.759	375.639.919	407.029.678	60,41%	245.889.049	17,55%	71.428.166	77,96%	317.317.215
	Total por Obra - (A)	100%	3.829.125.559	331.298.856	3.197.866.703	3.829.125.559	66,83%	2.358.845.054	11,62%	410.069.510	78,45%	2.768.914.564

Firma:
Nombre: LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
En calidad de: Representante Legal
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNGA

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente Nº 17.958
Registro Judicial Nº 3239

Ángel Rodríguez González
Rector

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.

Proy 822
SIF 74/2022
Paraguay de la gente

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 10768
Recibido por: José R.

DIA	MES	AÑO	HORA
14	OCT	2022	16:03

MEMORANDUM C.P.I. Nº 1335/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ref.: **Complemento del EXP. UEPP N°: 8922/2022 del Certificado de Obras N° 07, O.S. N°2,** Contrato N° 41/2020, Lote N° 16, Misiones. Empresa: ENGINEERING S.A.E.C.A.

Fecha: 13/10/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**	**CONTRATO N°**	**41/2020**
DEPARTAMENTO	**MISIONES**	**LOTE N°**	**16**
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL	UNCA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU	Arq. Adrián Dávalos	
SUPERVISIÓN	CPI - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Rubén Duarte	

PERIODO DE CERTIFICACION CORRESPONDIENTE										2021	
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°: 8922/2022
ANTICIPO	30/11/2022	PLAZO FINAL	150 DIAS
F.C. CONTRATO	30/11/2022	MONTO DE CONTRATO	4.661.326.649
C. T. RIESGO	30/11/2022	AVANCE FISICO ACUM.	95,52 %
D. TERCEROS	31/12/2022	AVANCE FISICO DEL MES	17,06 %
OBSERVACIONES		MONTO DE MULTA	0
		MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
El contrato se encuentra en suspensión desde el 15 de octubre de 2021		MONTO NETO CERTIFICADO (CON CANCELACIÓN DE ANTICIPO)	193.638.980
		MONTO ACUMULADO	3.371.147.615
		ANTICIPO FINANCIERO	932.265.330
		ANTICIPO FINANCIERO - SALDO	0

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

	FONDO DE REPARO ACUMULADO	168.557.383

Se establece: dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa ENGINEERING S.A.E.C.A. así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes y da por aprobado el Certificado N° 07 de la Orden de Servicio N° 02.

Por UEPP MEC Exp. N° 7534 del 29/01/2022 Engineering S.A.E.C.A. acepta la propuesta de rescisión parcial del contrato de mutuo acuerdo peticionado con la devolución total del Anticipo Financiero del Contrato N° 41/2020.

Por UEPP MEC Exp. N° 7558 propuesta de no renovar las pólizas solicitadas por Nota C.P.I. N° 291/2022.

Engineering S.A.E.C.A. presenta a la fiscalizadora UNCA las modificaciones correspondientes del Certificado de Obras N° 7 con la devolución total del Anticipo Financiero del Contrato N° 41/2022 (Mesa de Entrada UNCA de fecha 18/08/2022)

Por UEPP MEC Exp. N° 8529 de fecha 23/08/2022 se presenta las modificaciones correspondientes del Certificado N° 7 del Contrato N° 41/2022 con la devolución total del Anticipo Financiero.

Por Memorándum CAF N° 1058/2022 U.E.P.P. MEC Exp. N° 8767 de fecha 30/08/2022 se solicita ajuste del Resumen General del Contrato del Certificado de Obras N° 7 y PRO-014, teniendo en cuenta la diferencia detectada según el detalle enviado.

Por Nota de Engineering U.E.P.P. MEC Exp. N° 8922 de fecha 06/09/2022 se adjunta:

- PRO 014 Certificado de Obras N° 7
- Resumen General del Certificado de Obras N° 7
- PRO 006 UNCA7MEC del Certificado de Obras N° 7

Se anexa copias de los antecedentes documentales y copias de las pólizas vigentes.

Arq. Guillermo Godoy
Jefa de Supervisión
Certificación
UEPP - MEC

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

05/09/2022 07:48

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 8922 **Año:** 2022

Fecha 02/09/2022 **Fecha Ingreso:** 02/09/2022

Fecha Límite: 02/09/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: NOTA S/N

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remisión de documentos - PRO 014 CERTIFICADO N° 07 - RESUMEN GENERAL CERTIFICADO N° 07 - PRO 006 UNCA/MEC CERTIFICADO N° 07

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Enrique	Enrique	02/09/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Enrique	CPI	02/09/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

355
MARTA

06 09 2022 15.05
DUSSON.

engineering

CONSTRUIMOS PARAGUAY

Luque, 02 de septiembre de 2022.

Señora
DALILA ZARZA
COORDINADORA GENERAL UEPP
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
GRAL. DIAZ C/HERNANDARIAS. (EDIFICIO NATURA)
Presente

Ref.: **"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI ID:360254" CONTRATO 41/2020 – LOTE 16.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio donde corresponda adjuntando los siguientes documentos:

- PRO 014 certificado Nro. 07
- Resumen General certificado Nro. 07
- PRO 006 UNCA/MEC certificado Nro. 07

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle, atentamente.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Rep. Legal/Vicepresidente

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 8922			
Recibido por: José R.			
DIA	MES	AÑO	HORA
02	SEP	2022	14:25

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación""	engineering
	ENGINEERING S.A.E.C.A.	
	PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA PRO - 014	

NOTA ENGINEERING S.A.E.C.A. / LOTE 16 / **CONTRATO N° 41/2020 LPN/SBE N° 02/2020**

Asunción, 30 de agosto de 2022

Señor
Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU
Presente

A la atención de:
Coordinador de Fiscalización

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Certificado N.º 7 de la Orden de Servicio N.º 2, de las obras del **Lote N.º 16**, para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N.º 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaraníes 193.638.980 **(CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA, IVA Incluido)**

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado N.º 07 ORDEN DE SERVICIO N.º 02/2021
2	Contratista	ENGINEERING S.A.E.C.A.
3	N° de Contrato	41/2020 LPN/SBE N.º 02/2020
4	Resolución de Adjudicación N°	Resolución UEPP-MEC 437
5	Fecha de Contrato	11-12-2020
6	Fecha de Orden de Inicio	07-04-2021
7	Descripción de la Obra	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" ID 360254
8	% de Avance Físico Financiero	(95.52% acumulado) - (17.06% del mes)
9	Plazo de Ejecución	150 DIAS
10	Monto del Contrato	4.661.326.649
11	Monto Planilla Ejecutiva	3.529.125.559
12	Monto Certificado acumulado	3.371.147.615
13	Monto Certificado en el mes	602.233.051
14	Monto Neto a Pagar	193.638.980

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N.º - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - N.º - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N.º - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC9, correspondientes al período de certificación. Original
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Formulario FC N.º 09 – hoja de costos de inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del fiscal de obras y el representante legal de la fiscalizadora
9	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
10	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)
11	Copia de pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo)

Sin otro particular, me despido atentamente.

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC

LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
Representante Legal Contratista
ENGINEERING S.A.E.C.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarandúva
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 07 OCTUBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA:** ENGINEERING S.A.E.C.A. LOTE 16 - **CONTRATO N° 41/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
CONTRATO	100,00%	4.661.326.649	331.258.856	3.197.866.703	3.529.125.559	78,45%	2.768.914.564	17,06%	602.233.051	95,52%	3.371.147.615
Total por Obra - (A)	**100,00%**	**4.661.326.649**	**331.258.856**	**3.197.866.703**	**3.529.125.559**	**78,45%**	**2.768.914.564**	**17,06%**	**602.233.051**	**95,52%**	**3.371.147.615**

DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	932.265.330				59,40%	553.782.912	40,60%	378.482.418	100,00%	932.265.330
Para fondo de reparo (5%)	100,00%	176.456.278				78,45%	138.445.730	17,06%	30.111.653	95,52%	168.557.383
Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
Total Deducciones - (B)		**1.108.721.608**					**692.228.642**		**408.594.071**		**1.100.822.713**
IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								**Gs.**	**193.638.980**		
MULTAS								**Gs.**	**-**		
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								**Gs.**	**193.638.980**		

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-

Firma:
Nombre: LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
En calidad de: Representante Legal
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

Rodríguez González
Rector

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente N° 17.958
Registro Judicial N° 3239

Ing. Fredy G. Ramírez M.
Coordinador

TEKOMBO' E HA TEMBIURAA
Ministerio de EDUCACIÓN, CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 07
OCTUBRE 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.E.C.A.
LOTE 16 - **CONTRATO N° 41/2020**
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	Colegio Nacional Victor N. Vasconsellos. San Juan Bautista.	100%	246.227.115	31.301.616	214.925.499	**246.227.115**	76,21%	187.633.242	19,94%	49.085.821	96,15%	236.719.063
2	Colegio Nacional EMD Don Rigoberto Caballero. San Ignacio.	100%	244.517.986	31.305.072	213.212.914	**244.517.986**	85,48%	209.004.868	10,58%	25.871.978	96,06%	234.876.846
3	COLEGIO NACIONAL PEDRO P. PEÑA. SAN JUAN BAUTISTA.	100%	314.946.574	25.055.387	289.891.187	**314.946.574**	79,14%	249.257.527	16,96%	53.402.301	96,10%	302.659.828
4	Escuela Basica N° 392 Santo Angel. San Ignacio.	100%	325.095.966	26.433.970	298.661.996	**325.095.966**	77,44%	251.778.410	18,16%	59.046.924	95,60%	310.825.334
5	Colegio Nacional Pbro. José Agustin Molas , Escuela Basica N° 2260 Saul A Maidana R. Sta Maria de Fe - Misiones.	100%	408.474.535	31.301.616	377.172.919	**408.474.535**	78,41%	320.264.829	17,30%	70.679.678	95,71%	390.944.507
6	COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA. SANTA ROSA.	100%	237.201.417	25.067.485	212.133.932	**237.201.417**	79,35%	188.207.847	16,59%	39.352.430	95,94%	227.560.277
7	ESCUELA BASICA N° 131 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA. AYOLAS.	100%	233.654.899	25.107.236	208.547.663	**233.654.899**	76,54%	178.854.071	19,33%	45.159.688	95,87%	224.013.759
8	COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ. SANTIAGO.	100%	239.480.177	25.046.745	214.433.432	**239.480.177**	74,37%	178.103.728	19,01%	45.535.363	93,38%	223.639.091
9	Escuela Básica N° 4791 Villa Universitaria. San Ignacio.	100%	320.950.406	26.430.168	294.520.238	**320.950.406**	78,35%	251.462.719	17,19%	55.178.254	95,54%	306.640.973
10	Escuela Basica N° 826 Patricio G. Vargas Stark. San Miguel.	100%	316.476.195	26.870.884	289.605.311	**316.476.195**	79,28%	250.917.431	17,09%	54.076.661	96,37%	304.994.092
11	COLEGIO NACIONAL SANTA RITA. SAN IGNACIO.	100%	235.070.611	25.948.918	209.121.693	**235.070.611**	79,17%	186.112.677	14,09%	33.132.102	93,27%	219.244.779
12	Escuela Basica N° 3060 Prof. Encarnacion Fernandez Gonzalez. San Ignacio.	100%	407.029.678	31.389.759	375.639.919	**407.029.678**	77,96%	317.317.215	17,62%	71.711.851	95,58%	389.029.066
	Total por Obra - (A)	**100%**	**3.529.125.559**	**331.258.856**	**3.197.866.703**	**3.529.125.559**	**78,45%**	**2.768.914.564**	**17,06%**	**602.233.051**	**95,52%**	**3.371.147.615**

Firma:
Nombre: LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
En calidad de: Representante Legal
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Adrián Dávalos F.
Arquitecto
Patente N° 17.956
Registro Judicial N° 3735

30/08/2022 10:17

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 8767 **Año:** 2022

Fecha 30/08/2022 **Fecha Ingreso:** 30/08/2022

Fecha Límite: 30/08/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: MEMO N° 1058 CAF

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Solicitud de ajuste - Exp. N° 8690

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Enrique	Enrique	30/08/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Enrique	Infraestructur	30/08/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

332
Alfredo R

30 8 22 12:40

A: Dpto. Sup. de Obras y Cert.

A: Arq. Ruben Duarte

Para los fines pertinentes

Generado por: Enrique Ferreira

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 8767			
Recibido por: José R.			
DIA	MES	AÑO	HORA
30	AGO	2022	10:02

MEMORANDUM CAF N° 1058/2022

A : **ZOILO BENITEZ**, Coordinador
Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DE : **SANTIAGO LÓPEZ**, Coordinador
Coordinación de Administración y Finanzas.

: **JUAN JOSÉ GALVÁN,** Jefe
Departamento de Control y Verificación Contractual.

FECHA : 29 de agosto de 2022.

REFERENCIA : Solicitud de ajuste – Exp. N° 8690.-

A la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, con relación al **MEMORÁNDUM CPI N° 1100/2022 (Exp UEPP N° 8690)**, por el cual remite Solicitud de Pago del Certificado de Obras N° 07 correspondiente al **Contrato N° 41/2020**, suscrito con **ENGINEERING S.A.E.C.A.** en el marco llamado **LPN SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCACTIVOS en el marco de los programas financiados por el FEEI" – Plurianual-ID 360.254,** con el objeto de solicitar ajuste del Resumen General del Contrato y PRO-014, teniendo en cuenta diferencia detectada según el siguiente detalle:

Certificado del mes:	602.233.051
Devolución de Anticipo (20%)	378.482.418
Deducción por Fondo de Reparo:	30.111.653
Monto neto a pagar Certificado N° 7	**193.638.980**

Se remite detalle de devolución de anticipo por Certificado:

Orden de Servicio N°	Certificado N°	Monto Certificado	Dev. Anticipo
1	1	331.258.856	66.251.771
2	1	97.102.161	19.420.432
2	2	369.641.217	73.928.243
2	3	284.255.414	56.851.083
2	4	974.787.612	194.957.522
2	5	301.799.794	60.359.959
2	6	410.069.510	82.013.902
Total hasta C.6		**2.768.914.564**	**553.782.912**

Atentamente.

Elaborado por: Juan José Galván

Revisado por: Santiago López

Ministerio de Educación y Ciencias
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Administración y Finanzas
Derivación de Documentos

Fecha: 29/08/22		N° de Mesa de Entrada 8690	
Dependencias			
Secretaria Privada		Coordinación General	
Secretaria CAF		Coord. Adm. y Finanzas- CAF	
Unidad de control de Procesos de Prog. y Pytos.		Coordinación de Asesoría Legal	
Dpto. de Presupuesto		Coordinación de Apoyo	
Dpto. de Fiscalización de Pagos		Coord. De Adq. y Contrataciones	
Dpto. de Tesorería		Coordinación de Proyectos Educativos	
Dpto. de Contabilidad		Coord. De Formación Docente	
Dpto. de Rendición de Cuentas		Coord. De Proyectos TIC's	
Dpto. de Adm. Y Servicios		Coordinación de Proyec. De Infraestructura	
Dpto. Control y Verificación Contractual	✓	PNUD	
Dpto. Gestión del Talento Humano		BID	
Providencias			
Para responder		Para Dictamen	
Para su consideración		Para cumplimiento	
Para su conocimiento		Para fines pertinentes	✓
Para emitir parecer al respecto		Para recomendar	
Para su obligación		Con el Vo. Bo. CAF	
Para proveer lo solicitado		Para elaboración de Resolución	
Para elaboración de contrato		Para elaboración de Nota/Memo	
Para proceder al pago		Para su Archivo	
		Para informar sobre presente	
Observaciones			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCAS
COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Asunción - Paraguay

Lic. Samuel López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

29/08/2022 07:51

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 8690 **Año:** 2022

Fecha 29/08/2022 **Fecha Ingreso:** 29/08/2022

Fecha Límite: 29/08/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >DESEMBOLSO>

Referencia: MEMO N° 1100 CPI

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Solicitud de pago del Certificado de Obras N° 07 O.S. N° 2 Contrato N° 41/2020 Lote N° 16 Misiones, Empresa : ENGINEERING S.A.E.C.A.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Enrique	Enrique	29/08/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Enrique	CAF	29/08/2022	Coordinación de	Pendiente	

N° 8690
milagros

DIA	MES	AÑO	HORA
29	08	22	8:09

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 1100/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ref.: **Solicitud de pago del Certificado de Obras N° 07, O.S. N°2,** Contrato N° 41/2020, Lote N° 16, Misiones. Empresa: ENGINEERING S.A.E.C.A.

Fecha: 26/08/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**ENGINEERING S.A.E.C.A.**	**CONTRATO N°**	**41/2020**
DEPARTAMENTO	**MISIONES**	**LOTE N°**	**16**
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL	UNCA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU	Arq. Adrián Dávalos	
SUPERVISIÓN	CPI - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Rubén Duarte	

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE											2021
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°: 8529/2022
ANTICIPO	31/07/2022	PLAZO FINAL	150 DIAS
F.C. CONTRATO	31/07/2022	MONTO DE CONTRATO	4.661.326.649
C. T. RIESGO	31/05/2023	AVANCE FISICO ACUM.	95,52 %
D. TERCEROS	31/07/2022	AVANCE FISICO DEL MES	17,06 %
OBSERVACIONES		MONTO DE MULTA	0
		MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
El contrato se encuentra en suspensión desde el 1 de octubre de 2021		MONTO NETO CERTIFICADO	193.638.982
		MONTO ACUMULADO	3.371.147.615
		ANTICIPO FINANCIERO	932.265.3300
		ANTICIPO FINANCIERO - SALDO	0
		FONDO DE REPARO ACUMULADO	168.557.382

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se establece: dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa ENGINEERING S.A.E.C.A. así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes" y da por aprobado el Certificado N° 07 de la Orden de Servicio N° 02.

Por UEPP MEC Exp. N° 7534 del 29/01/2022 Engineering S.A.E.C.A. acepta la propuesta de rescisión parcial del contrato de mutuo acuerdo peticionado con la devolución total del Anticipo Financiero del Contrato N° 41/2020.

Por UEPP MEC Exp. N° 7558 propuesta de no renovar las pólizas solicitadas por Nota C.P.I. N° 291/2022.

Engineering S.A.E.C.A. presenta a la fiscalizadora UNCA las modificaciones correspondientes del Certificado de Obras N° 7 con la devolución total del Anticipo Financiero del Contrato N° 41/2022 (Mesa de Entrada UNCA de fecha 18/08/2022)

Por UEPP MEC Exp. N° 8529 de fecha 23/08/2022 se presenta las modificaciones correspondientes del Certificado N° 7 del Contrato N° 41/2022 con la devolución total del Anticipo Financiero.

Se anexa copias de los antecedentes documentales.

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

Ing. Zo[illegible]
CP[illegible]

23/08/2022 15:20

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 8529 **Año:** 2022

Fecha 23/08/2022 **Fecha Ingreso:** 23/08/2022

Fecha Límite: 23/08/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>FEEI>INFORMES>

Referencia: NOTA S/N, Engineering

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remitir documentos referente a devolución total del anticipo. Engineering.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	23/08/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	23/08/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

A: Arq. Fr. Fiodoy
Para los fines pertinentes

Prioridad
Alta.

310
MARTA

24 08 2022 09:30

INS. ZOILO.

engineering

CONSTRUIMOS PARAGUAY

Luque, 23 de agosto de 2022.

Señor
ZOILO BENÍTEZ
COORDINADOR INTERINO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIASAL. DIAZ C/HERNANDARIAS. (EDIFICIO NATURA)
Presente

Ref.: **"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI ID:360254" CONTRATO 41/2020 – LOTE 16.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio donde corresponda, remitiendo los documentos que hacen referencia a la devolución total del anticipo detallado más abajo:

- Nota "Solicitud de devolución total de anticipo" con Exp. N° 7354. (COPIA)
- Nota "Solicitud de renovación de pólizas" con Exp. N°7558. (COPIA)
- Nota C.P.I. N° 291/2022 en aceptación de la forma de devolución de anticipo. (COPIA)
- Nota ingresada en fecha 12 de agosto del 2022 en UNIDAD DE FISCALIZACION U.N.C.A., remitiendo RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO del certificado N°7 pendiente a cobrar, en base a la nota C.P.I. N° 291/2022, donde modificamos el porcentaje del anticipo a devolver. (COPIA)
- Nota C.P.I. N° 304/2022 donde se detalla las pólizas que deben de ser renovadas. (COPIA)
- Nota "Documentos remitidos según pedido de Nota C.P.I. N° 304/2022" con Exp. N° 8285. (COPIA)
- Nota UNCA/ENGINEERING N° 059/2022 solicitando PRO 014 según valor restante neto a pagar del certificado N°7 pendiente a cobrar. (COPIA)
- Mesa de Entrada de la PRO 014 con fecha 18 de agosto del 2022 UNIDAD DE FISCALIZACION U.N.C.A. (1 ORIGINAL)
- Resumen General del Contrato certificado N°7 pendiente a cobrar. (2 ORIGINALES)
- PRO 006 UNCA/MEC N° 681/2022. (2 ORIGINALES)

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle y esperando una respuesta favorable, atentamente.

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 8529			
Recibido por: Liz			
DIA	MES	AÑO	HORA
23	AGO	2022	14:31

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Rep. Legal/Vicepresidente

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A

engineering

CONSTRUIMOS PARAGUAY

Luque, 28 de julio de 2022.

Señor
ING. ZOILO BENÍTEZ
COORDINADOR INTERINO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS GRAL. DIAZ C/HERNANDARIAS. (EDIFICIO NATURA)
Presente

Ref.: **"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI ID:360254" CONTRATO 41/2020 – LOTE 16.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, comunicando la aceptación de parte de la empresa **ENGINEERING SAECA** la propuesta de rescisión de contrato de mutuo acuerdo peticionado por la Unidad a su cargo que fue conversado en la mesa de trabajo que se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del MEC el 21 de abril del corriente año.

Visto y considerando lo mencionado anteriormente, solicitamos además la disminución del valor del contrato que de inicialmente era de **4.661.326.649GS. (Guaraníes: Cuatro mil seiscientos sesenta y un millones trescientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y nueve)**, y con la no ejecución de 2 (dos) obras que estaban pendientes a iniciar (Escuela Básica Nº238 Gral. José Eduvigis Diaz de Villa Florida y la Escuela básica N°6.000 Virgen de las Mercedes de Ayolas) tiene una disminución del monto de contrato de **731.187.881 GS. (Guaraníes: Setecientos treinta y un millones ciento ochenta y siete mil ochocientos ochenta y uno),** quedando así al monto de **3.930.138.769 (Guaraníes: Tres mil novecientos treinta millones ciento treinta y ocho mil setecientos sesenta y nueve)** que es el monto total de Contrato a ser ejecutado que corresponde al 84,31% del monto máximo.

Además, proponemos realizar la devolución total del anticipo pendiente sean descontados del certificado N°7 que actualmente está pendiente de cobro en el Departamento Financiero del UEPP, dicho valor a devolver asciende a la suma **258.035.807 GS. (Guaraníes: Doscientos cincuenta y ocho millones treinta y cinco mil ochocientos siete).** Para mejor ilustración notar en los cuadros abajo detallados, el monto a disminuir del contrato y la devolución del anticipo restante que con esto se acumula el 100% de lo recibido en concepto de Anticipo de Contrato.

RESUMEN DE CERTIFICADOS PENDIENTES LOTE 16					
ITEM	CONCEPTO	MONTO CERTIFICADO	DEVOLUCION DE ANTICIPO	FONDO DE REPARO	MONTO
1	CERTIFICADO N°6	410.069.510	82.013.902	20.503.476	307.552.133
2	CERTIFICADO N°7	602.233.051	120.446.610	30.111.653	451.674.789
3	DEVOLUCION TOTAL DE ANTICIPO (100%)		258.035.807		(258.035.807)
			TOTAL PENDIENTE DE COBRO (C6+C7)		501.191.114

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7354
Recibido por: Liz
DIA | MES | AÑO | HORA

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

LOTE 16 RESUMEN GENERAL	
Monto del contrato	4.661.326.649
Monto de trabajos a ejecutar (14 obras inicialmente).	4.639.042.259
Monto de trabajos en ejecución (12 Obras, OS1+OS2).	3.529.125.559
Monto ejecutado pendiente de emisión de Orden de Servicio (OS3 - Rubros no contemplados en contrato y Adicionales)	401.013.210
MONTO DE CONTRATO A NO EJECUTAR	**731.187.881**

Sin otro particular, y en espera de que la petición sea favorable me despido y hago propicia la ocasión para saludarle muy cordialmente.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Rep. Legal/Vicepresidente

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A
