COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Saltos del Guaira - Canindeyu, 06 de MAYO 2024

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 01

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 01** del **Contrato 14/2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM"**, por la suma de **GUARANÍES MIL DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE.- (1.200.498.487).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	1.200.498.487
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	60.024.924
RETENCION IVA 30%	32.740.868
TOTAL NETO	**1.107.732.695**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

.....
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2918
FECHA 7/05/24 HORA 14:30
CANT HOJAS 1
NUMERO DE CEL:
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 1

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM
ZONA SALTOS DEL GUAIRA
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 6/5/2024
ID N°: 437,529

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
	LOTE N° 1						
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	0	640	640,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	0	640	640,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	0	160	160,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	0	8	8,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	0	7,5	7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	0	560	560,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	0	560	560,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	0	560	560,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	0	560	560,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
11	Cartel de Obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 2			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	0	2025	2.025,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.025	0	2025	2.025,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	0	334	334,00	74,22
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	0	13,8	13,80	61,33
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	0	10	10,00	66,67
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	0	900	900,00	50,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	0		-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	0	900	900,00	50,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel Obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 3			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	0	2000	2.000,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.000	0	2000	2.000,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	0	280	280,00	70,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	0	10	10,00	50,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	0	4,25	4,25	37,78
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	0	900	900,00	50,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	0		-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	0	900	900,00	50,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 4			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306	0		-	0,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	306	0		-	0,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107	0		-	0,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1	0		-	0,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	0		-	0,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255	0		-	0,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255	0		-	0,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255	0		-	0,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N°5			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	0	3330	3.330,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	3.330	0	3330	3.330,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	0	740	740,00	100,00
4	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	0	37	37,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	0	7,5	7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	0	2960	2.960,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	0	2960	2.960,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	0	2960	2.960,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	0	2960	2.960,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 6			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	0	2270	2.270,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.270	0	2270	2.270,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454	0		-	0,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23	0		-	0,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	0		-	0,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043	0		-	0,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043	0		-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043	0		-	0,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 7			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	0	2025	2.025,00	131,49
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	1.540	0	2025	2.025,00	131,49
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	0	324	324,00	73,64
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	0	13,8	13,80	62,73
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	0	10	10,00	66,67
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	0	709	709,00	53,71
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320	0		-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320	0		-	0,00
9	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	0	709	709,00	53,71
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartelo de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N°8			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	0		-	0,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	0		-	0,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200	0		-	0,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10	0		-	0,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3	0		-	0,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	0		-	0,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540	0		-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540	0		-	0,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 9			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	0	3500	3.500,00	100,00
2	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	0	3500	3.500,00	100,00
3	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106	0		-	0,00
4	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	0	600	600,00	60,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1	0		-	0,00
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32	0		-	0,00
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3	0		-	0,00
8	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25	0		-	0,00
9	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	0	16	16,00	60,95
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16	0		-	0,00
11	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2	0		-	0,00
12	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	0	1400	1.400,00	46,67
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000	0		-	0,00
14	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000	0		-	0,00
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	0	1400	1.400,00	46,67
16	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
17	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 10			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270	0		-	0,00
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270	0		-	0,00
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60	0		-	0,00
4	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3	0		-	0,00
5	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	0		-	0,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240	0		-	0,00
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240	0		-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240	0		-	0,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
	LOTE N° 11			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	0	2776	2.776,00	100,00
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	0	2776	2.776,00	100,00
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694	0		-	0,00
4	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7	0		-	0,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	0		-	0,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429	0		-	0,00
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429	0		-	0,00
8	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429	0		-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429	0		-	0,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0		-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	0	1	1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID Nº:437.529

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2024

CERTIFICADO DE OBRAS Nº1

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	LOTE N° 1				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000	0	640	640	100%	Metros cuadrados	0	3.648.000	3.648.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000	0	640	640	100%	Metros cuadrados	0	3.776.000	3.776.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	38.000	6.080.000	0	160	160	100%	Metro lineal	0	6.080.000	6.080.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	1.845.670	14.765.360	0	8	8	100%	Metros cúbicos	0	14.765.360	14.765.360
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	0	7,5	7,5	100%	Metros cúbicos	0	15.879.750	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	54.480	30.508.800	0	560	560	100%	Metros cuadrados	0	30.508.800	30.508.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	5.890	3.298.400	0	560	560	100%	Metros cuadrados	0	3.298.400	3.298.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	4.100	2.296.000	0	560	560	100%	Metros cuadrados	0	2.296.000	2.296.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	21.000	11.760.000	0	560	560	100%	Metros cuadrados	0	11.760.000	11.760.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 2				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	5.700	11.542.500	0	2025	2025	100%	Metros cuadrados	0	11.542.500	11.542.500
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.025	5.900	11.947.500	0	2025	2025	100%	Metros cuadrados	0	11.947.500	11.947.500
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	38.000	17.100.000	0	334	334	74%	Metro lineal	0	12.692.000	12.692.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	1.845.670	41.527.575	0	13,8	13,8	61%	Metros cúbicos	0	25.470.246	25.470.246
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500	0	10	10	67%	Metros cúbicos	0	21.173.000	21.173.000
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000	0	900	900	50%	Metros cuadrados	0	49.032.000	49.032.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000	0	900	900	50%	Metros cuadrados	0	18.900.000	18.900.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 3				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	5.700	11.400.000	0	2000	2000	100%	Metros cuadrados	0	11.400.000	11.400.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.000	5.900	11.800.000	0	2000	2000	100%	Metros cuadrados	0	11.800.000	11.800.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	38.000	15.200.000	0	280	280	70%	Metro lineal	0	10.640.000	10.640.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	1.845.670	36.913.400	0	10	10	50%	Metros cúbicos	0	18.456.700	18.456.700
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625	0	4,25	4,25	38%	Metros cúbicos	0	8.998.525	8.998.525
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000	0	900	900	50%	Metros cuadrados	0	49.032.000	49.032.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000	0	900	900	50%	Metros cuadrados	0	18.900.000	18.900.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

	LOTE N°8				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200	38.000	7.600.000	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10	1.845.670	18.456.700	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3	2.117.300	6.351.900	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	54.480	29.419.200	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540	5.890	3.180.600	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540	4.100	2.214.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540	21.000	11.340.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 9				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	5.700	19.950.000	0	3500	3500	100%	Metros cuadrados	0	19.950.000	19.950.000
2	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	5.900	20.650.000	0	3500	3500	100%	Metros cuadrados	0	20.650.000	20.650.000
3	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106	87.400	9.264.400	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
4	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	48.000	48.000.000	0	600	600	60%	Metro lineal	0	28.800.000	28.800.000
5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1	4.890.600	4.890.600	0		0	0%	Unidad	0	0	0
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32	1.215.450	38.894.400	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3	1.438.620	9.063.306	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
8	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25	128.000	3.200.000	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
9	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	2.117.300	55.579.125	0	16	16	61%	Metros cúbicos	0	33.876.800	33.876.800
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16	872.300	13.956.800	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
11	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2	1.438.620	6.042.204	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
12	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	54.480	163.440.000	0	1400	1400	47%	Metros cuadrados	0	76.272.000	76.272.000
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000	5.890	17.670.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
14	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000	4.100	12.300.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	21.000	63.000.000	0	1400	1400	47%	Metros cuadrados	0	29.400.000	29.400.000
16	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
17	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 10				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270	5.700	1.539.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270	5.900	1.593.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60	38.000	2.280.000	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
4	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3	1.845.670	5.537.010	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
5	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240	54.480	13.075.200	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240	5.890	1.413.600	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240	4.100	984.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240	21.000	5.040.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 11				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	5.700	15.823.200	0	2776	2776	100%	Metros cuadrados	0	15.823.200	15.823.200
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	5.900	16.378.400	0	2776	2776	100%	Metros cuadrados	0	16.378.400	16.378.400
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694	38.000	26.372.000	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
4	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7	1.845.670	64.044.749	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429	54.480	132.331.920	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429	5.890	14.306.810	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429	4.100	9.958.900	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429	21.000	51.009.000					Metros cuadrados			0
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	TOTAL				2.563.167.926				46,84%		0	1.200.498.487	1.200.498.487

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	1.200.498.487
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	60.024.924
* Total certificado del mes	Gs.	1.140.473.563
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	1.140.473.563

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _07_/05_/_2024_

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

	LOTE N° 4				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306	5.700	1.744.200	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	306	5.900	1.805.400	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107	38.000	4.066.000	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1	1.845.670	9.412.917	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255	54.480	13.892.400	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255	5.890	1.501.950	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255	4.100	1.045.500	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255	21.000	5.355.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N°5				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	5.700	18.981.000	0	3330	3330	100%	Metros cuadrados	0	18.981.000	18.981.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	3.330	5.900	19.647.000	0	3330	3330	100%	Metros cuadrados	0	19.647.000	19.647.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	38.000	28.120.000	0	740	740	100%	Metro lineal	0	28.120.000	28.120.000
4	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	1.845.670	68.289.790	0	37	37	100%	Metros cúbicos	0	68.289.790	68.289.790
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	0	7,5	7,5	100%	Metros cúbicos	0	15.879.750	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	54.480	161.260.800	0	2960	2960	100%	Metros cuadrados	0	161.260.800	161.260.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	5.890	17.434.400	0	2960	2960	100%	Metros cuadrados	0	17.434.400	17.434.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	4.100	12.136.000	0	2960	2960	100%	Metros cuadrados	0	12.136.000	12.136.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	21.000	62.160.000	0	2960	2960	100%	Metros cuadrados	0	62.160.000	62.160.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 6				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	5.700	12.939.000	0	2270	2270	100%	Metros cuadrados	0	12.939.000	12.939.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.270	5.900	13.393.000	0	2270	2270	100%	Metros cuadrados	0	13.393.000	13.393.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454	38.000	17.252.000	0		0	0%	Metro lineal	0	0	0
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23	1.845.670	42.450.410	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625	0		0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043	54.480	111.302.640	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043	5.890	12.033.270	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043	4.100	8.376.300	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043	21.000	42.903.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000
	LOTE N° 7				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	5.700	8.778.000	0	2025	2025	131%	Metros	0	11.542.500	11.542.500
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	1.540	5.900	9.086.000	0	2025	2025	131%	Metros cuadrados	0	11.947.500	11.947.500
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	38.000	16.720.000	0	324	324	74%	Metro lineal	0	12.312.000	12.312.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	1.845.670	40.604.740	0	13,8	13,8	63%	Metros cúbicos	0	25.470.246	25.470.246
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500	0	10	10	67%	Metros cúbicos	0	21.173.000	21.173.000
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	54.480	71.913.600	0	709	709	54%	Metros cuadrados	0	38.626.320	38.626.320
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320	5.890	7.774.800	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320	4.100	5.412.000	0		0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	21.000	27.720.000	0	709	709	54%	Metros cuadrados	0	14.889.000	14.889.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0		0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartelo de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	1	1	100%	Unidad	0	1.650.000	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM

RESUMEN DE CERTIFICADO Nº 1

ID N°: 437.529

DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	2.563.167.926	0,00%	46,84%	46,84%	0	1.200.498.487	1.200.498.487
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	128.158.396	0,00%	2,34%	2,34%	0	60.024.924	60.024.924
B	TOTAL DEDUCCIONES	128.158.396	0,00%	2,34%	2,34%	0	60.024.924	60.024.924
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	2.435.009.530	0,00%	44,49%	44,49%	0	1.140.473.563	1.140.473.563

SON GUARANIES: MIL VEINTE Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTOTREINTA Y DOS.-

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPRESENTANTE LEGAL COPCI S.A.	FISCALIZACION	DIRECCION DE OBRAS DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio B[illegible]gado
Fiscal de [illegible]as

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CRONOGRAMA FISICO

Oferente o Representante Legal: _COPCI S.A_____ Fecha: ___19/04/2024___
Nombre legal del miembro de un Consorcio: __COPCI S.A_____

ITEMS	RUBRO	MONTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
LOTE N° 1	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	3.648.000				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	3.776.000				
3	Construcción de cordon de hormigon	6.080.000				
4	Canal de desague pluvial.	14.765.360				
5	Baden Ho Ao	15.879.750				
6	Pavimento tipo empedrado	30.508.800				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	3.298.400				
8	Compactación mecanica	2.296.000				
9	lavada)	11.760.000				
10	Limpieza final	1.500.000				
11	Cartel de Obras	1.650.000				
LOTE N° 2	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	11.542.500				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	11.947.500				
3	Construcción de cordon de hormigon	17.100.000				
4	Canal de desague pluvial.	41.527.575				
5	Baden Ho Ao	31.759.500				
6	Pavimento tipo empedrado	98.064.000				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	10.602.000				
8	Compactación mecanica	7.380.000				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	37.800.000				
10	Limpieza Final	1.500.000				
11	Cartel Obras	1.650.000				
LOTE N° 3	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	11.400.000				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	11.800.000				
3	Construcción de cordon de hormigon	15.200.000				
4	Canal de desague pluvial.	36.913.400				
5	Baden Ho Ao	23.819.625				
6	Pavimento tipo empedrado	98.064.000				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	10.602.000				
8	Compactación mecanica	7.380.000				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	37.800.000				
10	Limpieza Final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N° 4	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	1.744.200				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	1.805.400				
3	Construcción de cordon de hormigon	4.066.000				
4	Canal de desague pluvial.	9.412.917				
5	Baden Ho Ao	7.939.875				
6	Pavimento tipo empedrado	13.892.400				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	1.501.950				
8	Compactación mecanica	1.045.500				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	5.355.000				
10	Limpieza final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N°5	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	18.981.000				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	19.647.000				
3	Construcción de cordon de hormigon	28.120.000				
4	Construccion de desague pluvial	68.289.790				
5	Baden Ho Ao	15.879.750				
6	Pavimento tipo empedrado	161.260.800				

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	17.434.400				
8	Compactación mecanica	12.136.000				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	62.160.000				
10	Limpieza Final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N° 6	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	12.939.000				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	13.393.000				
3	Construcción de cordon de hormigon	17.252.000				
4	Canal de desague pluvial.	42.450.410				
5	Baden Ho Ao	23.819.625				
6	Pavimento tipo empedrado	111.302.640				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	12.033.270				
8	Compactación mecanica	8.376.300				
9	lavada)	42.903.000				
10	Limpieza Final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N° 7	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	8.778.000				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	9.086.000				
3	Construcción de cordon de hormigon	16.720.000				
4	Canal de desague pluvial.	40.604.740				
5	Baden Ho Ao	31.759.500				
6	Pavimento tipo empedrado	71.913.600				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	7.774.800				
8	Compactación mecanica	5.412.000				
9	Colchon de Arena lavada	27.720.000				
10	Limpieza final	1.500.000				
11	Cartelo de obras	1.650.000				
LOTE N°8	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	3.648.000				
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	3.776.000				
3	Construcción de cordon de hormigon	7.600.000				
4	Canal de desague pluvial.	18.456.700				
5	Baden Ho Ao	6.351.900				
6	Pavimento tipo empedrado	29.419.200				
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	3.180.600				
8	Compactación mecanica	2.214.000				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	11.340.000				
10	Limpieza final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N° 9	0	-				
1	Replanteo y Marcación de obra	19.950.000				
2	Preparación del terreno	20.650.000				
3	Excavación de suelo	9.264.400				
4	Cordon de hormigon	48.000.000				
5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	4.890.600				
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	38.894.400				
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	9.063.306				
8	Canal de desague pluvial	3.200.000				
9	Baden Ho Ao	55.579.125				
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	13.956.800				
11	Disipador de HºAº	6.042.204				
12	Pavimento tipo empedrado	163.440.000				
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	17.670.000				
14	Compactación mecanica	12.300.000				
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	63.000.000				
16	Limpieza Final	5.000.000				
17	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N° 10	0	-				
1	Replanteo y marcación de obra	1.539.000				
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	1.593.000				
3	Construccion de cordon hormigon	2.280.000				
4	Construccion desague pluvial	5.537.010				
5	Baden de Ho Ao	7.939.875				

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

6	Pavimento tipo empedrado	13.075.200				
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	1.413.600				
8	Compactación mecanica	984.000				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	5.040.000				
10	Limpieza Final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				
LOTE N° 11	0	-				
1	Replanteo y marcación de obra	15.823.200				
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	16.378.400				
3	Construccion de cordon hormigon	26.372.000				
4	Canal de desague pluvial	64.044.749				
5	Baden Ho Ao	15.879.750				
6	Pavimento tipo empedrado	132.331.920				
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	14.306.810				
8	Compactacion mecanica	9.958.900				
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	51.009.000				
10	Limpieza final	1.500.000				
11	Cartel de obras	1.650.000				

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Firma
Nombre: Juan Bautista Pérez Rólon
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio B ado
Fiscal de s

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

Oferente o Representante Legal: _COPCI S.A_____ Fecha: ___19/04/2024_____
Nombre legal del miembro de un Consorcio: __COPCI S.A_____

ITEMS	RUBRO	MONTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
LOTE N° 1						
1	Replanteo y Marcación de obra	3.648.000	100,00%			
			3.648.000	-	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	3.776.000	100,00%			
			3.776.000	-	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	6.080.000	100,00%			
			6.080.000	-	-	-
4	Canal de desague pluvial.	14.765.360	100,00%			
			14.765.360	-	-	-
5	Baden Ho Ao	15.879.750	100,00%			
			15.879.750	-	-	-
6	Pavimento tipo empedrado	30.508.800	100,00%			
			30.508.800	-	-	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	3.298.400	100,00%			
			3.298.400	-	-	-
8	Compactación mecanica	2.296.000	100,00%			
			2.296.000	-	-	-
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	11.760.000	100,00%			
			11.760.000	-	-	-
10	Limpieza final	1.500.000	100,00%			
			1.500.000	-	-	-
11	Cartel de Obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	
LOTE N° 2	0,00%	-				
			-	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	11.542.500	100,00%			
			11.542.500	-	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	11.947.500	100,00%			
			11.947.500	-	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	17.100.000	60,00%	40,00%		
			10.260.000	6.840.000	-	-
4	Canal de desague pluvial.	41.527.575	60,00%	40,00%		
			24.916.545	16.611.030	-	-
5	Baden Ho Ao	31.759.500	70,00%	30,00%		
			22.231.650	9.527.850	-	-
6	Pavimento tipo empedrado	98.064.000	60,00%	40,00%		
			58.838.400	39.225.600	-	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	10.602.000	70,00%	30,00%		
			7.421.400	3.180.600	-	-
8	Compactación mecanica	7.380.000		100,00%		
			-	7.380.000	-	-
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	37.800.000	60,00%	40,00%		
			22.680.000	15.120.000	-	-
10	Limpieza Final	1.500.000		100,00%		
			-	1.500.000	-	-
11	Cartel Obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	-
LOTE N° 3	0,00%	-				
			-	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	11.400.000	100,00%			
			11.400.000	-	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	11.800.000	100,00%			
			11.800.000	-	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	15.200.000	50,00%	50,00%		
			7.600.000	7.600.000	-	-
4	Canal de desague pluvial.	36.913.400	50,00%	50,00%		
			18.456.700	18.456.700	-	-
5	Baden Ho Ao	23.819.625	70,00%	30,00%		
			16.673.738	7.145.888	-	-
6	Pavimento tipo empedrado	98.064.000	50,00%	50,00%		
			49.032.000	49.032.000	-	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	10.602.000	50,00%	50,00%		
			5.301.000	5.301.000	-	-
8	Compactación mecanica	7.380.000		100,00%		
			-	7.380.000	-	-
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	37.800.000	50,00%	50,00%		
			18.900.000	18.900.000	-	-
10	Limpieza Final	1.500.000		100,00%		
			-	1.500.000	-	-
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	-
LOTE N° 4	0,00%	-				
			-	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	1.744.200		100,00%		
			-	1.744.200	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	1.805.400		100,00%		
			-	1.805.400	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	4.066.000		100,00%		
			-	4.066.000	-	-
4	Canal de desague pluvial.	9.412.917		100,00%		
			-	9.412.917	-	-
5	Baden Ho Ao	7.939.875		100,00%		
			-	7.939.875	-	-
6	Pavimento tipo empedrado	13.892.400		100,00%		
			-	13.892.400	-	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	1.501.950		100,00%		
			-	1.501.950	-	-
8	Compactación mecanica	1.045.500			100,00%	
			-	-	1.045.500	-

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bo gado
Fiscal de C as

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	5.355.000		100,00%		
			-	5.355.000	-	-
10	Limpieza final	1.500.000			100,00%	
			-	-	1.500.000	-
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	-
LOTE N°5	0,00%	-				
			-	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	18.981.000	100,00%			
			18.981.000	-	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	19.647.000	100,00%			
			19.647.000	-	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	28.120.000	50,00%	50,00%		
			14.060.000	14.060.000	-	-
4	Construccion de desague pluvial	68.289.790	50,00%	50,00%		
			34.144.895	34.144.895	-	-
5	Baden Ho Ao	15.879.750	50,00%	50,00%		
			7.939.875	7.939.875	-	-
6	Pavimento tipo empedrado	161.260.800	50,00%	50,00%		
			80.630.400	80.630.400	-	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	17.434.400	50,00%	50,00%		
			8.717.200	8.717.200	-	-
8	Compactación mecanica	12.136.000		100,00%		
			-	12.136.000	-	-
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	62.160.000	50,00%	50,00%		
			31.080.000	31.080.000	-	-
10	Limpieza Final	1.500.000		100,00%		
			-	1.500.000	-	-
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
LOTE N° 6			1.650.000	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	12.939.000	100,00%			
			12.939.000	-	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	13.393.000	100,00%			
			13.393.000	-	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	17.252.000		40,00%	40,00%	20,00%
			-	6.900.800	6.900.800	3.450.400
4	Canal de desague pluvial.	42.450.410		40,00%	30,00%	30,00%
			-	16.980.164	12.735.123	12.735.123
5	Baden Ho Ao	23.819.625		40,00%	30,00%	30,00%
			-	9.527.850	7.145.888	7.145.888
6	Pavimento tipo empedrado	111.302.640		35,00%	40,00%	25,00%
			-	38.955.924	44.521.056	27.825.660
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	12.033.270		35,00%	40,00%	25,00%
			-	4.211.645	4.813.308	3.008.318
8	Compactación mecanica	8.376.300				100,00%
			-	-	-	8.376.300
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	42.903.000		35,00%	40,00%	25,00%
			-	15.016.050	17.161.200	10.725.750
10	Limpieza Final	1.500.000				100,00%
			-	-	-	1.500.000
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
LOTE N° 7			1.650.000	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	8.778.000	100,00%			
			8.778.000	-	-	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	9.086.000	100,00%			
			9.086.000	-	-	-
3	Construcción de cordon de hormigon	16.720.000	70,00%	30,00%		
			11.704.000	5.016.000	-	-
4	Canal de desague pluvial.	40.604.740	60,00%	40,00%		
			24.362.844	16.241.896	-	-
5	Baden Ho Ao	31.759.500	60,00%	40,00%		
			19.055.700	12.703.800	-	-
6	Pavimento tipo empedrado	71.913.600	60,00%	40,00%		
			43.148.160	28.765.440	-	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	7.774.800	70,00%	30,00%		
			5.442.360	2.332.440	-	-
8	Compactación mecanica	5.412.000		100,00%		
			-	5.412.000	-	-
9	Colchon de Arena lavada	27.720.000	60,00%	40,00%		
			16.632.000	11.088.000	-	-
10	Limpieza final	1.500.000		100,00%		
			-	1.500.000	-	-
11	Cartelo de obras	1.650.000	100,00%			
LOTE N°8			1.650.000	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	3.648.000			100,00%	
			-	-	3.648.000	-
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	3.776.000			100,00%	
			-	-	3.776.000	-
3	Construcción de cordon de hormigon	7.600.000			100,00%	
			-	-	7.600.000	-
4	Canal de desague pluvial.	18.456.700			100,00%	
			-	-	18.456.700	-
5	Baden Ho Ao	6.351.900			100,00%	
			-	-	6.351.900	-
6	Pavimento tipo empedrado	29.419.200			100,00%	
			-	-	29.419.200	-
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	3.180.600			100,00%	
			-	-	3.180.600	-
8	Compactación mecanica	2.214.000				100,00%
			-	-	-	2.214.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	11.340.000			100,00%	
			-	-	11.340.000	-
10	Limpieza final	1.500.000				100,00%
			-	-	-	1.500.000
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
LOTE N° 9			1.650.000	-	-	-
1	Replanteo y Marcación de obra	19.950.000	100,00%			
			19.950.000	-	-	-
2	Preparación del terreno	20.650.000	100,00%			
			20.650.000	-	-	-
3	Excavación de suelo	9.264.400			100,00%	

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

			-	-	9.264.400	-
4	Cordon de hormigon	48.000.000	50,00%	30,00%	20,00%	
			24.000.000	14.400.000	9.600.000	-
5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	4.890.600			100,00%	
			-	-	4.890.600	-
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	38.894.400			100,00%	
			-	-	38.894.400	-
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	9.063.306			100,00%	
			-	-	9.063.306	-
8	Canal de desague pluvial	3.200.000	50,00%	30,00%	20,00%	
			1.600.000	960.000	640.000	-
9	Baden Ho Ao	55.579.125	50,00%	30,00%	20,00%	
			27.789.563	16.673.738	11.115.825	-
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	13.956.800			100,00%	
			-	-	13.956.800	-
11	Disipador de HºAº	6.042.204			100,00%	
			-	-	6.042.204	-
12	Pavimento tipo empedrado	163.440.000	50,00%	30,00%	20,00%	
			81.720.000	49.032.000	32.688.000	-
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	17.670.000	50,00%	30,00%	20,00%	
			8.835.000	5.301.000	3.534.000	-
14	Compactación mecanica	12.300.000				100,00%
			-	-	-	12.300.000
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	63.000.000	50,00%	30,00%	20,00%	
			31.500.000	18.900.000	12.600.000	-
16	Limpieza Final	5.000.000				100,00%
			-	-	-	5.000.000
17	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	-
LOTE N° 10						
1	Replanteo y marcación de obra	1.539.000			100,00%	
			-	-	1.539.000	-
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	1.593.000			100,00%	
			-	-	1.593.000	-
3	Construccion de cordon hormigon	2.280.000			100,00%	
			-	-	2.280.000	-
4	Construccion desague pluvial	5.537.010			100,00%	
			-	-	5.537.010	-
5	Baden de Ho Ao	7.939.875			100,00%	
			-	-	7.939.875	-
6	Pavimento tipo empedrado	13.075.200			100,00%	
			-	-	13.075.200	-
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	1.413.600			100,00%	
			-	-	1.413.600	-
8	Compactación mecanica	984.000			100,00%	
			-	-	984.000	-
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	5.040.000			100,00%	
			-	-	5.040.000	-
10	Limpieza Final	1.500.000			100,00%	
			-	-	1.500.000	-
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	-
LOTE N° 11						
1	Replanteo y marcación de obra	15.823.200		100,00%		
			-	15.823.200	-	-
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	16.378.400		100,00%		
			-	16.378.400	-	-
3	Construccion de cordon hormigon	26.372.000		60,00%	40,00%	
			-	15.823.200	10.548.800	-
4	Canal de desague pluvial	64.044.749		60,00%	40,00%	
			-	38.426.849	25.617.900	-
5	Baden Ho Ao	15.879.750		70,00%	30,00%	
			-	11.115.825	4.763.925	-
6	Pavimento tipo empedrado	132.331.920		60,00%	40,00%	
			-	79.399.152	52.932.768	-
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	14.306.810		60,00%	40,00%	
			-	8.584.086	5.722.724	-
8	Compactacion mecanica	9.958.900				100,00%
			-	-	-	9.958.900
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	51.009.000		60,00%	40,00%	
			-	30.605.400	20.403.600	-
10	Limpieza final	1.500.000				100,00%
			-	-	-	1.500.000
11	Cartel de obras	1.650.000	100,00%			
			1.650.000	-	-	-
		2.563.167.926				

AVANCE MENSUAL EN GUARANIES	-	1.016.449.739	946.701.638	492.776.211	107.240.338
AVANCE ACUMULADO EN GUARANIES	-	1.016.449.739	1.963.151.377	2.455.927.588	2.563.167.926

AVANCE MENSUAL EN %	0,00%	39,66%	36,93%	19,23%	4,18%
AVANCE ACUMULADO EN %	0,00%	39,66%	76,59%	95,82%	100,00%

Firma
Nombre: Juan Bautista Pérez Rólon
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CURVA DE AVANCE

Oferente o Representante Legal: _COPCI S.A_____ Fecha: ___19/04/2024_____
Nombre legal del miembro de un Consorcio: __COPCI S.A_____

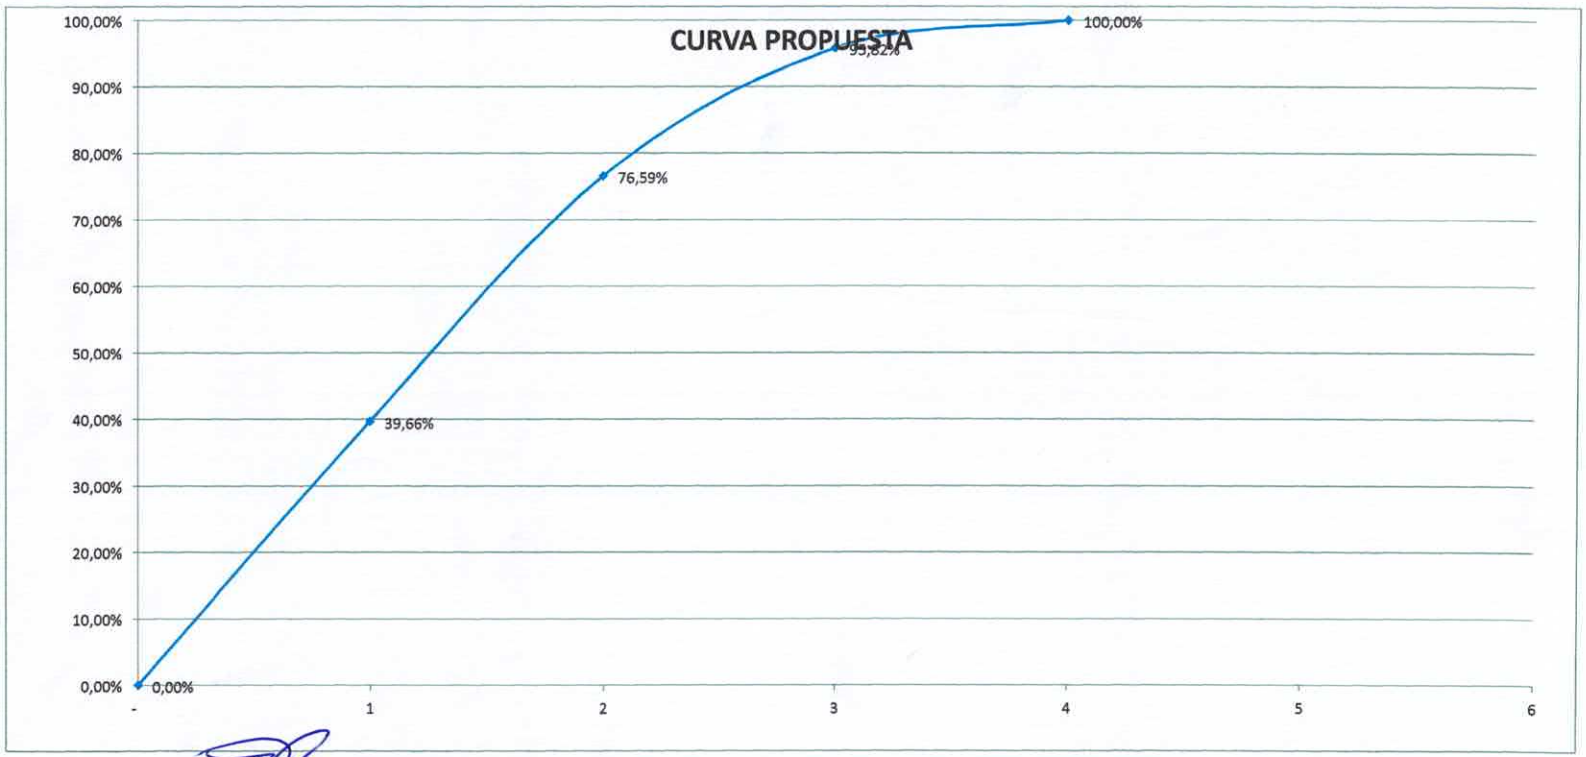

Firma

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Nombre: Juan Bautista Pérez Rólon
En calidad de: REPRESENTATE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

Saltos del Guairá, 08 de MAYO del 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD** con ID: N.º 437.529 Contrato N.º 14/2024, adjudicada a INGECON INGENIERIA

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

ID NRO: 437.529

CONTRATO NRO: 14/2024

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EMPRESA COPCI S.A

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los computos metricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5684
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 08 DE MAYO DE 2.024

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000552

OBRA: constrocacion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A

CHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio 29 de Septiembre

AVANCES DE OBRA

16-04-24 - Replanteo y Marcacion
18-04-24 - preparacion del terreno
20-04-24 - Fabricacion de cordones
22-04-24 - Colocacion de cordon y Carga de badenes
24-04-24 - Colocacion de colchon de Arena
26-04-24 - Colocacion de Pavimento petreo
29-04-24 - Trabajos Normales
04-05-24 - Colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000553

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion Oliveira Rm2

AVANCES DE OBRA

15-04-2024 - Replanteo y Marcacion de obra

17-04-2024 - Preparacion del terreno

19-04-2024 - Fabricacion de cordon y preparacion para carga de baden

22-04-2024 - Colocacion de cordon y carga de badenes

23-04-2024 - Colocacion de colchon de Arena

25-04-2024 - Colocacion de Pavimento Petreo

28-04-2024 - Acopio de materiales

03-05-2024 - Colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo

OBSERVACIÓN:

FIRMA CONTRATISTA

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000554

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Canela Km 2

AVANCES DE OBRA

17-04-2024- Replanteo y Marcacion de obra

18-04-2024- Preparacion del terreno

19-04-2024 - Fabricacion de cordon y Preparacion para carga de baden

22-04-2024- Colocacion de cordon y carga de bardenes

24-04-2024- Colocacion de colchon de Arena

26-04-2024- Colocacion de Pavimento Petreo

30-04-2024- Acopio de materiales y Trabajos normales

04-05-2024 Colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo

OBSERVACIÓN:

FIRMA CONTRATISTA

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Vicente Bogado Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000555

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Gemisa 1.

AVANCES DE OBRA

15-04-24 - Replanteo y Marcacion de obra

16-04-24 - Preparacion del terreno

18-04-24 - Fabricacion de cordones y Preparacion para carga de badenes

20-04-24 - Colocacion de cordones y Carga de badenes

23-04-24 - Colocacion de colchon de Arena

26-04-24 - Colocacion de pavimento petreo

03-05-24 - colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo

04-05-24 - Colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

FIRMA CONTRATISTA

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000557

OBRA: Construccion de pavimentos petreos en distintos puntos de la Ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion la vitoria

AVANCES DE OBRA

29-04-24 - Replanteo y Marcacion de obra

30-04-24 - Preparacion de terreno

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Arquitecto Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000558

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos dela ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion Moran km 6

AVANCES DE OBRA

18-04-24- Replanteo y Marcacion de obra

19-04-24- Preparacion del terreno

20-04-24- Fabricacion de cordon y preparacion para carga de badenes

22-04-24- Colocacion de colchon de Arena

24-04-24- Colocacion de Pavimento Petreo

27-04-24- Acopio de materiales y trabajos normales

30-04-24- Colocacion de colchon de Arena

03-05-24- Colocacion de Pavimento Petreo

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000559

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la Ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437 529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion Alvarenga

AVANCES DE OBRA

17-04-24 - Replanteo y Marcacion de obra
18-04-24 - Preparacion de terreno
19-04-24 - Fabricacion de cordon y preparacion para carga de baden
22-04-24 - Colocacion de cordon y carga de baden
25-04-24 - Colocacion de colchon de Arena
27-04-24 - Colocacion de Pavimento Petreo
30-04-24 - Trabajos normales y Acopio de materiales
04-05-24 - Colocacion de colchon de arena y pavimento petreo

OBSERVACIÓN:

FIRMA CONTRATISTA

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000560

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: Copci S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437 329 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Campo Verde Km 6

AVANCES DE OBRA

02-05-24- Replanteo y Marcacion de obra

03-05-24- Preparacion de terreno

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

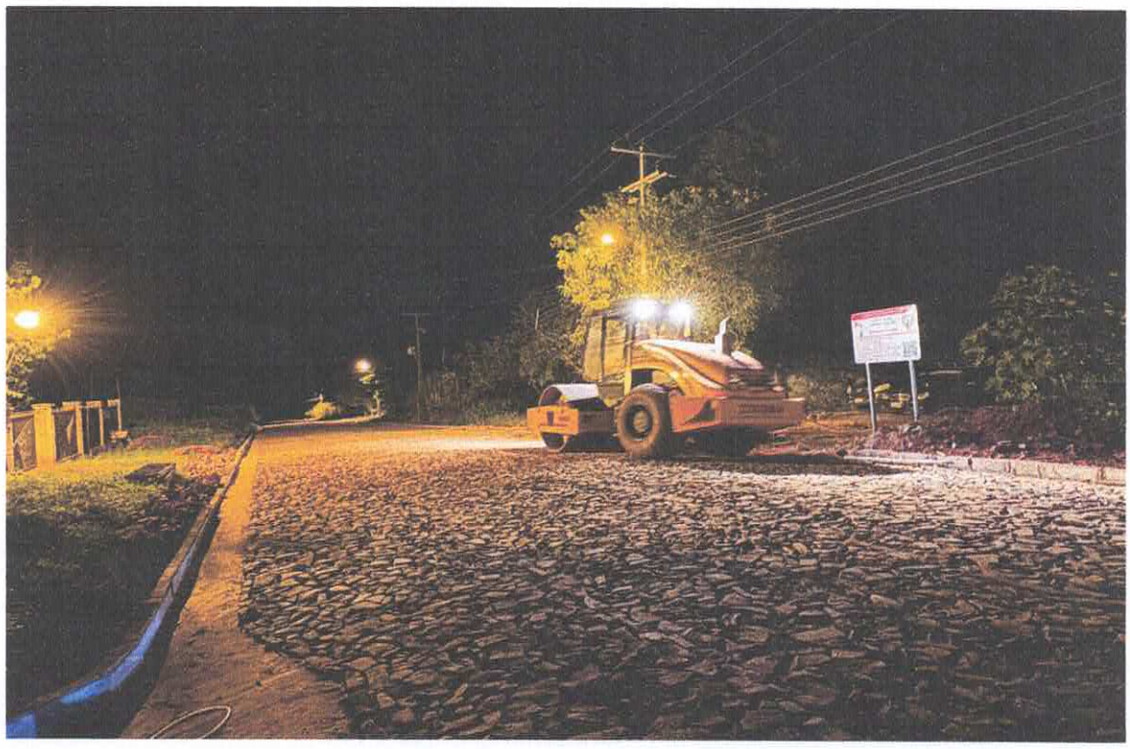

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
