GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

RESUMEN DE PAGO PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 1
ADDENDA N° 2

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre	Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Conceptos	Importes Autorizados		Importes certificados					
				Hasta certificado anterior		Presente Certificado		Total certificado a la fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%	3.417.500.000	0,00%	0	0,00%	3.417.500.000	0,00%	3.417.500.000
A.2	Precios Unitarios	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
A	Total Guaranies	0,00%	3.417.500.000	0,00%	0	100,00%	3.417.500.000	100,00%	3.417.500.000

Gobernacion de Ñeembucu

Contrato N° LPN 09/2022

Monto Gs. 34.040.000.000.-

Monto Adenda Gs. 3.417.500.000.-

Contratista: CONSORCIO ITACORA

Fecha de Inicio: 17 - Noviembre - 22

Plazo de Ejecucion (dias): 540

Fecha de Terminación: 17 - Abril - 24

B	Deducciones a la fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.1	Devolución del Anticipo	20,00%	0	0	0	0
B.2	Para fondo de Reparo	5,00%	0	0	0	0
B.3	Otras deducciones		0	0	0	0
BII	Total deducciones		0	0	0	0

Gobernacion de Ñeembucu

Secretaria de Obras Publicas

Mesa de Entrada

C.1	IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	3.417.500.000
C.2	MULTAS	0
C	**IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)**	**3.417.500.000**

SON GUARANÍES: Tres mil cuatrocientos diez y siete millones quinientos mil guaranies .----------

Viviana Núñez Corbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 1 ADDENDA N° 2

Monto Total General: 3.417.500.000

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad Ampliacion	Cantidad a Ejecutar	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
								Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS															
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	9.400,00	9.400,00	22.500	211.500.000	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	100,0%	0	211.500.000	211.500.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.600,00	8.600,00	22.500	193.500.000	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0%	0	193.500.000	193.500.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	9.000,00	9.000,00	22.500	202.500.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0%	0	202.500.000	202.500.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.500,00	30.500,00	28.000	854.000.000	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	100,0%	0	854.000.000	854.000.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO															
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	42.000,00	42.000,00	33.000	1.386.000.000	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0%	0	1.386.000.000	1.386.000.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO															
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	1,00	570.000.000	570.000.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100,0%	0	570.000.000	570.000.000	0	100,00%
		TOTAL					3.417.500.000						0	3.417.500.000	3.417.500.000	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80179225-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro Nº 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 1 ADDENDA N° 2 RESUMEN POR TRAMO GENERAL

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre	Año: 2023

	Tramos de Caminos a Enrripiar	Costo Guaranies	Ejecutado Guaranies	Saldo Guaranies	Porcentaje de Avance
1	Villa Oliva	1.860.750.000,00	1.860.750.000	-	100,00%
4	Calles de la Ciudad de Alberdi	1.556.750.000,00	1.556.750.000	-	100,00%
	Total General	3.417.500.000,00	3.417.500.000	-	100,00%

Viviana Núñez Cordini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

AVANCE	
Mes:	Julio, Agosto y Setiembre

CONTRATISTA : CONSORCIO ITACORA

ADDENDA N° 2

PAVIMENTOS ENRRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - LPN 09 -2022 - ID N° 412.692

CURVA CONTRACTUAL Y AVANCE

	AVANCE FINANCIERO				AVANCE %				DESVÍO + -	
	PREVISTO Gs.		EJECUTADO Gs.		PREVISTO		EJECUTADO			
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%		
jul-23	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	29,26%	29,26%	0,00%	0,00%	-29,26%	atraso
ago-23	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0	29,26%	58,52%	0,00%	0,00%	-58,52%	atraso
sept-23	1.417.500.000	3.417.500.000	3.417.500.000	3.417.500.000	41,48%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Ok
TOTALES	3.417.500.000				100,00%					

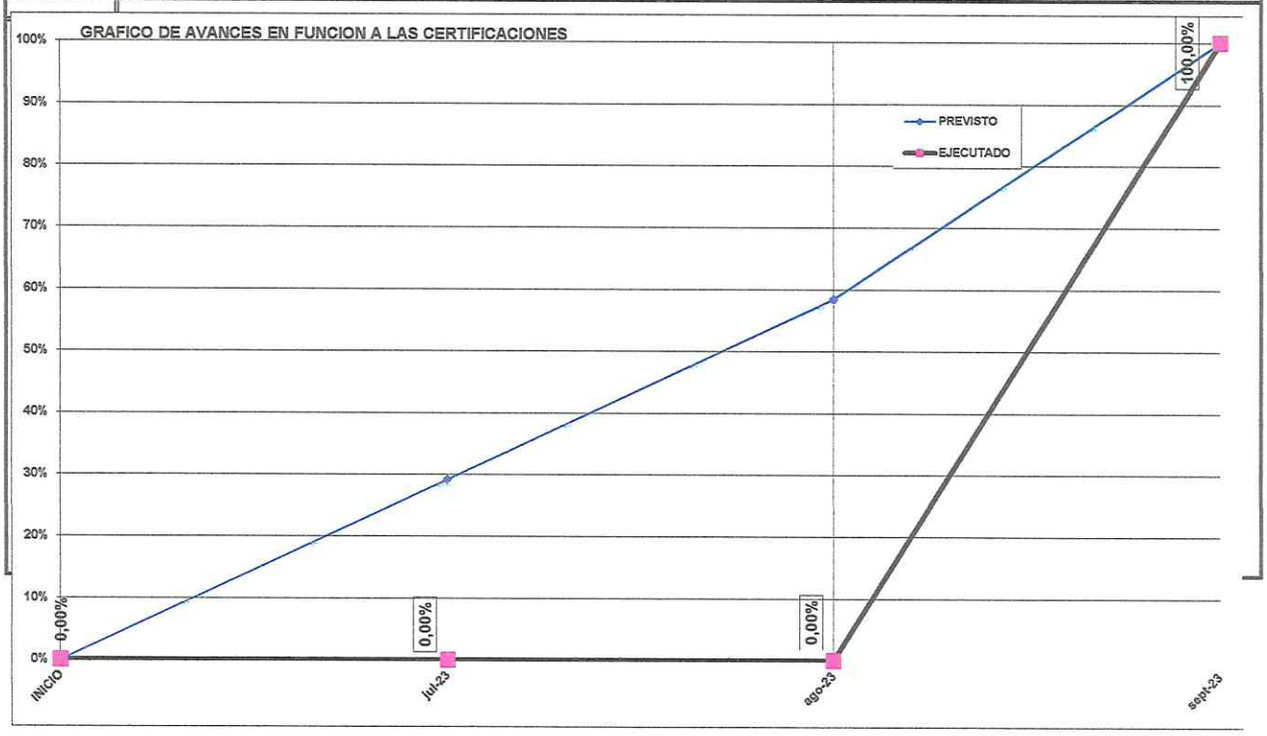

Vivian Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 1 ADDENDA N° 2 TRAMO: " Alberdi "

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad Ampliacion	Cantidad a Ejecutar	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
								Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS															
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	4.700,00	4.700,00	22.500	105.750.000	0,0	4.700,0	4.700,0	0,0	100,0%	0	105.750.000	105.750.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	4.300,00	4.300,00	22.500	96.750.000	0,0	4.300,0	4.300,0	0,0	100,0%	0	96.750.000	96.750.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	4.500,00	4.500,00	22.500	101.250.000	0,0	4.500,0	4.500,0	0,0	100,0%	0	101.250.000	101.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	20.000,00	20.000,00	28.000	560.000.000	0,0	20.000,0	20.000,0	0,0	100,0%	0	560.000.000	560.000.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO															
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	21.000,00	21.000,00	33.000	693.000.000	0,0	21.000,0	21.000,0	0,0	100,0%	0	693.000.000	693.000.000	0	100,00%
		TOTAL					1.556.750.000						0	1.556.750.000	1.556.750.000	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 1 ADDENDA N° 2 TRAMO: Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad Ampliacion	Cantidad a Ejecutar	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
								Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS															
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	4.700,00	4.700,00	22.500	105.750.000	0,0	4.700,0	4.700,0	0,0	100,0%	0	105.750.000	105.750.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	4.300,00	4.300,00	22.500	96.750.000	0,0	4.300,0	4.300,0	0,0	100,0%	0	96.750.000	96.750.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	4.500,00	4.500,00	22.500	101.250.000	0,0	4.500,0	4.500,0	0,0	100,0%	0	101.250.000	101.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	10.500,00	10.500,00	28.000	294.000.000	0,0	10.500,0	10.500,0	0,0	100,0%	0	294.000.000	294.000.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO															
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	21.000,00	21.000,00	33.000	693.000.000	0,0	21.000,0	21.000,0	0,0	100,0%	0	693.000.000	693.000.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO															
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	1,00	570.000.000	570.000.000	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0%	0	570.000.000	570.000.000	0	100,00%
		TOTAL					1.860.750.000						0	1.860.750.000	1.860.750.000	0	100,00%

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

PLANILLA MEDICION PARA CERTIFICADO DE OBRA N° 1 ADDENDA N° 2 LPN 09-2022

- Villa Oliva

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad a Ejecutar	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	4.700,00		4.700,00	4.700	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	4.300,00		4.300,00	4.300	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	4.500,00		4.500,00	4.500	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	10.500,00		10.500,00	10.500	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	21.000,00		21.000,00	21.000	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00		1,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Alberdi "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad a Ejecutar	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	4.700,00		4.700,00	4.700	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	4.300,00		4.300,00	4.300	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	4.500,00		4.500,00	4.500	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	20.000,00		20.000,00	20.000	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	21.000,00		21.000,00	21.000	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

TOTAL GENERAL

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Julio, Agosto y Setiembre					Año: 2023			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad a Ejecutar	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC: 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

Ernesto Zarza
Ingeniero Civil
Registro N° 5370
