GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 6

Mes: jul-24

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Certificado Presente		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574	94,63%	792.728.429	83,84%	702.384.158	11,07%	47.759.573	89,55%	750.143.731
A.II	ADENDA N°1	5,37%	44.996.887				44.996.887	5,37%	44.996.887
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**837.725.316**	**83,84%**	**702.384.158**	**11,07%**	**92.756.460**	**94,92%**	**795.140.618**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	158.545.686	140.486.314	18.059.372	158.545.686
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	-	0
B	**Total Deducciones**		**158.545.686**	**140.486.314**	**18.059.372**	**158.545.686**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				74.697.088	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**74.697.088**	

Certificado Básico Nº 6	
Mes:	jul-24
Contrato N°:	65/23
Monto Básico:	792.728.429
Contratista: Los Andes Ingenieria SRL	
Fecha de Inicio:	20-dic-23
Plazo de Ejecución:	210 días
Fecha de Terminación:	17/7/2024
Fecha de Vigencia de Caución Ejecución de contrato:	18/12/2024

SON GUARANIES: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras y Transporte

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingenieria SRL
Contratista

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

CERTIFICADO BASICO DE OBRAS N° 6
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574

CONTRATISTA: Los Andes Ingeniería SRL	
MONTO DE LA OFERTA: 792.728.429 Gs	

FECHA:	5/7/2024
CONTRATO N°:	65/23
PLAZO:	210 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS										PLANILLA DE MEDICIÓN N° 6						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 6					
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574				Monto contractual		Modificaciones según ADENDA 1			INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Preparación de obra - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	610	4 098	2 499 780	610	4 098	2 499 780	0,32%	100%	0%	100%	0,32%	0,00%	0,32%	610,00	**0,00**	610,00	2 499 780,0	0	2 499 780
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	600	4 233	2 539 800	600	4 233	2 539 800	0,32%	100%	0%	100%	0,32%	0,00%	0,32%	600,00	**0,00**	600,00	2 539 800,0	0	2 539 800
3	Preparación de obra - Vallado de Obra, altura h=1,50 m	Metro lineal	150	53 232	7 984 800	150	53 232	7 984 800	1,01%	100%	0%	100%	1,01%	0,00%	1,01%	150,00	**0,00**	150,00	7 984 800,0	0	7 984 800
4	Cartel de obra	Unidad	1	910 351	910 351	1	910 351	910 351	0,11%	100%	0%	100%	0,11%	0,00%	0,11%	1,00	**0,00**	1,00	910 351,0	0	910 351
5	Servicio de Excavación Estructural - Excavación de suelo	Metros cúbicos	450	30 214	13 596 300	520,1	30 214	15 714 301	1,72%	100%	16%	116%	1,72%	0,27%	1,98%	450,00	**70,10**	520,10	13 596 300,0	2 118 201	15 714 301
6	Colocación de hormigón armado - Hormigonado de zapatas	Metros cúbicos	40	1 975 817	79 032 680	19,8	1 975 817	39 121 177	9,97%	100%	50%	50%	9,97%	-5,03%	4,94%	40,00	**-20,20**	19,80	79 032 680,0	-39 911 503	39 121 177
7	Preparación de obra - Relleno y compactación	Metros cúbicos	90	37 535	3 378 150	90,0	37 535	3 378 150	0,43%	100%	0%	100%	0,43%	0,00%	0,43%	90,00	**0,00**	90,00	3 378 150,0	0	3 378 150
8	Colocación de hormigón armado - Hormigonado vigas de encadenado inferior	Metros cúbicos	15	2 082 837	31 242 555	11,835	2 082 837	24 650 376	3,94%	79%	0%	79%	3,11%	0,00%	3,11%	11,835	**0,000**	11,835	24 650 375,9	0	24 650 376
9	Pilar -Pilares y fustes	Metros cúbicos	35	2 477 248	86 703 680	29,65	2 477 248	73 450 403	10,94%	72%	12%	85%	7,91%	1,35%	9,27%	25,32	**4,33**	29,65	62 723 919,4	10 726 484	73 450 403
10	Colocación de hormigón armado - Vigas	Metros cúbicos	30	2 963 080	88 892 400	33,26	2 963 080	98 552 041	11,21%	100%	-31%	69%	11,21%	-3,44%	7,77%	30,00	**-9,20**	20,80	88 892 400,0	-27 260 336	61 632 064
11	Colocación de hormigon armado - Losas	Metros cúbicos	44	2 157 355	94 923 620	27,08	2 157 355	58 421 173	11,97%	62%	0%	62%	7,37%	0,00%	7,37%	27,08	**0,00**	27,08	58 421 173,4	0	58 421 173
12	Colocación de hormigon armado -Escalera	Metros cúbicos	8	2 531 631	20 253 048	8,0	2 531 631	20 253 048	2,55%	100%	0%	100%	2,55%	0,00%	2,55%	8,00	**0,00**	8,00	20 253 048,0	0	20 253 048
13	Colocación de hormigon armado - Losa de reacción	Metros cúbicos	65	3 170 460	206 079 900	65,0	3 170 460	206 079 900	26,00%	100%	0%	100%	26,00%	0,00%	26,00%	65,00	**0,00**	65,00	206 079 900,0	0	206 079 900
14	Colocacion de hormigon armado - Vigas en losa de reacción	Metros cúbicos	20	2 749 311	54 986 220	19,87	2 749 311	54 628 810	6,94%	100%	1%	99%	6,94%	-0,05%	6,89%	20,00	**-0,13**	19,87	54 986 220,0	-357 410	54 628 810
15	Colocación de hormigon armado -Losa subsuelo	Metros cúbicos	25	2 031 808	50 795 200	25,0	2 031 808	50 795 200	6,41%	100%	0%	100%	6,41%	0,00%	6,41%	25,00	**0,00**	25,00	50 795 200,0	0	50 795 200
16	Colocación de hormigon armado - Vigas de encadenado superior y dinteles de HA°	Metros cúbicos	25	1 830 689	45 767 225	25,0	1 830 689	45 767 225	5,77%	56%	32%	88%	3,23%	1,82%	5,06%	14,00	**7,90**	21,90	25 629 646,0	14 462 443	40 092 089
17	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	610	5 152	3 142 720	610	5 152	3 142 720	0,40%	0%	100%	100%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00	**610,00**	610,00	0,0	3 142 720	3 142 720
	Total				**792.728.429**				100%	83,84%	-4,43%	79,42%	83,84%	**-4,43%**	79,42%				702 384 158	**-37.079.601**	665 304 557
										ADENDA											
18	Demolición de cabezales de hormigón armado, pilotes, caseta de laboratorio y árboles	Global				1,0	6 600 000	6 600 000	0,00%	0%	100%	100%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00	**1,00**	1,00	0,0	6 600 000	6 600 000
19	Remocion y reposición de caños de agua corriente con accesorios de 1"	Metros lineales				55,0	54.000	2 970 000	0,00%	0%	100%	100%	0,00%	0,35%	0,35%	0,00	**55,00**	55,00	0,0	2 970 000	2 970 000
20	Remoción de columna de alumbrado público y readecuación de cables	Unidad				1,0	1 482 600	1 482 600	0,00%	0%	100%	100%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00	**1,00**	1,00	0,0	1 482 600	1 482 600
21	Colocación de hormigón armado - Hormigonado de zapatas corridas	Metros cúbicos				34,8	1 975 817	68 758 432	0,00%	0%	100%	100%	0,00%	8,21%	8,21%	0,00	**34,80**	34,80	0,0	68 758 432	68 758 432
22	Colocación de hormigon armado -Tabique de Hormigón Armado	Metros cúbicos				19,76	2 531 631	50 025 029	0,00%	0%	100%	100%	0,00%	5,97%	5,97%	0,00	**19,76**	19,76	0,0	50 025 029	50 025 029
	Total				**792.728.429**			**837.725.316**	100%	83,84%	11,07%	94,92%	83,84%	**11,07%**	94,92%				702 384 158	**92.756.460**	795 140 618

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mena
Los Andes Ingeniería SRL
Contratista

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083867-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 6

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574

Contrato N°	65/23		
Monto del Contrato:	792.728.429	Term. Prevista:	17/7/2024
Plazo Contractual:	210 días	Ampliaciones:	
Inicio de Obra:	20-dic-23	Mes:	Julio, 2024

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N° 79/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	67.047.371	67.047.371	19.885.509	19.885.509	8,46%	8,46%	2,51%	2,51%
Enero	83.913.368	150.960.739	79.542.034	99.427.543	10,59%	19,04%	10,03%	12,54%
Febrero	172.168.758	323.129.496	156.250.526	255.678.069	21,72%	40,76%	19,71%	32,25%
Marzo	134.656.862	457.786.358	135.201.969	390.880.038	16,99%	57,75%	17,06%	49,31%
Abril	169.030.486	626.816.843	85.829.452	476.709.490	21,32%	79,07%	10,83%	60,14%
Mayo	94.075.566	720.892.409	225.662.815	702.372.306	11,87%	90,94%	28,47%	83,84%
Junio	71.836.020	792.728.429	92.756.460	795.128.766	9,06%	100,00%	11,07%	94,92%
Julio	0	0	0	0				

CURVA DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

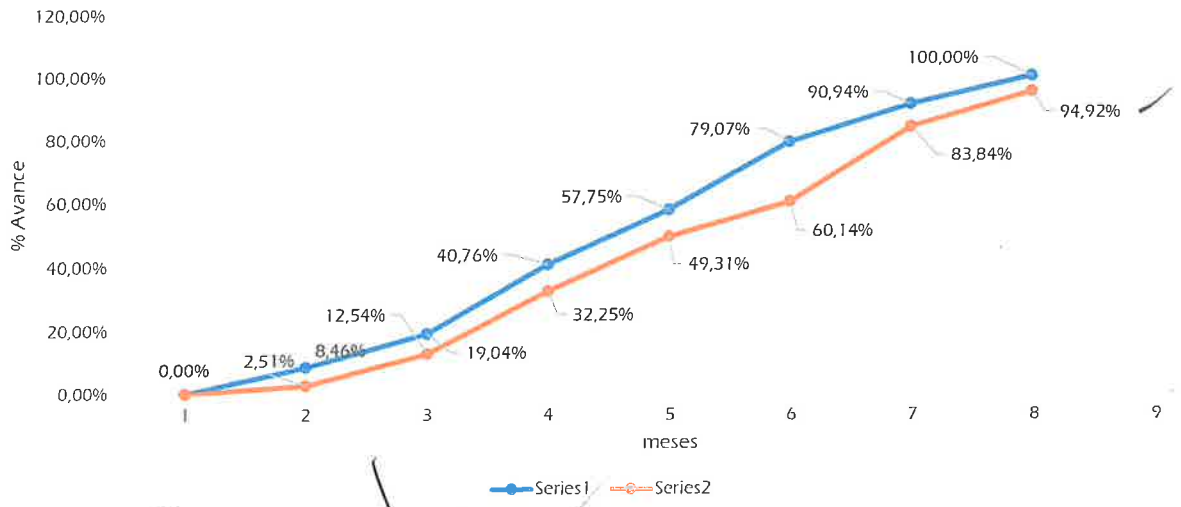

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Aarón Mellid
Representante Legal
Los Andes Ingeniería S.R.L.

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC. 80063861-0

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 6

CONTRATO N° 65/2023

REFERENCIA: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – PLURIANUAL" ID 433.574

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.

En el Barrio Kaaguy Rory de la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los cinco días del mes de julio de dos mil veinticuatro, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa el Ing. Fernando Oreggioni, encargado de la verificación y fiscalización de la obra y el Ing. Aarón Mellid, Socio Gerente de la empresa contratista.

Quienes suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados en el mes de julio 2024.

En la verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscriben la presente acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado más arriba.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniería SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 6

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574

CONTRATISTA: Los Andes Ingeniería S.R.L	
MONTO DE LA OFERTA: 190.171.068 Gs.	

FECHA:	5/7/2024
CONTRATO N°:	65/23
PLAZO:	210 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - ID N° 433.574				Los Andes Ingeniería SRL		PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
1	Preparación de obra - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	610	4.098	2.499.780	2.499.780								0,32%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	600	4.233	2.539.800	2.539.800								0,32%
3	Preparación de obra - Vallado de Obra, altura h=1,50 m	Metro lineal	150	53.232	7.984.800	7.984.800								1,01%
4	Cartel de obra	Unidad	1	910.351	910.351	910.351								0,11%
5	Servicio de Excavación Estructural - Excavación de suelo	Metros cúbicos	450	30.214	13.596.300	13.596.300								1,72%
6	Colocación de hormigón armado - Hormigonado de zapatas	Metros cúbicos	40	1.975.817	79.032.680	39.516.340	39.516.340							9,97%
7	Preparación de obra - Relleno y compactación	Metros cúbicos	90	37.535	3.378.150		3.378.150							0,43%
8	Colocación de hormigón armado - Hormigonado vigas de encadenado inferior	Metros cúbicos	15	2.082.837	31.242.555		15.621.278	15.621.278						3,94%
9	Pilar -Pilares y fustes	Metros cúbicos	35	2.477.248	86.703.680			86.703.680						10,94%
10	Colocación de hormigón armado - Vigas	Metros cúbicos	30	2.963.080	88.892.400			44.446.200	44.446.200					11,21%
11	Colocación de hormigon armado - Losas	Metros cúbicos	44	2.157.355	94.923.620				47.461.810	47.461.810				11,97%
12	Colocación de hormigon armado -Escalera	Metros cúbicos	8	2.531.631	20.253.048					10.126.524	10.126.524			2,55%
13	Colocación de hormigon armado - Losa de reacción	Metros cúbicos	65	3.170.460	206.079.900					68.693.300	68.693.300	68.693.300		26,00%
14	Colocación de hormigon armado - Vigas en losa de reacción	Metros cúbicos	20	2.749.311	54.986.220				27.493.110	27.493.110				6,94%
15	Colocación de hormigon armado -Losa subsuelo	Metros cúbicos	25	2.031.808	50.795.200		25.397.600	25.397.600						6,41%
16	Colocación de hormigon armado - Vigas de encadenado superior y dinteles de H°A°	Metros cúbicos	25	1.830.689	45.767.225				15.255.742	15.255.742	15.255.742			5,77%
17	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	610	5.152	3.142.720							3.142.720		0,40%
	Total				792.728.429									100%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						67.047.371	83.913.368	172.168.758	134.656.862	169.030.486	94.075.566	71.836.020	0	792.728.429
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						8,46%	10,59%	21,72%	16,99%	21,32%	11,87%	9,06%	0,00%	100%

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería SRL
Contratista

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME FINAL - CERTIFICADO N°6 JULIO 2024

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 07/2023 "Construcción de Laboratorio de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Itapuá 1RA ETAPA" ID N° 433.574

OBRA: Construcción de Laboratorio de Ingeniería Civil.
BENEFICIARIO: Universidad Nacional de Itapuá.
FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni
AVANCE DE OBRA: 94,92 %

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Universidad Nacional de Itapúa- Barrio Ka'aguy Rory	Encarnación	792.728.429 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Los Andes Ingeniería S.R.L	0985 754 042	65/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días	20 - Diciembre - 2023	17 – Julio - 2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 05/07/2024 se ha constatado el avance de la obra, hasta la fecha es de 94,92 %, en relación a su cronograma físico financiero correspondiente al mes de Julio.

Teniendo en cuenta el pedido de adenda de contrato solicitado por el contratista la fiscalización realizo las mediciones correspondientes del ítem contractual compensado y los trabajos adicionales realizados para el certificado actual:

En conclusión, todos los ítems contractuales fueron ejecutado correctamente, en cuando a algunos rubros compensado se encontró menor cantidad ejecutada de los siguientes item:

1-Item N° 6 Colocación de hormigón armado – Hormigonado de zapatas: Reducción en las dimensiones de las zapatas, se redujo las dimensiones de las zapatas después de la verificación correspondiente.

2-Item N° 10 Colocación de hormigón armado – Vigas: Tras verificación de la fiscalización se encontró menor cantidad de volumen previsto en la obra.

3-Item N° 14 Colocación de hormigón armado – Vigas en losa de reacción: Tras verificación de la estructura prevista se encontró menor cantidad de hormigón en la obra por lo que en el certificado actual se modifica con la cantidad ejecutada correspondiente.

Ítem nuevos No contemplados en planilla;

1 – Ítem N° 18 Demolición de cabezales de hormigón armado, pilotes, caseta de laboratorio y arboles: Se realizó correctamente los trabajos adicionales de este ítem.

2-Item N° 19 Remoción y reposición de caños de agua corriente con accesorios de 1: El mismo no fue previsto en la planilla de precios contractual. Durante la excavación dentro del área a construir se encontraron cañerías de agua corriente por lo que se tuvo que realizar los trabajos.

3-Item N° 20 Remoción de columna de alumbrado público y readecuación de cables: Se identifico un poste de alumbrado público que requirió ser removido.

4-Item N° 21 Colocación de Hormigón armado – Hormigonado de zapatas corrida: Se ejecuto correctamente todos los trabajos de este ítem.

5-Item N° 22 Colocación de hormigón armado. Tabique de Hormigón Armado: Se ejecuto correctamente los trabajos de tabique de Hormigón Armado.

Observación: Se presento un informe con los resultados del recalculo de las losas y vigas de reacción de la obra, dicho informe fue realizado por el calculista Ing. Prof. Gustavo Chávez, profesional con Reg. Prof. N°: 7.974 teniendo en cuenta que la obra será destinada a un laboratorio de ensayos de vigas y para una mayor seguridad y sostenibilidad de la misma se agregó una columna de Hormigón Armado con zapata en el centro de la losa de reacción.
Número de expediente del Informe del Recalculo de las Losas y Vigas: 1.852

Se adjunta a la presente fotografías de las zonas donde se ejecutarán las obras mencionadas.

La obra se da por concluir con un porcentaje de 94,92%, incluyendo la ampliación de montos.

.....
Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Obs: Se agrego una columna de hormigón armado con zapata en el centro de la losa de reacción.

FOTOS ACTUALIZADAS:

Teléf: +595 [illegible] 204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapua@yahoo.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Fernando Gregolon
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +595 71 214 568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
