FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO EONOMICO

UBICACIÓN: BARRIO SAN BLAS

ID NRO: 423.566

CONTRATO NRO: 65/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N.º 02 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Jose Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Delgado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 31 **DE** agosto **DE** 2.023

Señor

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 30 de AGOSTO 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 02

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 02** del **Contrato 65/2023 "CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONÓMICO"**, por la suma de **GUARANÍES DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (280.968.250).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2488
FECHA 31/08/23 HORA 09:20
CANT HOJAS 7
NUMERO DE CEL: 81.312.020 Mónica G
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO

RESUMEN DE CERTIFICADO Nº 2

ID N°: 423.566

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	2.186.332.700	28,90%	12,85%	41,75%	631.814.750	280.968.250	912.783.000
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	109.316.635	1,44%	0,64%	2,09%	31.590.738	14.048.413	45.639.150
B	TOTAL DEDUCCIONES	109.316.635	1,44%	0,64%	2,09%	31.590.738	14.048.413	45.639.150
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	2.077.016.065	27,45%	12,21%	39,66%	600.224.013	266.919.838	867.143.850

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Delgado
Fiscal de Obras.

34	Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00	Unidad	3	2.800.000	8.400.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
35	Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa	Unidad	6	380.000	2.280.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
36	Conexión desague cloacal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
37	Desague Cloacal: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final	Unidad	1	18.869.700	18.869.700			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
38	Sistema de agua potable: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
39	Construccion de portico para acceso principal	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
40	Provision y colocacion de revestimiento tipo ACM	Metros cuadrados	19	1.180.000	22.420.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
41	Cartel acrilico con soporte (Provision y colocacion de letras corporeas)	Unidad	32	450.000	14.400.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	3	350.000	1.050.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
	TOTAL				**2.186.332.700**				**41,75%**		**631.814.750**	**280.968.250**	**912.783.000**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	**Gs.**	**280.968.250**
*** (-) Anticipo recibido**	**Gs.**	**0**
(-) Retención - Fondo de Reparo	**Gs.**	**14.048.413**
*** Total certificado del mes**	**Gs.**	**266.919.838**
Total a abonar por el presente certificado	**Gs.**	**266.919.838**

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _30_/08_/_2023_

FISCAL DE OBRAS

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 2

OBRA CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO
ZONA BARRIO CANINDEYU
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 29/8/2023
ID N°: 423.566

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Replanteo y marcacion general de la obra	Metros cuadrados	1.620	1620		1.620,00	100,00
2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	486	486		486,00	100,00
3	Hormigon (Zapata ciclopeo 1.30x1.30x0.65)	Metros cúbicos	46	46		46,00	100,00
4	Pilotin de hormigon	Metros cúbicos	21	21		21,00	100,00
5	Hormigon. (Encadenado inferior central y superior (12x30)	Metros cúbicos	16	5,35	5,35	10,70	66,88
6	Piso de Ho Ao espesor 15cm incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (incluye rampa de acceso)	Metros cuadrados	1.620	540	320	860,00	53,09
7	Pilares Ho Ao (20x40)	Metros cúbicos	22	7,35	10,2	17,55	79,77
8	Guarda obra con alisada mecanica	Metros cuadrados	231	77	73	150,00	64,94
9	Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	1.752	570	530	1.100,00	62,79
10	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	86	86		86,00	100,00
11	Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor	Metros cuadrados	3.504			-	0,00
12	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 ¨x 3/16	Metros cuadrados	1.674	540	260	800,00	47,79
13	Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	Mililitros	180			-	0,00
14	Bajada de caño PVC	Mililitros	285			-	0,00
15	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de inodoro)	Unidad	6			-	0,00
16	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de lavatorio)	Unidad	6			-	0,00
17	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de griferia)	Unidad	6			-	0,00
18	Provision de espejos para pared	Metros cuadrados	7			-	0,00
19	Instalaciones sanitarias: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)	Unidad	3			-	0,00
20	Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m	Metros cuadrados	21			-	0,00
21	Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica (0,80x2,10)	Metros cuadrados	10			-	0,00
22	Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	2			-	0,00
23	Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)	Metros cuadrados	29			-	0,00
24	Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)	Unidad	68			-	0,00
25	Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)	Mililitros	523			-	0,00
26	Recuadro aberturas (pilares)	Mililitros	1.142			-	0,00
27	Pintura: Provision y colocacion de enduido	Metros cuadrados	3.504			-	0,00
28	Provision de pintura externa e interna de paredes	Metros cuadrados	3.504			-	0,00
29	Red de alimentacion preensamblado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.	Unidad	3	3		3,00	100,00
30	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	3			-	0,00
31	Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.	Unidad	36			-	0,00
32	Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)(TIPO INDUSTRIAL)	Unidad Medida Global	3			-	0,00
33	Tablero de interruptor: Tablero principal	Unidad Medida Global	3			-	0,00
34	Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00	Unidad	3			-	0,00
35	Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa	Unidad	6			-	0,00
36	Conexión desague cloacal	Unidad	1			-	0,00
37	Desague Cloacal: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final	Unidad	1			-	0,00
38	Sistema de agua potable: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.	Unidad Medida Global	1			-	0,00
39	Construccion de portico para acceso principal	Unidad Medida Global	1			-	0,00
40	Provision y colocacion de revestimiento tipo ACM	Metros cuadrados	19			-	0,00
41	Cartel acrilico con soporte (Provision y colocacion de letras corporeas)	Unidad	32			-	0,00
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	3			-	0,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Delgado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID N°:423.566

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/08/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº1

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Replanteo y marcacion general de la obra	Metros cuadrados	1.620	3.750	6.075.000	1620		1620	100%	Unidad	6.075.000	0	6.075.000
2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	486	62.000	30.132.000	486		486	100%	Unidad	30.132.000	0	30.132.000
3	Hormigon (Zapata ciclopeo 1.30x1.30x0.65)	Metros cúbicos	46	1.180.000	54.280.000	46		46	100%	Unidad Medida Global	54.280.000	0	54.280.000
4	Pilotin de hormigon	Metros cúbicos	21	1.875.000	39.375.000	21		21	100%	Metros cuadrados	39.375.000	0	39.375.000
5	Hormigon. (Encadenado inferior central y superior (12x30)	Metros cúbicos	16	1.815.000	29.040.000	5,35	5,35	10,7	67%	Metros cuadrados	9.710.250	9.710.250	19.420.500
6	Piso de Ho Ao espesor 15cm incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (incluye rampa de acceso)	Metros cuadrados	1.620	330.000	534.600.000	540	320	860	53%	Metros cuadrados	178.200.000	105.600.000	283.800.000
7	Pilares Ho Ao (20x40)	Metros cúbicos	22	1.750.000	38.500.000	7,35	10,2	17,55	80%	Metros cuadrados	12.862.500	17.850.000	30.712.500
8	Guarda obra con alisada mecanica	Metros cuadrados	231	76.000	17.556.000	77	73	150	65%	Metros cúbicos	5.852.000	5.548.000	11.400.000
9	Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	1.752	82.000	143.664.000	570	530	1100	63%	Metros cúbicos	46.740.000	43.460.000	90.200.000
10	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	86	268.000	23.048.000	86		86	100%	Metros cúbicos	23.048.000	0	23.048.000
11	Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor	Metros cuadrados	3.504	33.000	115.632.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
12	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 ¨x 3/16	Metros cuadrados	1.674	380.000	636.120.000	540	260	800	48%	Metros cúbicos	205.200.000	98.800.000	304.000.000
13	Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	Millilitros	180	110.000	19.800.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
14	Bajada de caño PVC	Millilitros	285	35.000	9.975.000			0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
15	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de inodoro)	Unidad	6	820.000	4.920.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
16	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de lavatorio)	Unidad	6	480.000	2.880.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
17	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de griferia)	Unidad	6	400.000	2.400.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
18	Provision de espejos para pared	Metros cuadrados	7	275.000	1.925.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
19	Instalaciones sanitarias: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)	Unidad	3	1.450.000	4.350.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
20	Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m	Metros cuadrados	21	83.500	1.753.500			0	0%	Metro lineal	0	0	0
21	Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica (0,80x2,10)	Metros cuadrados	10	825.000	8.250.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
22	Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	2	775.000	1.550.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
23	Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)	Metros cuadrados	29	915.000	26.535.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
24	Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)	Unidad	68	340.000	23.120.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
25	Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)	Millilitros	523	14.500	7.583.500			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
26	Recuadro aberturas (pilares)	Millilitros	1.142	14.500	16.559.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
27	Pintura: Provision y colocacion de enduido	Metros cuadrados	3.504	16.500	57.816.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
28	Provision de pintura externa e interna de paredes	Metros cuadrados	3.504	21.000	73.584.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
29	Red de alimentacion preensamblado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.	Unidad	3	6.780.000	20.340.000	3		3	100%	Metros cuadrados	20.340.000	0	20.340.000
30	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	3	9.000.000	27.000.000			0	0%	Unidad	0	0	0
31	Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.	Unidad	36	1.050.000	37.800.000			0	0%	Unidad	0	0	0
32	Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)(TIPO INDUSTRIAL)	Unidad Medida Global	3	16.750.000	50.250.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
33	Tablero de interruptor: Tablero principal	Unidad Medida Global	3	6.000.000	18.000.000			0	0%	Metros cuadrados	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Ángel Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000101

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 18/07/2023

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/2023

FECHA CONTRATO: 14/06/2023 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Canindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Avances en trabajos de herrería, elevación de mampostería.

21/07/23 - Se procede al cargamento de encadenado, columnas y siguen los trabajos de mampostería.

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000102

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 24/07/23

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: 14/06/23 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Carindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Preparativos para el cargamento de piso de HºAº, acopio de materiales.

26/07/23 - Cargamento de piso de HºAº

27/07/23 - Alisada mecánica del piso

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000103

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 31/07/23

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: 14/06/23 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caaguazú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Preparativos para el montaje de estructuras metálicas

03/08/23 Acopio de materiales para el cargamento de guardia obra

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000104

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 06/08/23

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: 14/06/23 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Canindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Continuan los trabajos de herreria y manposteria

08/08/23 - Lluvia

09/08/23 - Tiempo inestable, trabajos minimos

10/08/23 - Tiempo bueno, se retoman los trabajos

11/08/23 - Tiempo inestable

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Begado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000105

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 14/08/23

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: 14/06/23 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Carindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Preparativos para la carga de encadenados

15/08/23 - Trabajos en elevación de mampostería

18/08/23 - Lluvia

19/08/23 - Sin actividad por Lluvia

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000106

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 21/08/23

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: 14/06/23 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninderyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Avances en elevación de mampostería y construcción de estructura metálicas.

25/08/23 - Lluvia

26/08/23 - Sin actividad por lluvia

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Begado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000107

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 27/08/23

LICITACIÓN Nº: _____ FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: 14/06/23 MONTO: _____

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Curindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Preparativos para el montaje de estructuras metálicas

29/08/23 - Montaje de estructuras metálicas

OBSERVACIÓN: _____

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

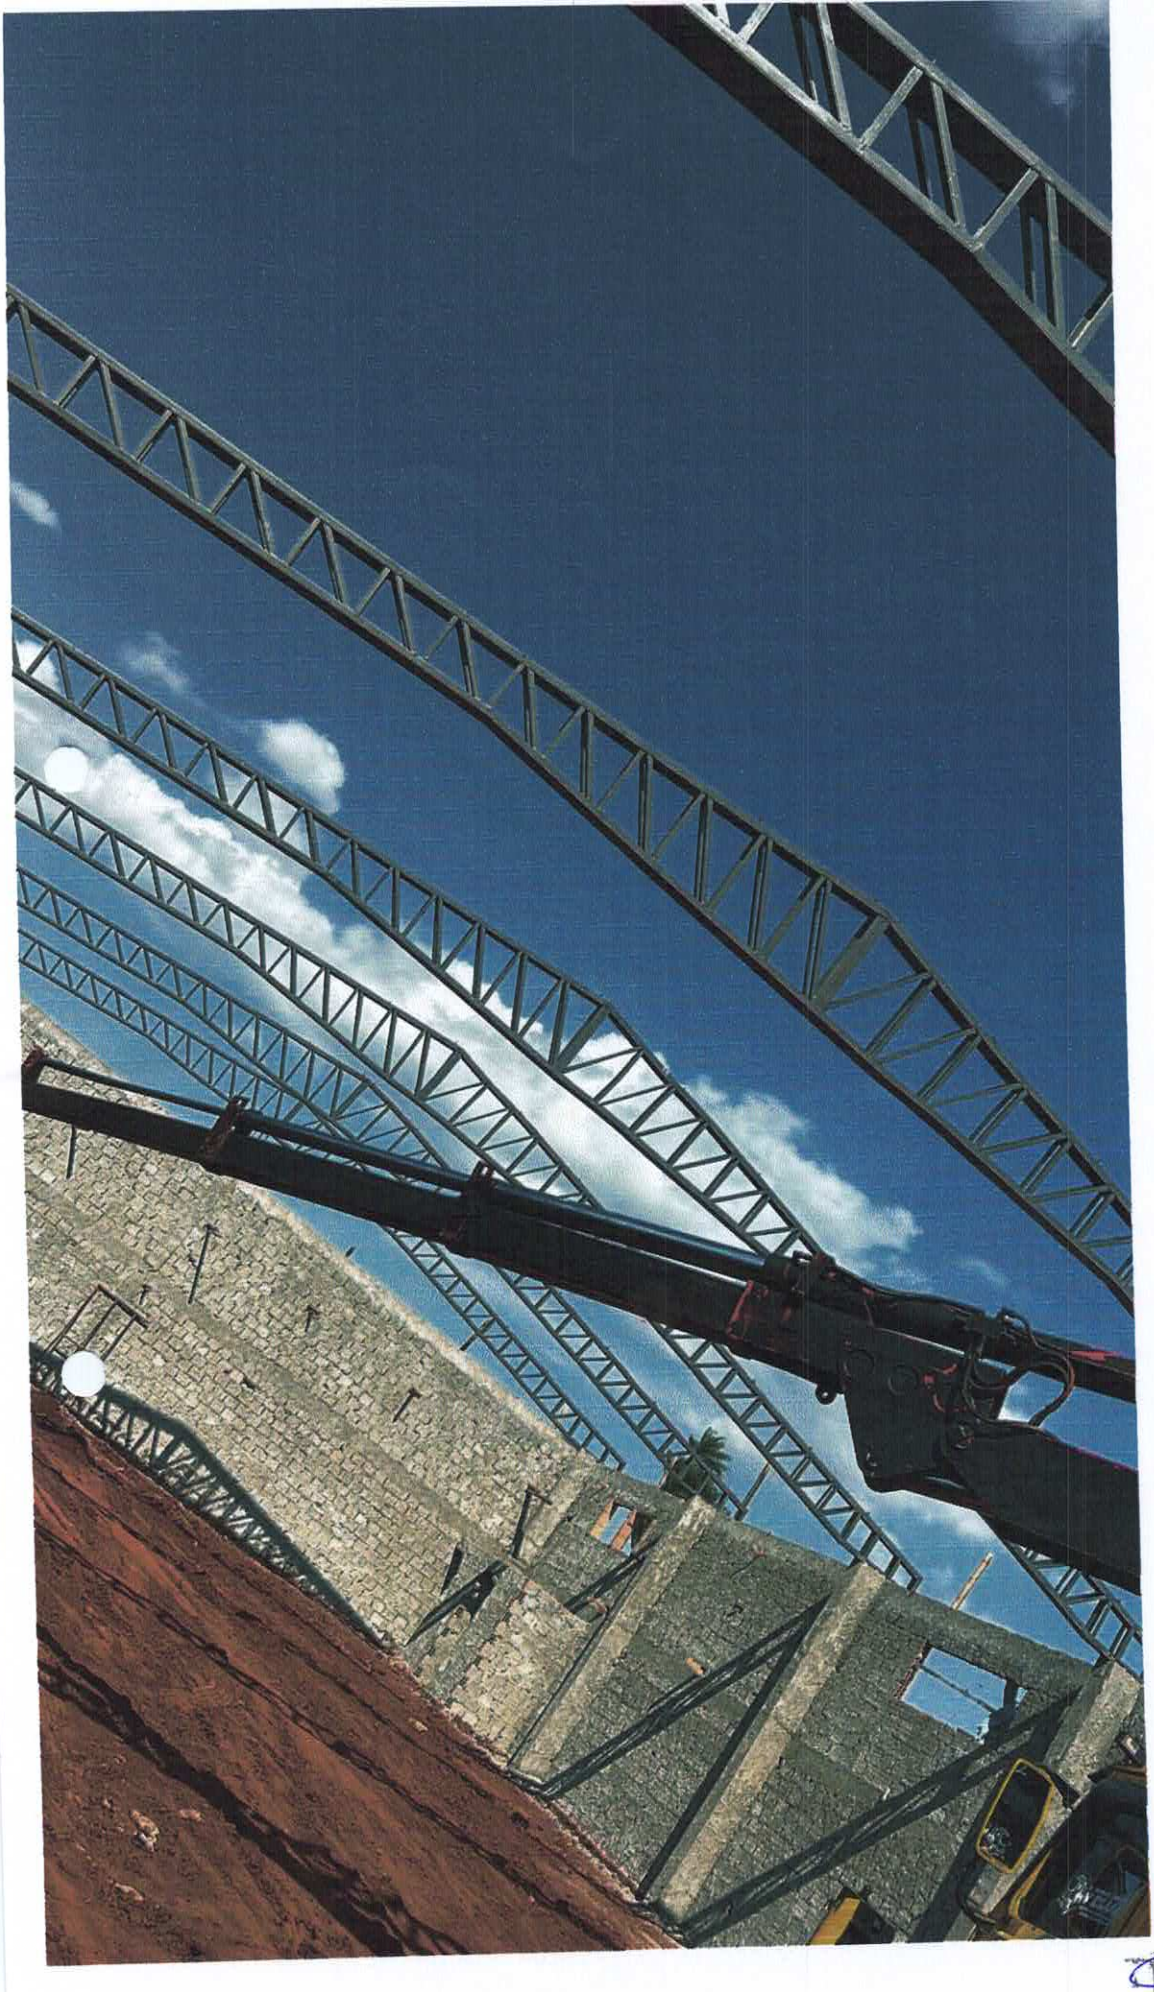

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA
