COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 13 de DICIEMBRE 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 01

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 01** del **Contrato 103/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS (450.275.300).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	450.275.300
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	22.513.765
RETENCION IVA 30%	12.280.235
TOTAL NETO	**415.481.300**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A
CONSTRUCTORA
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3523
FECHA 13-12-23 HORA 14:58
CANT HOJAS (5)
NUMERO DE CEL:
Mónica G
FIRMA

Saltos del Guairá, 18 de diciembre de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM7´´** con ID: N.º 436.017 Contrato N.º 103/2023, adjudicada a **COPCI SA.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Zelgado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIR
José Román
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM7

UBICACIÓN: BARRIO PORTAL SALTOS KM7

ID NRO: 436.017

CONTRATO NRO: 103/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 18 DE DICIEMBRE DE 2.023

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7
ZONA: KM 7
ID Nº:436.017

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/12/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº1

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	720	22.272	16.035.840		0	0	0%	Unidad	0	0	0
2	Desmonte y retirada de cordones existentes	Metros cuadrados	240	7.270	1.744.800		0	0	0%	Unidad	0	0	0
3	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	7.000	5.700	39.900.000		7000	7000	100%	Unidad Medida Global	0	39.900.000	39.900.000
4	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	7.000	5.900	41.300.000		7000	7000	100%	Metros cuadrados	0	41.300.000	41.300.000
5	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.400	38.000	53.200.000		560	560	40%	Metros cuadrados	0	21.280.000	21.280.000
6	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	70	1.845.670	129.196.900		20	20	29%	Metros cuadrados	0	36.913.400	36.913.400
7	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	45	2.117.300	95.278.500		23	23	51%	Metros cuadrados	0	48.697.900	48.697.900
8	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.300	54.480	343.224.000		3200	3200	51%	Metros cúbicos	0	174.336.000	174.336.000
9	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	6.300	5.890	37.107.000		3200	3200	51%	Metros cúbicos	0	18.848.000	18.848.000
10	Compactación mecanica	Metros cuadrados	6.300	4.100	25.830.000		0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
11	Construccion de sub base (Coclchon de arena)	Metros cuadrados	6.300	21.000	132.300.000		3200	3200	51%	Metros cúbicos	0	67.200.000	67.200.000
12	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1	1.500.000	1.500.000		0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
13	Cartel de obras	Unidad	1	1.800.000	1.800.000		1	1	100%	Metros cuadrados	0	1.800.000	1.800.000
	TOTAL				**918.417.040**				**49,03%**		**0**	**450.275.300**	**450.275.300**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	450.275.300
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	22.513.765
* Total certificado del mes	Gs.	427.761.535
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	427.761.535

COPCI S.A. CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _13_/12_/_2023_

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Begado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 1

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7
ZONA KM 7
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 13/12/2023
ID N°: 436.017

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	720			-	0,00
2	Desmonte y retirada de cordones existentes	Metros cuadrados	240			-	0,00
3	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	7.000		7000	7.000,00	100,00
4	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	7.000		7000	7.000,00	100,00
5	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.400		560	560,00	40,00
6	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	70		20	20,00	28,57
7	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	45		23	23,00	51,11
8	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.300		3200	3.200,00	50,79
9	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	6.300		3200	3.200,00	50,79
10	Compactación mecanica	Metros cuadrados	6.300			-	0,00
11	Construccion de sub base (Coclchon de arena)	Metros cuadrados	6.300		3200	3.200,00	50,79
12	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1			-	0,00
13	Cartel de obras	Unidad	1		1	1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1

ID N°: 436.017

DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	918.417.040	0,00%	49,03%	49,03%	0	450.275.300	450.275.300
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	45.920.852	0,00%	2,45%	2,45%	0	22.513.765	22.513.765
B	TOTAL DEDUCCIONES	45.920.852	0,00%	2,45%	2,45%	0	22.513.765	22.513.765
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	872.496.188	0,00%	46,58%	46,58%	0	427.761.535	427.761.535

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

COPCI S.A
CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización
DIRECTOR DE OBRAS
DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000172

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Bº Portal Saltos Km7

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 29/11/23

LICITACIÓN Nº: 18/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km 7

AVANCES DE OBRA

Marcación y Replanteo de calles para apertura de caja, trabajos de maquinas en limpieza y apertura de caja, acopio de materiales

01/12/23 Colocación de cordon y carga de cuneta de HºAº

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Pegado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000173

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Bº Portal Saltos Km7

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 04/12/23

LICITACIÓN Nº: 18/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km7

AVANCES DE OBRA

Cargamento de Baden de HºAº, colocación de cordon, carga de cuneta y extensión de colchon de arena para alicito de piedra

05/12/23 Colocación de pavimento petreo, cordón y carga de cuneta

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Rugelio Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000174

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Bº Portal Saltos km7

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 06/12/23

LICITACIÓN Nº: 18/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos km7

AVANCES DE OBRA

Colocación de cordon, carga de cometa de Nº4, avances de pavimento de piedra y carga de Baden de Nº4

08/12/23 Sin Actividad por Feriado Nacional

09/12/23 Acopio de materiales, trabajos normales.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Víctor Delgado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000175

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Bº Portal Saltos Km7

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 11/12/23

LICITACIÓN Nº: 18/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km7

AVANCES DE OBRA

Carga de Badén, extensión de cordon, carga de cuneta y avances en colocación de pavimento petreo

12/12/23 Avances normales, compactado manual de pavimento petreo colocado.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Segado Fiscal de Obras

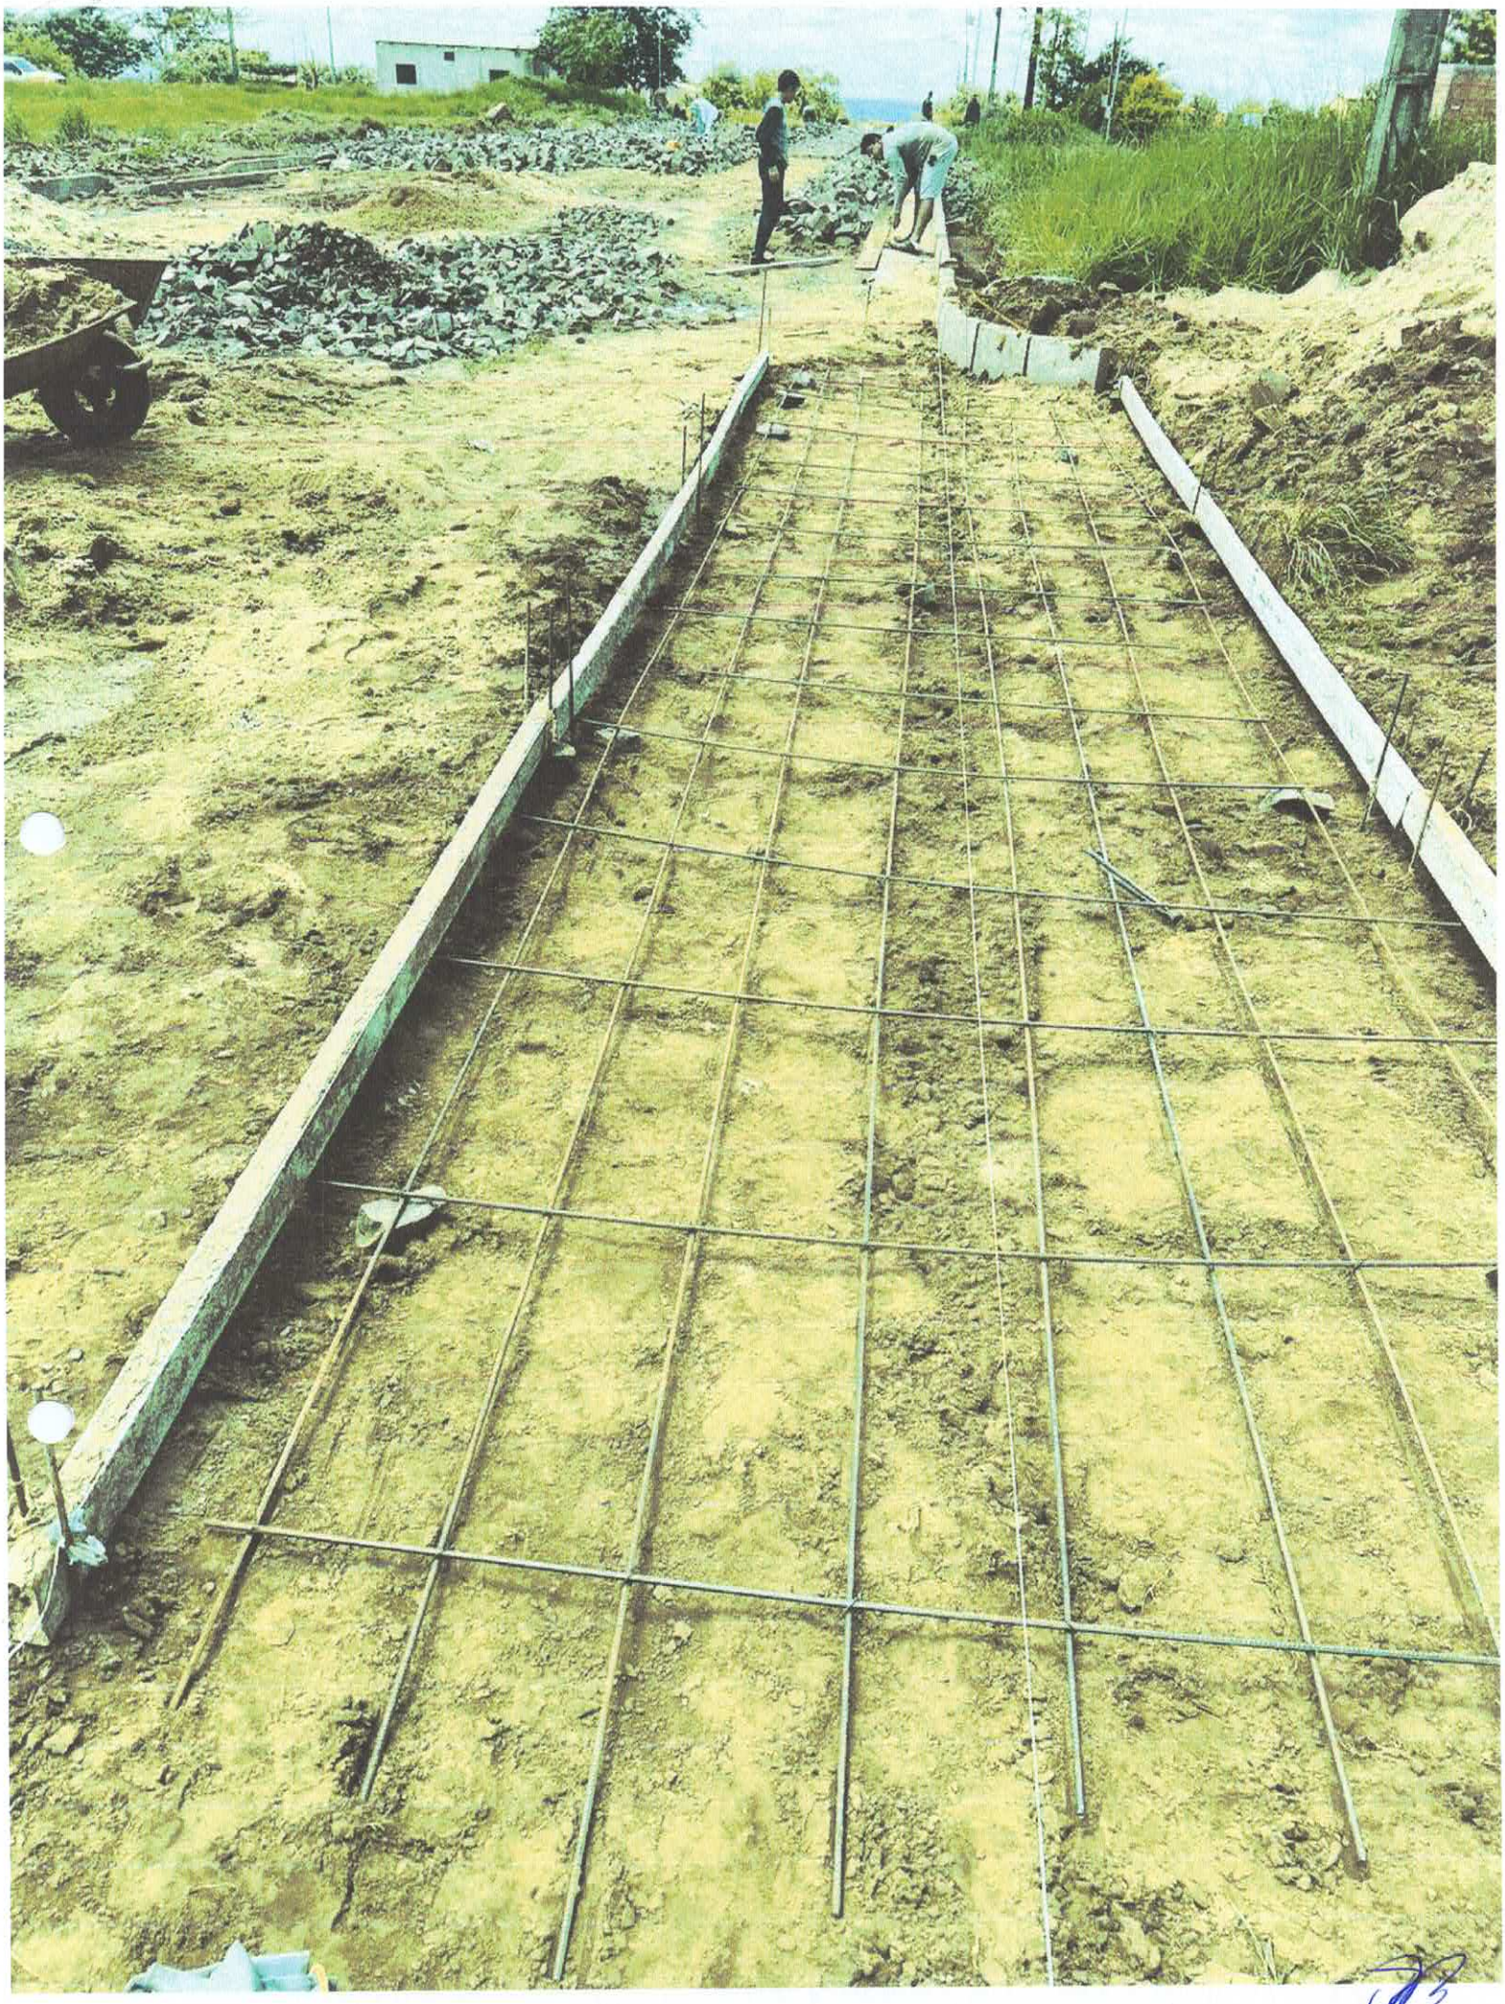

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI
Portal

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
