GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA

RESUMEN DEL CERTIFICADO BASICO Nº: 1 -

MES: FEBRERO 2020

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual con ID: 372.082

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		IMPORTES CERTIFICADOS					
				Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1) Monto Gs.	%	(2) Monto Gs.	%	(3) Monto Gs.	%	(2) + (3) Monto Gs.
A	Certificaciones por Obra Ejecutada								
A1	**Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual**	100	1.524.475.960	0%	0	1.66%	25.261.076	1.66%	25.261.076
	Total	100	1.524.475.960	**0%**	0	**1,66%**	**25.261.076**	**1,66%**	**25.261.076**

Certificado Basico N°1
MES: FEBRERO 2020
Contrato N°: 69/2019
Monto Básico: 1.524.475.960

Contratista: Constructora Victoria S.R.L

Fecha de Inicio:	23/1/2020
Plazo de Ejecución:(Días)	300
Fecha de Terminación:	18/11/2020

B	Deducciones Totales por Contrato			Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B1	Devolucion de Anticipo	20%	304.895.192	0	7.578.323	7.578.323
	Total deducciones		304.895.192	0	**7.578.323**	**7.578.323**

Gobernación de Itapua
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada

C1	Importe liquido a pagar según presente certificado (A - B)	17.682.753
C2	Multas	0
C	**Importe Neto a pagar según presente certificado (C1 - C2)**	**17.682.753**

Son Guaraníes: Diecisiete millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y tres.----------

Ing. José Luis González
Secretario Departamental de Obras Públicas
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNACION DE ITAPUA
Secretario Departamental

Ing. José Luis González
Secretario Departamental de Obras Públicas
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNACIÓN DE ITAPUA
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0
CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
Contratista
Representante Legal

2 (dos)

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CERTIF. BASICO N°	1
	PLANILLA I	
Monto Básico: 1.524.475.960	Plazo de Ejecución: (Días)	300
PLANILLA DE MEDICION PORCENTUAL	MES:	FEBRERO
Contrato N° 69/2019	Contratista: CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L	

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE (%)			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL
1	**Preparacion de obra - trabajos Preliminares**									
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	m2	2.590,00	0,0066	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,0066	0,0066
1.2	Cartel	gl.	1,00	0,0008	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,0008	0,0008
1.3	Obrador de obra	gl.	1,00	0,0084	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,0084	0,0084
2	**Preparacion de obra - Movimiento de suelos**									
2.1	Excavación para zapata y encadenados	m3	274,80	0,0074	0,00%	10,00%	10,00%	-	0,0007	0,0007
2.2	Relleno y Compactacion	m3	1.280,00	0,0411	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
3	**Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado**									
3.1	Zapatas	m3	165,00	0,1732	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
3.2	Encadenado inferior 20 x 50	m3	43,28	0,0454	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
3.3	Viga superior 15x60	m3	46,25	0,0485	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
3.4	Encadenado superior 20x60	m3	19,75	0,0207	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70	m3	47,50	0,0499	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4	**Aislacion horizontal pared 0.15m**	ml	425,00	0,0081	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
5	**Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores**	m2	36,00	0,0030	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
6	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**									
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos	m2	2.530,00	0,3913	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro	un.	12,00	0,0035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
7	**Colocacion de pisos - contrapisos**									
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero	m2	1.196,00	0,0960	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm	m2	2.046,00	0,0417	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm	m2	850,00	0,0162	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
8	**Servicio de pintura**									
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica	m2	680	0,0113	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
8.2	Pintura para piso sector cancha	m2	1.222,00	0,0249	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9	**Limpieza de obra**	gl.	1,00	0,0019	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
	TOTAL GENERAL			1,0000				-	0,0166	0,0166

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
Contratista
Representante Legal
CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Jose Luis González
Secretario Departamental de Obras Públicas
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

4 (cuatro)

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CERTIF. BASICO N°	1
	PLANILLA 1	
Monto Básico: 1.524.475.960	Plazo de Ejecución: (Dias)	300
PLANILLA DE CERTIFICADO	MES:	FEBRERO
Contrato N° 69/2019	Contratista: CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L	

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTA		OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
				P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL
1	**Preparacion de obra - trabajos Preliminares**										
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	m2	2.590,00	3.900	10.101.000	0,00	2590,00	2590,00	-	10.101.000	10.101.000
1.2	Cartel	gl.	1,00	1.274.900	1.274.900	0,00	1,00	1,00	-	1.274.900	1.274.900
1.3	Obrador de obra	gl.	1,00	12.753.000	12.753.000	0,00	1,00	1,00	-	12.753.000	12.753.000
2	**Preparacion de obra - Movimiento de suelos**										
2.1	Excavación para zapata y encadenados	m3	274,80	41.200	11.321.760	0,00	27,48	27,48	-	1.132.176	1.132.176
2.2	Relleno y Compactación	m3	1.280,00	49.000	62.720.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3	**Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado**										
3.1	Zapatas	m3	165,00	1.600.000	264.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.2	Encadenado inferior 20 x 50	m3	43,28	1.600.000	69.248.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.3	Viga superior 15x60	m3	46,25	1.600.000	74.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.4	Encadenado superior 20x60	m3	19,75	1.600.000	31.600.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70	m3	47,50	1.600.000	76.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
4	**Aislacion horizontal pared 0.15m**	ml	425,00	29.100	12.367.500	0,00	0,00	0,00	-	-	0
5	**Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores**	m2	36,00	126.150	4.541.400	0,00	0,00	0,00	-	-	0
6	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**										
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos	m2	2.530,00	235.800	596.574.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro	un.	12,00	446.300	5.355.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0
7	**Colocacion de pisos - contrapisos**										
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero	m2	1.196,00	122.350	146.330.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm	m2	2.046,00	31.050	63.528.300	0,00	0,00	0,00	-	-	0
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm	m2	850,00	29.100	24.735.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
8	**Servicio de pintura**										
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica	m2	680	25.250	17.170.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
8.2	Pintura para piso sector cancha	m2	1.222,00	31.050	37.943.100	0,00	0,00	0,00	-	-	0
9	**Limpieza de obra**	gl.	1,00	2.911.800	2.911.800	0,00	0,00	0,00	-	-	0
	TOTAL GENERAL				**1.524.475.960**				-	**25.261.076**	**25.261.076**

Ing. Jose Luis Gonzalez
Secretario Departamental
de Obras Públicas
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
Contratista
Representante Legal

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

5 (cinco)

6 (seis)

Contrato N°: 69/19

Certificado Basico N°1

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual con ID: 372.082

Monto del Contrato:	1.524.475.960 Gs.	Term. Prevista:	18/11/2020
Plazo Contractual:	300 Días Calendario	Ampliaciones:	
Inicio de Obra:	23/1/2020	Mes:	MARZO

CUADRO DE AVANCE

Contrato N°: 69/19

MES	PREVISTO Gs		EJECUTADO Gs		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
INICIO								
Febrero	6.269.283	6.269.283	25.261.076	25.261.076	0,41%	0,41%	1,66%	1,66%
Marzo	22.026.653	28.295.937	0	0	1,44%	1,86%	0,00%	0,00%
Abril	90.238.892	118.534.829	0	0	5,92%	7,78%	0,00%	0,00%
Mayo	168.366.395	286.901.224	0	0	11,04%	18,82%	0,00%	0,00%
Junio	185.656.262	472.557.486	0	0	12,18%	31,00%	0,00%	0,00%
Julio	282.635.326	755.192.812	0	0	18,54%	49,54%	0,00%	0,00%
Agosto	297.691.319	1.052.884.131	0	0	19,53%	69,07%	0,00%	0,00%
Septiembre	368.952.898	1.421.837.029	0	0	24,20%	93,27%	0,00%	0,00%
Octubre	75.977.561	1.497.814.590	0	0	4,98%	98,25%	0,00%	0,00%
Noviembre	26.661.370	1.524.475.960	0	0	1,75%	100,00%	0,00%	0,00%

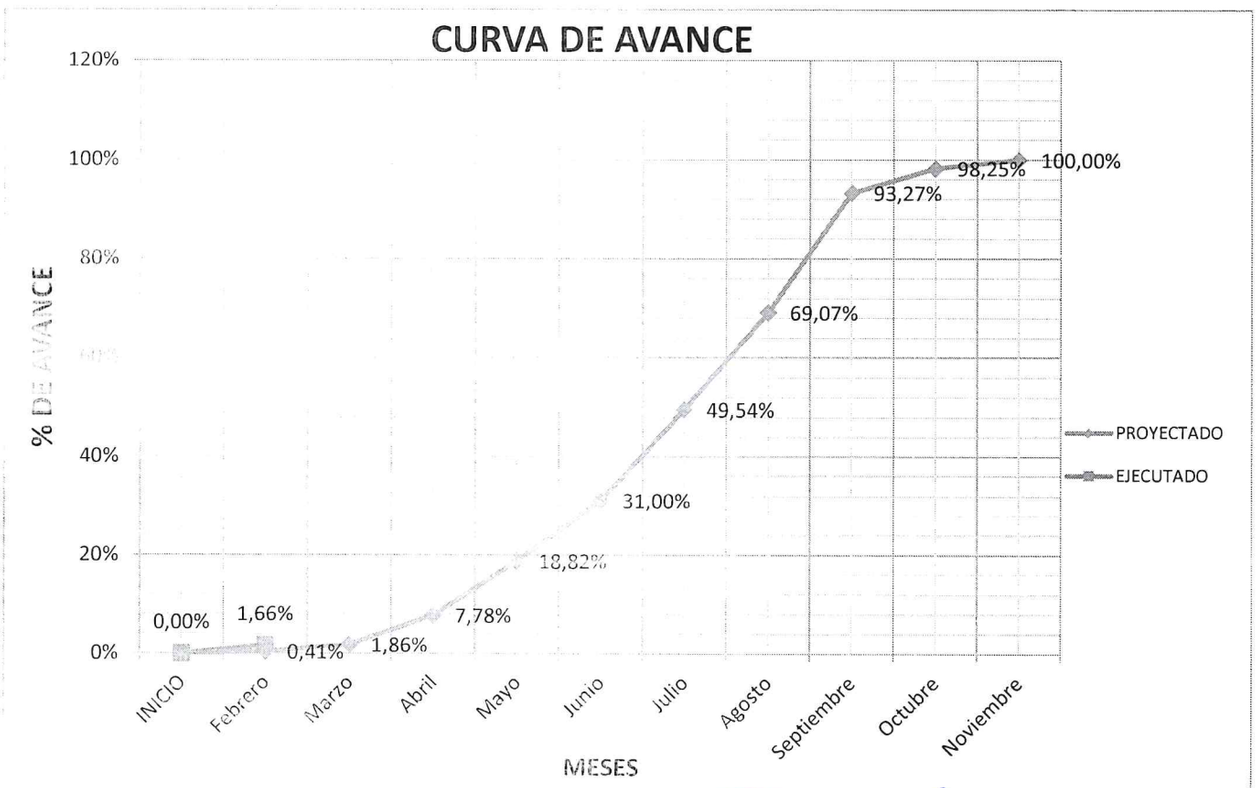

Contratista
Ing. José Maria Caballero
Representante Legal

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Jose Luis Gonzalez
Secretario Departamental de Obras Públicas
GOBERNACIÓN DE ITAPUÁ

Gobernacion de Itapua
Fiscalización
Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual con ID: 372082

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

CRONOGRAMA FINANCIERO

Items	Descripción del Bien	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Preparacion de obra - trabajos Preliminares	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	₲ 4.994.383	₲ 5.106.617	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
1.2	Cartel	₲ 1.274.900	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
1.3	Obrador de obra		₲ 12.753.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
2	Preparacion de obra - Movimiento de suelos		₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
2.1	Excavacion para zapatas y encadenados		₲ 4.167.037	₲ 5.881.025	₲ 1.273.698	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
2.2	Relleno y Compactación					₲ 7.123.753	₲ 29.037.037	₲ 26.559.210	₲ -	₲ -	₲ -
3	Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado			₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.1	Zapatas			₲ 68.200.000	₲ 95.822.222	₲ 78.466.667	₲ 21.511.111	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.2	Encadenado inferior 20 x 50			₲ 16.157.867	₲ 33.512.612	₲ 19.577.521	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.3	Viga superior 15x60				₲ 11.967.901	₲ 29.325.926	₲ 32.706.173	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.4	Encadenado superior 20x60				₲ 5.110.617	₲ 12.522.963	₲ 13.966.420	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70				₲ 12.291.358	₲ 30.118.519	₲ 33.590.123	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
4	Aislacion horizontal pared 0.15m				₲ 7.592.271	₲ 4.775.229	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
5	Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores				₲ 795.715	₲ 3.745.685	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado						₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos						₲ 149.143.500	₲ 190.903.680	₲ 256.526.820	₲ -	₲ -
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro						₲ 281.004	₲ 5.074.596	₲ -	₲ -	₲ -
7	Colocacion de pisos - contrapisos						₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero								₲ 84.546.569	₲ 61.784.031	₲ -
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm						₲ 2.399.958	₲ 57.740.166	₲ 3.388.176	₲ -	₲ -
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm							₲ 13.521.800	₲ 11.213.200	₲ -	₲ -
8	Servicio de pintura							₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica							₲ 3.891.867	₲ 13.278.133	₲ -	₲ -
8.2	Pintura para piso sector cancha									₲ 14.193.530	₲ 23.749.570
9	Limpieza de obra										₲ 2.911.800
	MONTO MENSUAL	**₲ 6.269.283**	**₲ 22.026.653**	**₲ 90.238.892**	**₲ 168.366.395**	**₲ 185.656.262**	**₲ 282.635.326**	**₲ 297.691.319**	**₲ 368.952.898**	**₲ 75.977.561**	**₲ 26.661.370**
	MONTO ACUMULADO	**₲ 6.269.283**	**₲ 28.295.937**	**₲ 118.534.829**	**₲ 286.901.224**	**₲ 472.557.486**	**₲ 755.192.812**	**₲ 1.052.884.131**	**₲ 1.421.837.029**	**₲ 1.497.814.590**	**₲ 1.524.475.960**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Jose Luis González
Secretario Departamental
de Obras Públicas
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

(siete) 7

CRONOGRAMA FISICO

Items	Descripción del Bien	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Preparacion de obra - trabajos Preliminares										
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	49,44%	50,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Cartel	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	Obrador de obra	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Preparacion de obra - Movimiento de suelos										
2.1	Excavacion para zapatas y encadenados	0,00%	36,81%	51,94%	11,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	Relleno y Compactación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,36%	46,30%	42,35%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado										
3.1	Zapatas	0,00%	0,00%	25,83%	36,30%	29,72%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	Encadenado inferior 20 x 50	0,00%	0,00%	23,33%	48,40%	28,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Viga superior 15x60	0,00%	0,00%	0,00%	16,17%	39,63%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.4	Encadenado superior 20x60	0,00%	0,00%	0,00%	16,17%	39,63%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70	0,00%	0,00%	0,00%	16,17%	39,63%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Aislacion horizontal pared 0.15m	0,00%	0,00%	0,00%	61,39%	38,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores	0,00%	0,00%	0,00%	17,52%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado										
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	32,00%	43,00%	0,00%	0,00%
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,25%	94,75%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Colocacion de pisos - contrapisos										
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,78%	42,22%	0,00%
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	90,89%	5,33%	0,00%	0,00%
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,67%	45,33%	0,00%	0,00%
8	Servicio de pintura										
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,67%	77,33%	0,00%	0,00%
8.2	Pintura para piso sector cancha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,41%	62,59%
9	Limpieza de obra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MONTO MENSUAL	**0,41%**	**1,44%**	**5,92%**	**11,04%**	**12,18%**	**18,54%**	**19,53%**	**24,20%**	**4,98%**	**1,75%**
	MONTO ACUMULADO	**0,41%**	**1,86%**	**7,78%**	**18,82%**	**31,00%**	**49,54%**	**69,07%**	**93,27%**	**98,25%**	**100,00%**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transportes

Ing. Jose Luis Gonzalez
Secretario Departamental
de Obras Públicas
GOBERNACION DE ITAPUA

CONSTRUCTORA
VICTORIA
S.R.L.
Ruc: 80045040-0

8 (ocho)
