GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: ENERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL con ID: 436870

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870	100,00%	166.703.410	0,00%	0	27,24%	45.409.966	27,24%	45.409.966
A	Total por Contrato	100,00%	166.703.410	0,00%	0	27,24%	45.409.966	27,24%	45.409.966
B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	33.340.682	0		9.081.993		9.081.993	
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0		0		0	
B	Total Deducciones		33.340.682	0		9.081.993		9.081.993	
C.I	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)					36.327.973			
C.II	Multas					0			
C	Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)					36.327.973			

Certificado Básico Nº	**01**
Mes: ENERO	
Contrato N°:	35/23
Monto Básico:	₵ 166.703.410
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 días
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: treinta y seis millones trescientos veinte y siete mil novecientos setenta y tres.

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL con ID: 436870

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 166.703.410	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	35/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.565	31.550	80.925.750	0,485	0	20	20	0	0,097	0,097	0	513	513	-	16.185.150	16.185.150
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 140 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	770	74.125	57.076.250	0,342	0	50	50	0	0,171	0,171	0	385	385	-	28.538.125	28.538.125
3	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0, 18)	Metros cubicos	15,12	1.563.087	23.633.875	0,142	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	0,36	719.135	258.889	0,002	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
5	Señalización de obra	Unidad Medida Gl	3	228.897	686.691	0,004	0	100	100	0	0,004	0,004	0	3	3	-	686.691	686.691
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.565	1.607	4.121.955	0,025	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
					166.703.410	100%				0%	27,24%	27,24%				0	45.409.966	45.409.966

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

4

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

Mes: ENERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870

Contrato N°:	35/23		
Monto del Contrato:	₲ 166.703.410	**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO								
Contrato N°: 32/23								
MES	**PREVISTO GS.**		**EJECUTADO GS.**		**PREVISTO %**		**EJECUTADO %**	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	45.409.966	45.409.966	45.409.966	45.409.966	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%
febrero	116.912.600	162.322.566			70,13%	97,37%		
marzo	4.380.844	166.703.410			2,63%	100,00%		

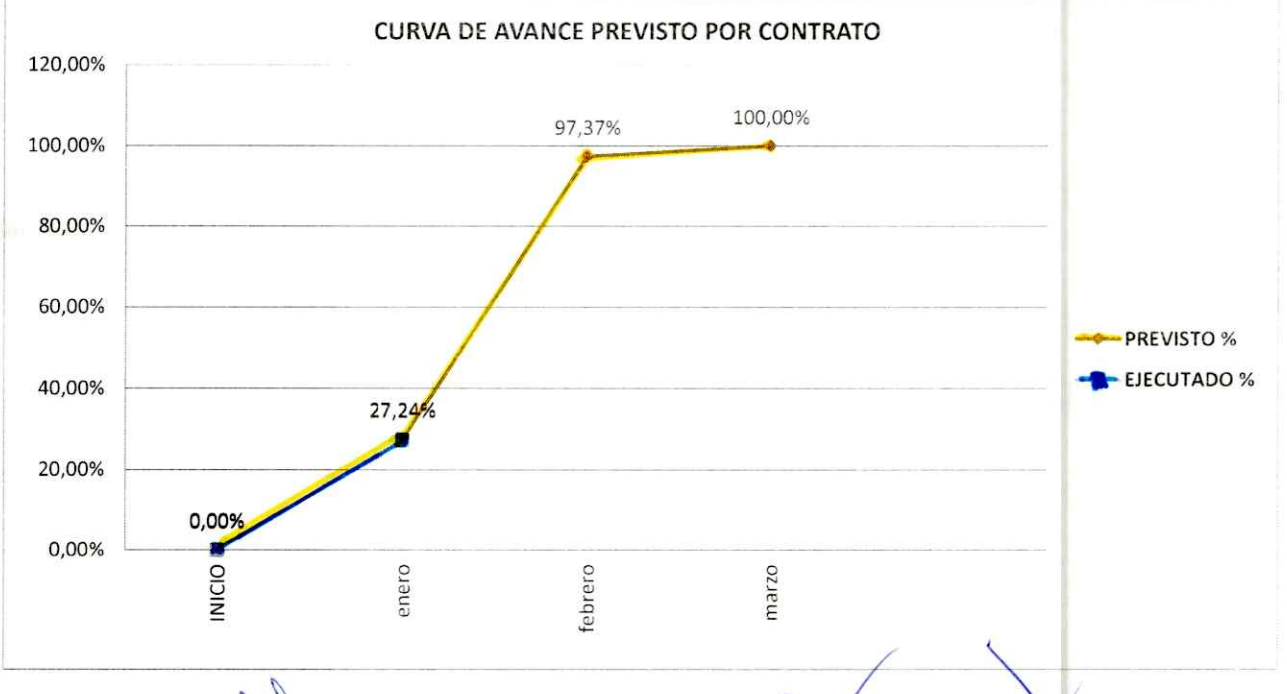

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Mes: ENERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	15-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 166.703.410	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	35/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.565	31.550	80.925.750	16.185.150	64.740.600		100%
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	770	74.125	57.076.250	28.538.125	28.538.125		100%
3	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	1.563.087	23.633.875	-	23.633.875		100%
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	0,36	719.135	258.889			258.889	100%
5	Señalización de obra	Unidad Medida Glo	3	228.897	686.691	686.691			100%
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.565	1.607	4.121.955			4.121.955	100%
					166.703.410				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	45.409.966	116.912.600	4.380.844	166.703.410
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	27,24%	70,13%	2,63%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Ing. Fernando Arecchi
Fiscal de Obras
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME DE CERTIFICADO Nº01 – MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

SOLICITANTE: Barrio Santo Domingo
OBRA: Construcción de 385,00 m de pavimento pétreo tipo empedrado camino vecinal en el Barrio Santo Domingo.

UBICACIÓN: Barrio Santo Domingo	**DISTRITO:** Encarnación	**COORDENADAS UTM:** 603895 - 6985277	**MONTO DE LA OBRA:** 166.703.410 gs.
EMPRESA CONTRATISTA: Impacto constructora – Noelia Ledezma	**Nº DE TELÉFONO:** 0985-171-856 – Noelia Ledezma	**Nº CONTRATO / ID:** 35/2023 / 436.870	**FECHA DE INICIO:** 18/12/23
MODALIDAD / LOTE: LCD Nº 19/2023 / Lote: único	**PLAZO CONTRACTUAL:** 90 DÍAS CALENDARIO	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 17/03/24	**PRÓRROGA:** - **TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:** -

FECHA DE VISITA: 25 de enero 2024
AVANCE DE OBRA: 27,24%

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra con buen avance, dentro del plazo de ejecución cumpliendo con el avance previsto.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
