TECNOSOL S.A. & Paulitec — CONSÓRCIO BINACIONAL PYRÃ — CIDADE

Id	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
0	Diagrama de Gantt - Puente Sobre el Rio Paraguay	1080 días	
1	Ordem de Início (O.I.)	0 días	
2	Obras Generales	45 días	
3	Movilización Inicial de Recursos	45 días	1
4	Instalación del Sitio de Obras y Alojamiento	45 días	1
5	Accesos Viales - 3+780 a 4+388	1010 días	
6	Movimiento de Suelos	106 días	3,4
7	Paquete Estructural	70 días	6;171
8	Obras de Arte	101 días	7FI
9	Obras Complementares	81 días	7FI-50 días
10	Instalaciones y Servicios Especiales	75 días	3,4
11	Viaductos de Acceso - Lado Paraguay	834 días	
12	Trabajos Preliminares	42 días	
15	Subestructura	760 días	
16	Pilotaje	120 días	
28	Cabezales / Estribos	133 días	
40	Pilas	196 días	
52	Superestructura	317 días	
56	Varios	534 días	
61	Otros	13 días	
63	Viaductos de Acceso - Lado Brasil	932 días	
64	Trabajos Preliminares	50 días	
67	Subestructura	840 días	
68	Pilotaje	120 días	
80	Cabezales / Estribos	134 días	
92	Pilas	196 días	
104	Superestructura	217 días	
108	Varios	354 días	
113	Otros	15 días	
115	Puente Atirantado - Lado Paraguay	203 días	
116	Pilas de Referencia	79 días	
117	Pilotaje	24 días	
121	Cabezales	30 días	
125	Pilas	48 días	
129	Torres de Atirantamiento	139 días	
130	Pilotaje	24 días	120
131	Cabezales	34 días	130
132	Alzado Torres de Atirantamiento	102 días	131FI-6 días
133	Protección de Torres de Atirantamiento Frente a Impactos de Embarcaciones	25 días	132
134	Puente Atirantado - Lado Brasil	196 días	
135	Pilas de Referencia	68 días	
136	Pilotaje	24 días	
140	Cabezales	30 días	
144	Pilas	48 días	
148	Torres de Atirantamiento	174 días	
149	Pilotaje	24 días	139
150	Cabezales	34 días	149
151	Alzado Torres de Atirantamiento	95 días	150FI-6 días
152	Protección de Torres de Atirantamiento Frente a Impactos de Embarcaciones	25 días	151
153	Puente Atirantado - Superestructuras	691 días	
154	Izado y Nivelación del Carros de Avance - Lado Paraguay	67 días	132
155	Izado y Nivelación del Carros de Avance - Lado Brasil	30 días	151
156	D1	28 días	154,155
157	D2	28 días	156
158	D3	28 días	157
159	D4	28 días	158
160	D5	28 días	159
161	D6	28 días	160
162	D7	28 días	161
163	D8	28 días	162
164	D9	28 días	163
165	D10	28 días	164

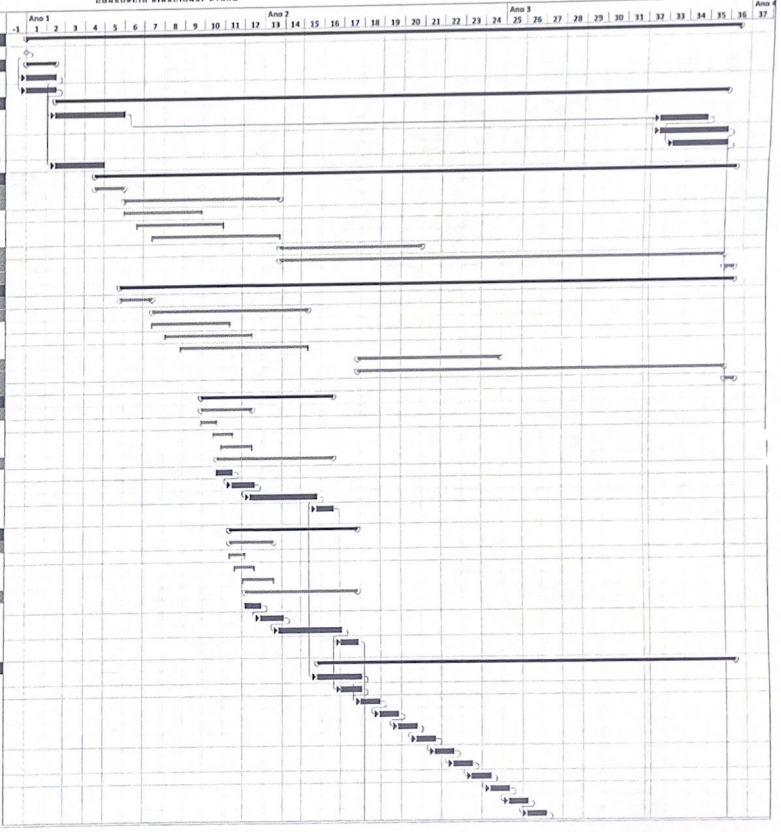

TECHCEDIL S.A. Paulitec CIDADE

CONSÓRCIO BINACIONAL PYBRA

Id	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
166	D11	28 días	165
167	D12	28 días	166
168	D13	28 días	167
169	D14	28 días	168
170	D15	28 días	169
171	D16	28 días	170
172	Varios	564 días	
178	Finalización de Obras	0 días	177;114;62;8;9;133;152



PUENTE BIOCEÁNICA

Consórcio PYBRA

CALENDARIO FÍSICO - FINANCIERO

TECNOEDIL S.A. | Paulitec | CIDADE

CONSÓRCIO BINACIONAL PYBRA

Nombre de la Tarea	Costo Total en Gs IVA Incluido	%	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ordem de Inicio [O.I.]			100%																	
Obras Generales	31.391.231.178	6,39%	61,00% 19.139.947.517	31,00% 12.251.283.661																
Instalaciones Y Servicios Especializados	10.273.306.240	1,67%	69,00% 7.087.893.308	31,00% 3.184.414.934																
Implementación Del Plan De Gestión Ambiental	10.870.000.000	1,76%	69,00% 7.500.300.000	31,00% 3.369.700.000																
Indemnizaciones	650.000.000	0,11%	69,00% 448.500.000	31,00% 201.500.000																
Movilizacion	17.553.969.567	2,85%	69,00% 12.112.239.003	31,00% 5.441.730.566																
Servicios Ambientales	44.955.371	0,01%	69,00% 31.019.206	31,00% 13.936.165																
Acceso Viales - 5+780 a 4+280	23.303.184.131	3,78%		10,27% 2.393.196.370	22,91% 5.894.816.648	32,91% 8.708.958.132	27,86% 6.305.213.013													
Movimiento de Suelos	18.366.812.043	2,98%		13,00% 2.387.685.566	29,00% 5.326.375.492	29,00% 5.326.375.492	29,00% 5.326.375.492													
Paquete Estructural	3.510.862.838	0,57%																		
Obras de Arte	343.384.464	0,06%																		
Obras Complementares	1.052.593.166	0,17%																		
Instalaciones y Servicios Especiales	29.131.600	0,00%		19,00% 5.535.004	41,00% 11.943.356	40,00% 11.652.640														
Viaductos de Acceso - Lado Paraguay	75.203.702.757	12,16%				0,21% 159.346.030	0,38% 435.462.787	9,24% 6.942.909.185	12,03% 9.706.413.777	14,07% 10.880.818.808	13,46% 10.134.885.433	9,01% 6.231.130.343	7,31% 5.215.383.581	7,31% 5.795.337.533	2,44% 1.845.721.714	2,83% 2.141.483.304	3,41% 2.581.446.384	3,04% 2.068.083.855	3,70% 4.383.365.960	3,13% 3.998.466.318
Trabajos Preliminares	604.809.427	0,10%				28,00% 169.346.039	72,00% 435.462.787													
Subestructura	46.851.383.019	7,60%						14,83% 6.947.898.183	20,91% 9.796.413.797	23,22% 10.880.818.808	21,61% 10.124.885.433	9,01% 4.221.130.343	3,70% 1.735.337.533	3,70% 1.735.337.533	3,01% 1.409.961.746					
Pilotaje	25.197.772.522	4,08%						25,00% 6.299.443.131	26,00% 6.551.420.856	26,00% 6.551.420.856	23,00% 5.795.487.680									
Cabezales / Estribos	10.807.750.915	1,75%						6,00% 648.465.055	23,00% 2.485.782.710	24,00% 2.593.860.220	24,00% 2.593.860.220	23,00% 2.485.782.710								
Pilas	10.845.859.582	1,76%							7,00% 759.310.171	16,00% 1.735.337.533	16,00% 1.735.337.533	16,00% 1.735.337.533	16,00% 1.735.337.533	16,00% 1.735.337.533	13,00% 1.409.961.746					
Superestructura	16.562.749.897	2,69%													2,00% 331.254.998	9,00% 1.490.647.491	11,00% 1.821.902.489	12,00% 1.987.529.988	18,00% 2.981.294.981	19,00% 3.146.922.480
Varios	10.850.598.222	1,76%													1,00% 108.505.982	6,00% 651.035.893	7,00% 759.541.876	9,00% 976.553.840	12,00% 1.302.071.787	7,00% 759.541.876
Otros	333.662.693	0,05%																		
Viaductos de Acceso - Lado Brasil	75.203.203.257	12,19%					0,10% 73.577.131	0,48% 362.885.656	4,39% 3.097.034.799	11,79% 8.921.650.721	13,39% 10.130.387.287	14,47% 10.880.818.808	8,48% 6.303.863.701	3,74% 2.815.731.330	2,31% 1.735.337.533	2,14% 1.630.379.537	0,72% 542.202.979		0,58% 439.702.802	3,21% 2.413.816.683
Trabajos Preliminares	604.809.427	0,10%					12,00% 73.577.131	60,00% 362.885.656	28,00% 169.346.039											
Subestructura	46.851.383.019	7,60%							7,53% 3.527.668.153	18,83% 8.821.810.721	22,45% 10.130.387.287	23,22% 10.880.818.808	13,62% 6.303.863.701	6,01% 2.815.731.330	3,70% 1.735.337.533	3,47% 1.626.878.537	1,16% 542.202.979			
Pilotaje	25.197.772.522	4,08%							14,00% 3.527.668.153	26,00% 6.551.420.856	25,00% 6.299.443.131	26,00% 6.551.420.856	9,00% 2.267.799.527							
Cabezales / Estribos	10.807.750.915	1,75%								19,00% 2.053.472.674	24,00% 2.593.860.220	24,00% 2.593.860.220	22,00% 2.377.705.301	11,00% 1.188.852.651						
Pilas	10.845.859.582	1,76%								2,00% 216.917.192	15,00% 1.626.878.937	16,00% 1.735.337.533	16,00% 1.735.337.533	15,00% 1.626.878.937	16,00% 1.735.337.533	15,00% 1.626.878.937	5,00% 542.202.979			
Superestructura	16.562.749.897	2,69%																	2,00% 331.254.998	10,00% 1.656.274.990
Varios	10.850.598.222	1,76%																	1,00% 108.505.982	7,00% 759.541.876
Otros	333.662.693	0,05%																		
Puente Atirantado - Lado Paraguay	95.404.273.211	15,47%									0,84% 511.861.861	14,09% 13.443.865.344	20,95% 19.984.386.325	17,34% 16.550.316.274	13,28% 12.666.817.817	13,36% 12.748.317.317	12,48% 11.902.565.964	7,89% 9.426.136.138		
Pilas de Retenda	21.012.991.933	3,41%									2,02% 612.856.861	40,37% 9.722.382.480	38,46% 8.081.679.331	12,36% 2.596.173.271						
Pilotaje	7.660.710.759	1,24%									8,00% 612.855.861	92,00% 7.047.853.898								
Cabezales	4.977.528.686	0,81%										47,00% 2.339.438.482	53,00% 2.638.090.204							
Pilas	8.374.752.488	1,36%										4,00% 334.990.100	65,00% 5.443.589.117	31,00% 2.596.173.271						
Torres de Atirantamiento	74.391.281.278	12,06%										5,00% 3.718.164.064	16,00% 11.902.805.004	19,00% 14.134.343.443	17,00% 12.646.517.817	17,00% 12.646.517.817	16,00% 11.902.805.004	10,00% 7.439.128.128		

- 225 -Doscientos veinticinco

PUENTE BIOCEÁNICA

Consórcio PYBRA

CALENDARIO FÍSICO - FINANCIERO

TECNOEBL S.A. | Paulitec | CIDADE

CONSÓRCIO BINACIONAL PYBRA

Nombre de la Tarea	Costo Total en Gs IVA Incluido	%	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Puente Atirantado - Lado Brasil	96.494.273.211												8,22% 7.883.871.856	21,30% 20.517.756.015	19,07% 18.164.455.759	13,26% 12.646.517.817	11,26% 12.646.517.817	13,26% 12.646.517.817	11,70% 11.156.095.193	
Pilas de Retenda	21.012.991.833	3,41%											37,33% 7.883.871.856	47,13% 9.902.966.836	15,54% 3.266.153.479					
Pilotaje	*7.660.710.759*	*1,24%*											79,00% 6.051.193.499	21,00% 1.608.749.259						
Cabezales	*4.977.528.686*	*0,81%*											36,00% 1.791.910.327	64,00% 3.185.618.359						
Pilas	*8.374.752.488*	*1,36%*												61,00% 5.108.539.018	39,00% 3.266.153.470					
Torres de Atirantamiento	74.391.281.278	12,06%												14,00% 10.414.779.379	20,00% 14.878.356.256	17,00% 12.646.517.817	17,00% 12.646.517.817	17,00% 12.646.517.817	15,00% 11.158.692.193	
Puente Atirantado - Superestructuras	177.445.913.263	28,77%															0,50% 887.229.566	2,50% 4.436.147.832	8,21% 14.569.835.197	5,04% 10.648.178.278
Izado y Nivelación del Carros de Avance - Lado Paraguay	9.858.106.292	1,60%															9,00% 887.229.566	45,00% 4.436.147.832	46,00% 4.534.728.894	
Izado y Nivelación del Carros de Avance - Lado Brasil	9.858.106.292	1,60%																	100,00% 9.858.106.292	
D1	9.858.106.292	1,60%																		100,00% 9.858.106.292
D2	9.858.106.292	1,60%																		7,00% 690.067.440
D3	9.858.106.292	1,60%																		
D4	9.858.106.292	1,60%																		
D5	9.858.106.292	1,60%																		
D6	9.858.106.292	1,60%																		
D7	9.858.106.292	1,60%																		
D8	9.858.106.292	1,60%																		
D9	9.858.106.292	1,60%																		
D10	9.858.106.292	1,60%																		
D11	9.858.106.292	1,60%																		
D12	9.858.106.292	1,60%																		
D13	9.858.106.292	1,60%																		
D14	9.858.106.292	1,60%																		
D15	9.858.106.292	1,60%																		
D16	9.858.106.292	1,60%																		
Puente Atirantado - Varios	35.491.434.258	5,75%																		5,00% 1.774.572.713
Finalización de Obras																				
Ejecutado (Gs)	Gs 616.836.755.744	100,00%	4,4%	2,4%	0,9%	0,9%	0,9%	1,2%	2,2%	3,2%	3,6%	4,6%	5,8%	6,7%	5,6%	4,7%	4,6%	4,5%	4,9%	3,0%
			27.176.649.513	14.804.502.235	5.518.319.448	5.507.974.772	5.604.415.413	7.310.793.843	13.493.446.520	19.702.432.330	21.217.724.591	28.543.585.396	35.944.335.946	41.379.331.800	34.575.987.802	29.015.507.956	28.500.069.751	27.485.877.304	30.274.695.227	18.644.534.457
Ejecutado Acumulado (Gs)			4,4%	6,8%	7,6%	8,5%	9,5%	10,7%	12,9%	16,0%	19,5%	24,1%	29,9%	36,7%	42,3%	47,0%	51,6%	56,1%	61,0%	64,0%
			27.176.649.513	41.784.451.748	47.302.771.196	52.810.745.968	58.414.561.379	65.725.355.220	79.218.801.740	98.921.234.070	120.138.957.660	148.682.543.056	184.626.879.001	226.006.210.801	260.581.198.603	289.596.706.559	318.096.776.310	345.582.653.614	375.857.348.841	394.501.883.298
Ejecutado (USD)	Gs 90.243.217	100,00%	4,4%	2,4%	0,9%	0,9%	0,9%	1,2%	2,2%	3,2%	3,4%	4,6%	5,8%	6,7%	5,6%	4,7%	4,6%	4,5%	4,9%	3,0%
			3.976.427	2.166.839	780.896	805.728	853.575	1.069.568	1.974.020	2.882.405	3.110.005	4.175.827	5.258.656	6.085.882	5.029.207	4.253.712	4.178.541	4.031.384	4.420.182	2.727.605
Ejecutado Acumulado (USD)			4,4%	6,8%	7,6%	8,5%	9,5%	10,7%	12,9%	16,0%	19,5%	24,1%	29,9%	36,7%	42,3%	47,0%	51,6%	56,1%	61,0%	64,0%
			3.976.427	6.113.065	6.894.061	7.698.790	8.553.365	9.622.934	11.597.056	14.479.461	17.589.467	21.765.293	27.024.079	33.110.061	38.139.268	42.390.980	46.569.522	50.600.906	55.019.088	57.747.693

Conversion

Guarani	1,00
Dolares	0,0001463
Data	16/07/21

- 226 -Doscientos veintiséis-

PUENTE BIOCEÂNICA
Consórcio PYBRA

CALENDARIO FÍSICO - FINANCIERO

TECNOEDIL S.A. | Paulitec | CIDADE
CONSÓRCIO BINACIONAL PYBRA

Nombre de la Tarea	Costo Total en Gs IVA Incluido	%	MESES 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Orden de Inicio [O.I.]																				
Obras Generales	10.391.231.178	6,39%																		
Instalaciones Y Servicios Especializados	10.272.306.240	1,67%																		
Implementación Del Plan De Gestión Ambiental	10.870.000.000	1,76%																		
Indemnizaciones	650.000.000	0,11%																		
Movilizacion	17.553.969.567	2,85%																		
Servicios Ambientales	44.955.371	0,01%																		
Accesos Viales - 3+780 a 4+388	23.303.184.111	3,78%														2,26% 333.673.264	8,05% 1.479.994.651	8,64% 2.013.818.763	2,11% 658.618.815	
Movimiento de Suelos	18.366.812.043	2,98%																		
Paquete Estructural	3.510.862.838	0,57%														14,00% 491.520.797	43,00% 1.509.671.020	43,00% 1.509.671.020		
Obras de Arte	343.384.464	0,06%														10,00% 34.338.446	30,00% 103.015.339	30,00% 103.015.339	30,00% 103.015.339	
Obras Complementares	1.052.993.166	0,17%															25,00% 263.248.292	38,00% 400.137.403	37,00% 389.607.471	
Instalaciones y Servicios Especiales	29.131.600	0,00%																		
Viaductos de Acceso - Lado Paraguay	75.202.702.257	12,18%	5,19% 3.909.604.308	3,71% 2.415.818.805	1,01% 759.541.876											0,58% 434.023.929	1,88% 1.410.577.760	1,88% 1.410.577.760	1,01% 759.541.876	0,44% 331.662.693
Trabajos Preliminares	604.809.427	0,10%																		
Substructura	46.851.383.019	7,60%																		
Pilotaje	*25.197.772.522*	*4,08%*																		
Cabezales / Estribos	*10.807.750.915*	*1,75%*																		
Pilas	*10.845.859.582*	*1,76%*																		
Superestructura	16.562.749.897	2,69%	19,00% 3.146.922.480	10,00% 1.656.274.990																
Varios	10.850.598.222	1,76%	7,00% 759.541.876	7,00% 759.541.876	7,00% 759.541.876											4,00% 434.023.929	13,00% 1.410.577.769	13,00% 1.410.577.769	7,00% 759.541.876	
Otros	333.662.693	0,05%																		100,00% 333.662.693
Viaductos de Acceso - Lado Brasil	75.202.102.257	12,19%	3,43% 2.181.494.364	4,03% 2.441.370.348	5,33% 4.009.231.257	5,70% 4.369.102.819	4,97% 3.740.816.817	2,59% 2.350.188.366	1,01% 759.541.876							0,58% 434.023.929	1,88% 1.410.577.760	1,88% 1.410.577.760	0,87% 655.206.893	0,44% 333.662.693
Trabajos Preliminares	604.809.427	0,10%																		
Substructura	46.851.383.019	7,60%																		
Pilotaje	*25.197.772.522*	*4,08%*																		
Cabezales / Estribos	*10.807.750.915*	*1,75%*																		
Pilas	*10.845.859.582*	*1,76%*																		
Superestructura	16.562.749.897	2,69%	11,00% 1.821.502.489	13,00% 2.153.157.487	17,00% 2.815.667.482	20,00% 3.312.549.979	18,00% 2.981.234.981	9,00% 1.490.647.491												
Varios	10.850.598.222	1,76%	7,00% 759.541.876	8,00% 868.047.858	11,00% 1.193.505.804	9,00% 976.553.840	7,00% 759.541.876	7,00% 759.541.876	7,00% 759.541.876							4,00% 434.023.929	13,00% 1.410.577.769	13,00% 1.410.577.769	6,00% 651.206.893	
Otros	333.662.693	0,05%																		100,00% 333.662.693
Puente Atirantado - Lado Paraguay	95.494.273.211	15,47%																		
Pilas de Retenda	21.012.991.933	3,41%																		
Pilotaje	*7.660.710.759*	*1,24%*																		
Cabezales	*4.977.528.686*	*0,81%*																		
Pilas	*8.374.752.488*	*1,36%*																		
Torres de Atirantamiento	74.391.281.278	12,06%																		

- 227 -Doscientos veintisiete

PUENTE BIOCEÁNICA
Consórcio PYBRA

CALENDARIO FÍSICO - FINANCIERO

TECNOEDIL S.A. | Paulitec | MAIS QUALIDADE CIDADE
CONSÓRCIO BINACIONAL PYBRA

Nombre de la Tarea	Costo Total en Gs IVA Incluido	%	MESES 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Puente Atirantado - Lado Brasil	95.404.273.311																			
Pilas de Retenda	21.013.391.933	3,41%																		
Pilotaje	*7.660.710.759*	*1,24%*																		
Cabezales	*4.977.520.686*	*0,81%*																		
Pilas	*8.374.752.488*	*1,36%*																		
Torres de Atirantamiento	74.391.281.278	12,06%																		
Puente Atirantado - Superestructura	177.445.813.263	28,77%	6,17% 10.995.897.893	6,17% 10.867.097.086	5,96% 10.568.973.733	6,11% 10.843.965.973	6,00% 10.646.704.790	6,11% 10.845.158.119	6,17% 10.947.097.896	6,76% 10.257.458.644	6,11% 10.843.965.973	5,94% 10.545.571.797	6,17% 10.945.609.581	5,94% 10.548.173.719	6,17% 10.947.097.896	4,17% 7.397.579.719				
Izado y Nivelación del Carro de Avance - Lado Paraguay	9.858.106.292	1,60%																		
Izado y Nivelación del Carro de Avance - Lado Brazil	9.858.106.292	1,60%																		
D1	9.858.106.292	1,60%																		
D2	9.858.106.292	1,60%	93,00% 9.166.038.853																	
D3	9.858.106.292	1,60%	18,00% 1.774.419.133	82,00% 8.083.687.160																
D4	9.858.106.292	1,60%		29,00% 3.858.850.825	71,00% 5.999.255.468															
D5	9.858.106.292	1,60%			36,00% 3.548.318.265	64,00% 6.309.788.027														
D6	9.858.106.292	1,60%				46,00% 4.534.728.894	54,00% 5.323.377.398													
D7	9.858.106.292	1,60%					54,00% 5.323.377.398	46,00% 4.534.728.894												
D8	9.858.106.292	1,60%						64,00% 6.309.788.027	36,00% 3.548.318.265											
D9	9.858.106.292	1,60%							75,00% 7.393.579.719	25,00% 2.464.526.573										
D10	9.858.106.292	1,60%								79,00% 7.787.803.871	21,00% 2.070.302.421									
D11	9.858.106.292	1,60%									89,00% 8.772.704.030	11,00% 1.084.931.093								
D12	9.858.106.292	1,60%										96,00% 9.463.782.045	4,00% 394.324.247							
D13	9.858.106.292	1,60%											100,00% 9.858.106.292							
D14	9.858.106.292	1,60%											7,00% 690.067.440	93,00% 9.168.038.853						
D15	9.858.106.292	1,60%												14,00% 1.380.334.881	86,00% 8.477.771.411					
D16	9.858.106.292	1,60%													25,00% 2.464.526.573	75,00% 7.393.579.719				
Puente Atirantado - Varios	35.481.674.258	5,75%	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713	5,00% 1.774.053.713
																				100%
Finalización de Obras																				0,2%
Ejecutado (Gs)	Gs 616.836.715.744	100,00%	3,1% 19.204.480.418	2,9% 18.153.593.307	2,8% 17.293.252.868	2,7% 16.917.314.404	2,6% 16.181.165.596	2,4% 14.658.180.083	2,3% 14.176.153.173	1,9% 12.038.594.257	2,0% 12.537.940.035	2,0% 12.312.347.448	2,1% 12.715.573.857	2,0% 12.332.242.441	2,1% 12.716.571.887	1,8% 10.916.375.278	1,2% 7.105.488.123	1,2% 7.472.437.141	0,7% 4.388.203.278	0,2% 1.032.140.138
Ejecutado Acumulado (Gs)			67,1% 413.923.428.106	70,0% 432.077.021.413	72,8% 449.370.274.281	75,6% 466.295.330.075	78,2% 482.230.504.442	80,6% 497.324.684.645	82,8% 511.500.837.818	84,7% 523.497.432.075	86,9% 536.035.372.106	88,8% 547.347.719.553	90,8% 560.063.293.410	92,8% 572.395.535.851	94,9% 585.111.107.738	96,7% 596.027.483.016	97,9% 603.132.971.139	99,1% 610.605.408.262	99,8% 615.013.611.540	100,0% 616.046.751.678
Ejecutado (USD)	Gs 90.242.217	100,00%	3,1% 2.809.615	2,9% 2.655.871	2,8% 2.500.417	2,7% 2.472.008	2,6% 2.364.452	2,4% 2.171.219	2,2% 2.073.555	1,9% 1.759.478	2,0% 1.846.012	2,0% 1.822.745	2,1% 1.860.434	2,0% 1.802.745	2,1% 1.860.434	1,8% 1.597.016	1,2% 1.102.410	1,2% 1.122.486	0,7% 641.804	0,2% 149.539
Ejecutado Acumulado (USD)			67,1% 60.556.898	70,0% 63.212.769	72,8% 65.713.186	75,6% 68.185.193	78,2% 70.549.644	80,6% 72.720.863	82,8% 74.794.418	84,7% 76.553.896	86,8% 78.399.908	88,8% 80.222.653	90,8% 81.083.087	92,8% 82.885.832	94,9% 84.745.266	96,7% 86.342.282	97,9% 87.444.692	99,1% 88.567.178	99,8% 89.208.982	100,0% 90.242.217

Conversion

Guarani	1,00
Dolares	0,0001463
Data	16/07/21

- 228 - Doscientos veintiocho -
