MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 02 DE SEPTIEMBRE 2024- 26 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE PRESENTACION	26/9/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	24
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"	346.194.732	0,00%	44,98%	44,98%	-	155.705.640	155.705.640
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	173.097				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	17.309.737	0,00%	44,98%	44,98%	-	7.785.282	7.785.282
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**17.309.737**	0,00%	44,98%	44,98%	-	**7.785.282**	**7.785.282**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**147.920.358**	**147.920.358**

SON GUARANÍES:CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONESNOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

-REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 02 DE SEPTIEMBRE 2024- 26 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE PRESENTACION	26/9/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	24
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador)	Metros cuadrados	9	248.400	2.235.600		9,00	9,00		2.235.600	2.235.600		100,00%	100,00%
2	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	420	4.100	1.722.000		420,00	420,00		1.722.000	1.722.000		100,00%	100,00%
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	170	82.800	14.076.000		20,00	20,00		1.656.000	1.656.000		11,76%	11,76%
3.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	420	8.240	3.460.800		420,00	420,00		3.460.800	3.460.800		100,00%	100,00%
3.2	Cartel con impresion	Unidad	1	2.898.000	2.898.000									
4	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	160	58.600	9.376.000		80,00	80,00		4.688.000	4.688.000		50,00%	50,00%
5	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	165	131.100	21.631.500		165,00	165,00		21.631.500	21.631.500		100,00%	100,00%
6	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	270	34.500	9.315.000		190,00	190,00		6.555.000	6.555.000		70,37%	70,37%
6.1	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	106	52.400	5.554.400									
6.2	Colocación de pisos - Contrapisos - De H° de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	420	48.300	20.286.000		200,00	200,00		9.660.000	9.660.000		47,62%	47,62%
6.3	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	420	117.300	49.266.000									
6.4	Construccion de rampa peatonal	Unidad	2	621.000	1.242.000									
7	Limpieza de obra	Metros cuadrados	420	8.270	3.473.400									
8	Preparación de obra (Parque Los Cocos - Obrador)	Metros cuadrados	9	248.400	2.235.600		9,00	9,00		2.235.600	2.235.600		100,00%	100,00%
9	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	626	4.140	2.591.640		626,00	626,00		2.591.640	2.591.640		100,00%	100,00%
9.1	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	250	82.000	20.500.000		100,00	100,00		8.200.000	8.200.000		40,00%	40,00%
9.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	626	8.250	5.164.500		626,00	626,00		5.164.500	5.164.500		100,00%	100,00%

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

CERTIFICADO 1 CONSTRRUCCION DE CAMINERO

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 02 DE SEPTIEMBRE 2024- 26 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE PRESENTACION	26/9/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	24
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
10	Cartel con impresion	Unidad	1	2.897.000	2.897.000									
10.1	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	296	58.627	17.353.592									
10.2	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	166	131.100	21.762.600		100,00	100,00		13.110.000	13.110.000		60,24%	60,24%
10.3	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	278	34.500	9.591.000		190,00	190,00		6.555.000	6.555.000		68,35%	68,35%
11	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	110	52.400	5.764.000									
12	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626	48.300	30.235.800		400,00	400,00		19.320.000	19.320.000		63,90%	63,90%
12.1	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626	117.300	73.429.800		400,00	400,00		46.920.000	46.920.000		63,90%	63,90%
12.2	Construccion de rampa peatonal	Unidad	8	621.000	4.968.000									
12.3	Limpieza de obra	Metros cuadrados	626	8.250	5.164.500									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**346.194.732**					**155.705.640**	**155.705.640**		**44,98%**	**44,98%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**346.194.732**
TIEMPO DE EJECUCIÓN	**30 dias**

ITEM	DESCRIPCIÓN	oct-24				nov-24				dic-24				ene-25				Monto	%
	0	30 dias				60 dias				90 dias				120dias					
1	Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador)																	2.235.600	0,65
2	Preparación de Terreno																	1.722.000	0,50
3	Relleno y compactacion de terreno																	14.076.000	4,07
3.1	Replanteo y marcación																	3.460.800	1,00
3.2	Cartel con impresion																	2.898.000	0,84
4	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón																	9.376.000	2,71
5	Mampostería - Nivelación de 0,15																	21.631.500	6,25
6	Mampostería - Envarillado																	9.315.000	2,69
6.1	Revoques - de Mocheta																	5.554.400	1,60
6.2	Colocación de pisos - Contrapisos - De H° de cascotes 10 cms																	20.286.000	5,86
6.3	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms																	49.266.000	14,23
6.4	Construccion de rampa peatonal																	1.242.000	0,36
7	Limpieza de obra																	3.473.400	1,00
8	Preparación de obra (Parque Los Cocos - Obrador)																	2.235.600	0,65
9	Preparación de Terreno																	2.591.640	0,75
9.1	Relleno y compactacion de terreno																	20.500.000	5,92
9.2	Replanteo y marcación																	5.164.500	1,49
10	Cartel con impresion																	2.897.000	0,84
10.1	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón																	17.353.592	5,01
10.2	Mampostería - Nivelación de 0,15																	21.762.600	6,29
10.3	Mampostería - Envarillado																	9.591.000	2,77
11	Revoques - de Mocheta																	5.764.000	1,66
12	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms																	30.235.800	8,73
12.1	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms																	73.429.800	21,21
12.2	Construccion de rampa peatonal																	4.968.000	1,44
12.3	Limpieza de obra																	5.164.500	1,49
	TOTAL																	##########	#####

Contractual				
Monto Bruto Mensual Contractual	121.168.156	121.168.156	103.858.420	0
Porcentaje Avance Mensual Contractual	35,00%	35,00%	30,00%	30,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	35,00%	70,00%	100,00%	130,00%

Certificado				
Monto Bruto Mensual Certificado	155.705.640			
Porcentaje Avance Mensual Certificado	44,98%			
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	44,98%			

	Mes1	Mes2	Mes 3	Mes 4
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	44,98%			

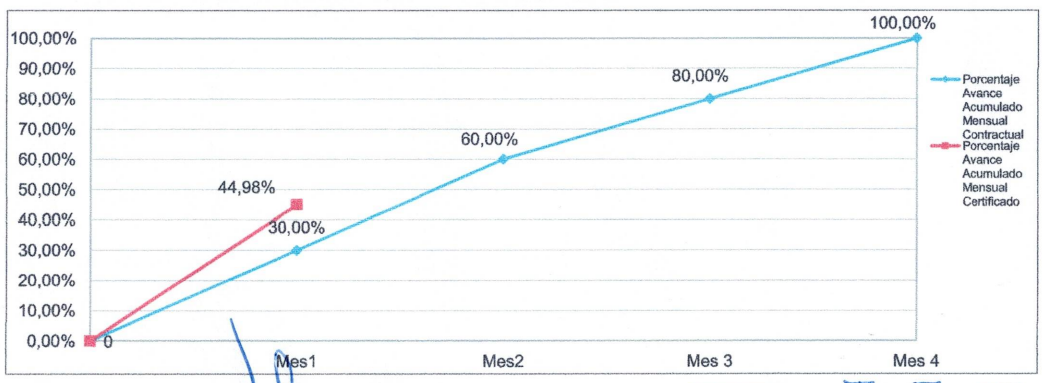

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 02 DE SEPTIEMBRE 2024- 26 DE SEPTIEMBRE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 26 días del mes de septiembre del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GRUPO RIO PARANA", REPRESENTADA POR el SR. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador)**	Metros cuadrados	9		9,00	9,00
2	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	420		420,00	420,00
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	170		20,00	20,00
3.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	420		420,00	420,00
3.2	Cartel con impresion	Unidad	1			0,00
4	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	160		80,00	80,00
5	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	165		165,00	165,00
6	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	270		190,00	190,00
6.1	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	106			0,00
6.2	Colocación de pisos - Contrapisos - De H° de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	420		200,00	200,00
6.3	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	420			0,00
6.4	Construccion de rampa peatonal	Unidad	2			0,00
7	Limpieza de obra	Metros cuadrados	420			0,00
8	Preparación de obra (Parque Los Cocos - Obrador)	Metros cuadrados	9		9,00	9,00
9	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	626		626,00	626,00
9.1	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	250		100,00	100,00
9.2	**Replanteo y marcación**	Metros cuadrados	626		626,00	626,00
10	Cartel con impresion	Unidad	1			0,00
10.1	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	296			0,00
10.2	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	166		100,00	100,00
10.3	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	278		190,00	190,00
11	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	110			0,00
12	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626		400,00	400,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 02 DE SEPTIEMBRE 2024- 26 DE SEPTIEMBRE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 26 días del mes de septiembre del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GRUPO RIO PARANA", REPRESENTADA POR el SR. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
12.1	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626		400,00	400,00
12.2	Construccion de rampa peatonal	Unidad	8			0,00
12.3	Limpieza de obra	Metros cuadrados	626			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
