GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 03

Mes: abril

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL con ID: 436870

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870**	100,00%	166.703.410	41,96%	69.952.754	15,59%	25.990.013	57,55%	95.942.766
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**166.703.410**	**41,96%**	**69.952.754**	15,59%	**25.990.013**	**57,55%**	**95.942.766**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	33.340.682	13.990.551	5.198.003	19.188.553
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**33.340.682**	13.990.551	**5.198.003**	**19.188.553**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				20.792.010	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**20.792.010**	

Certificado Básico Nº	**03**
Mes: abril	
Contrato N°:	35/23
Monto Básico:	₲ 166.703.410
Contratista:	Impacto Constructora - Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 días
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Prórroga:	60 días
Fecha de terminación con prórroga:	16-may-24

SON GUARANIES: veinte millones setecientos noventa y dos mil diez-.

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Ing. Claudio Gaona Valenzuela
Fiscal de Obra
Gobernacion de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

0985171856
impactoconstructora@gmail.com

IMPACTO CONSTRUCTORA

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 03

CONTRATO Nº 35/2023

REFERENCIA: Contratación Directa N° 19/23 contrato N° 35/23

Descripción del llamado: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL"

ID: 436.870
CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos

En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 3 días del mes de mayo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Claudio Gaona Valenzuela, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y la Lic. Noelia Ledesma Ocampos, Representante legal de la Empresa Impacto Constructora, para la;

- "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL"

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes abril del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

Representante Legal

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 03
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL con ID: 436870

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 166.703.410	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	35/23	**PRÓRROGA:**	60 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:**	16-may-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 03						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 03					
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.565	31.550	80.925.750	0,485	20	30	50	0,097	0,146	0,243	513	769,5	1282,5	16.185.150	24.277.725	40.462.875
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	770	74.125	57.076.250	0,342	93	3	96	0,318	0,010	0,329	716,1	23,1	739,2	53.080.913	1.712.288	54.793.200
3	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	1.563.087	23.633.875	0,142	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	0,36	719.135	258.889	0,002	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
5	Señalización de obra	Unidad Medida Global	3	228.897	686.691	0,004	100	0	100	0,004	0,000	0,004	3	0	3	686.691	-	686.691
6	Umpleza de obra	Metros cuadrados	2.565	1.607	4.121.955	0,025	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
					166.703.410	**100%**				**42,0%**	**15,59%**	**57,55%**				**69.952.754**	**25.990.013**	**95.942.766**

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005114-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Geona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° **03**

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Mes: abril

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 166.703.410	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	35/23	**PRÓRROGA:**	60 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:**	16-may-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.565	31.550	80.925.750	16.185.150	64.740.600		100%
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	770	74.125	57.076.250	28.538.125	28.538.125		100%
3	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	1.563.087	23.633.875	-	23.633.875		100%
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	0,36	719.135	258.889			258.889	100%
5	Señalización de obra	Unidad Medida Global	3	228.897	686.691	686.691			100%
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.565	1.607	4.121.955			4.121.955	100%
					166.703.410				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	45.409.966	116.912.600	4.380.844	166.703.410
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	27,24%	70,13%	2,63%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Claudio Ozuna Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 03

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

Mes: abril

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 35/23 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL con ID: 436870

Contrato N°:	35/23		
Monto del Contrato:	₲ 166.703.410	**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	60 días
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	16-may-24

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 35/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	45.409.966	45.409.966	45.409.966	45.409.966	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%
febrero	116.912.600	162.322.566	24.542.788	69.952.754	70,13%	97,37%	14,72%	41,96%
marzo	4.380.844	166.703.410	-		2,63%	100,00%	0,00%	41,96%
abril			25.990.013				15,59%	57,55%
mayo								

CURVA DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

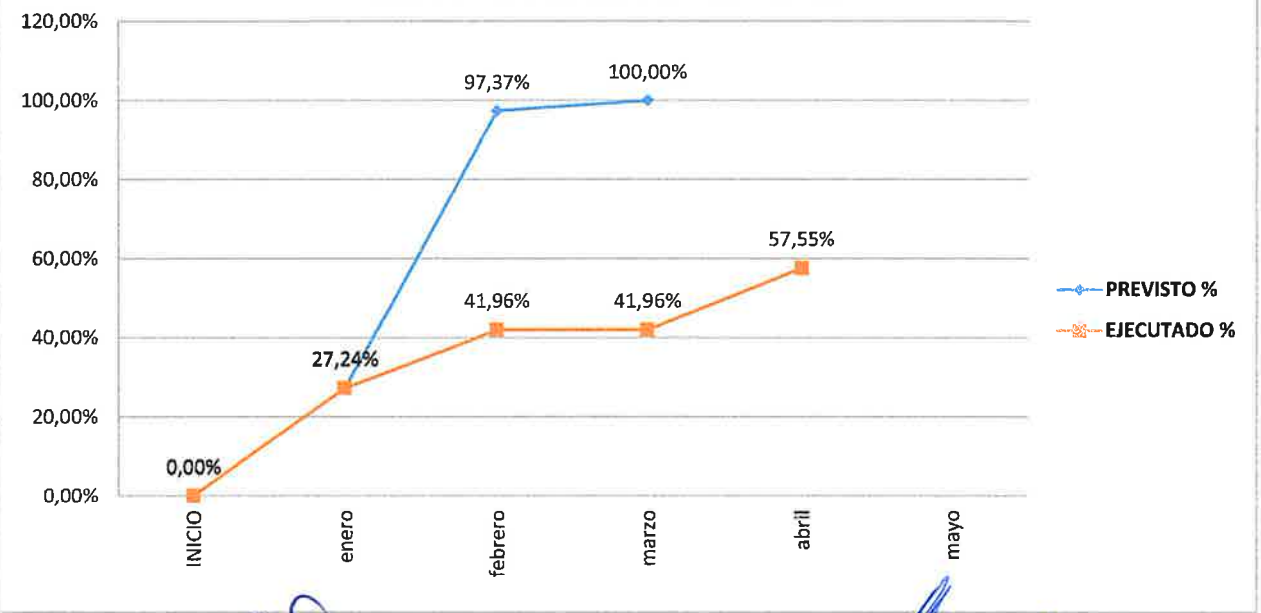

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 5822

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 07 – Informe certificado mes de marzo

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 35/2023 - I. D. N° 436.870
OBRA: Construcción de Empedrado
BENEFICIARIO: Barrio Santo Domingo – Encarnación
FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona
FECHA DE VISITA: 14/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 57,55%
FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Camino Vecinal en el Barrio Santo Domingo	Encarnación	166.703.410Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Noelia Ledesma – IMPACTO CONSTRUCTORA	0985-171-856	35/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PRORROGA DE PLAZO	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
60 días	18/12/2023	16/05/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 14/05/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos:

- Construcción de cordón cuneta de hormigón elaborado.
- Construcción de pavimento tipo empedrado.

El avance hasta la fecha es de 57,55%, según su cronograma físico financiero correspondiente al mes de abril de 2024.

Los trabajos se realizan de forma continua cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

.....
Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3625

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
