GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

RESUMEN DE PAGO

Correspondiente al Mes: Enero	Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID Nº 412692 - CONTRATO Nº LPN 09-2022

Ítem	Conceptos	Importes Autorizados		Importes certificados					
				Hasta certificado anterior		Presente Certificado		Total certificado a la fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%	34.040.000.000	0,00%	9.916.215.000	0,00%	2.644.550.000	0,00%	12.560.765.000
A.2	Precios Unitarios	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
A	Total Guaranies	0,00%	34.040.000.000	29,13%	9.916.215.000	7,77%	2.644.550.000	36,90%	12.560.765.000

Gobernacion de Ñeembucu

Contrato Nº LPN 09/2022

Monto Gs. 34.040.000.000.-

Contratista: CONSORCIO ITACORA

Fecha de Inicio: 17 - Noviembre - 22

Plazo de Ejecucion (dias): 540

Fecha de Terminación: 17 - Abril - 24

B	Deducciones a la fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.1	Devolución del Anticipo	20,00%	0	0	0	0
B.2	Para fondo de Reparo	5,00%	0	0	0	0
B.3	Otras deducciones		0	0	0	0
BII	Total deducciones		0	0	0	0

Gobernacion de Ñeembucu

Secretaria de Obras Publicas

Mesa de Entrada

C.1	IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	2.644.550.000
C.2	MULTAS	0
C	**IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)**	**2.644.550.000**

SON GUARANÍES: Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil guaranies .----------

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC Nº 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. Nº 1.025.553

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129925-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Enero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	5,30	0,00	5,3	7,0	43,1%	53.000.000	0	53.000.000	70.000.000	43,09%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	1,00	0,00	1,00	3,0	25,0%	22.513.000	0	22.513.000	67.539.000	25,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	21.070,00	1.500,00	22.570,00	34.129,00	39,8%	474.075.000	33.750.000	507.825.000	767.902.500	39,81%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	22.020,00	2.000,00	24.020,00	40.371,00	37,3%	495.450.000	45.000.000	540.450.000	908.347.500	37,30%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	46.190,00	6.000,00	52.190,00	69.692,00	42,8%	1.039.275.000	135.000.000	1.174.275.000	1.568.070.000	42,82%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	40.030,00	5.000,00	45.030,00	67.146,00	40,1%	1.120.840.000	140.000.000	1.260.840.000	1.880.088.000	40,14%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	116.814,00	18.000,00	134.814,00	267.686,00	33,5%	3.854.862.000	594.000.000	4.448.862.000	8.833.638.000	33,49%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	546.000.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	390.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	0,00	0,00	0,00	402,50	0,0%	0	0	0	523.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	1.100,00	400,00	1.500,00	3.500,00	30,0%	16.500.000	6.000.000	22.500.000	52.500.000	30,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	700,00	300,00	1.000,00	2.500,00	28,6%	7.700.000	3.300.000	11.000.000	27.500.000	28,57%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	0,00	0,00	0,00	116,00	0,0%	0	0	0	162.400.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	0,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	27,3%	0	13.500.000	13.500.000	36.000.000	27,27%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	4,00	1,00	5,00	7,00	41,7%	2.280.000.000	570.000.000	2.850.000.000	3.990.000.000	41,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	1,00	2,00	3,00	3,00	50,0%	552.000.000	1.104.000.000	1.656.000.000	1.656.000.000	50,00%
		TOTAL				34.040.000.000						9.916.215.000	2.644.550.000	12.560.765.000	21.479.235.000	36,90%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Viviana Muñoz Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA · RESUMEN POR TRAMO GENERAL: 57,5 km

Correspondiente al Mes: Enero	Año: 2023

	Tramos de Caminos a Enrripiar	Km	Costo Guaranies	Ejecutado Guaranies	Saldo Guaranies	Porcentaje de Avance
1	Villa Oliva	11	6.095.613.000,00	552.000.000	5.543.613.000	9,06%
2	Potrero Piru	20	13.894.682.500,00	11.456.765.000	2.437.917.500	82,45%
3	Calles de la Ciudad de Pilar	5	2.062.750.000,00	-	2.062.750.000	0,00%
4	Calles de la Ciudad de Alberdi	5	2.107.000.000,00	552.000.000	1.555.000.000	26,20%
5	Villalbin a Teniente Sanches	8	5.795.641.500,00	-	5.795.641.500	0,00%
6	Paso Pindo a Apipe	8,5	4.084.313.000,00	-	4.084.313.000	0,00%
	Total General	57,5	34.040.000.000,00	12.560.765.000	21.479.235.000	36,90%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
R.U.C. 80012999225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Correspondiente al Mes: Enero	Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	22.500	72.000.000	0,0	0,0	0,0	3.200,0	0,0%	0	0	0	72.000.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	22.500	18.000.000	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0%	0	0	0	18.000.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0%	0	0	0	1.155.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-										
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	750.000	180.000.000	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0%	0	0	0	180.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0%	0	552.000.000	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.107.000.000						0	552.000.000	552.000.000	1.555.000.000	26,20%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Enero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	5,3	0,0	5,3	0,0	100,0%	53.000.000	0	53.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	21.070,0	1.500,0	22.570,0	1.288,0	94,6%	474.075.000	33.750.000	507.825.000	28.980.000	94,60%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	22.020,0	2.000,0	24.020,0	1.141,0	95,5%	495.450.000	45.000.000	540.450.000	25.672.500	95,47%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	46.190,0	6.000,0	52.190,0	1.910,0	96,5%	1.039.275.000	135.000.000	1.174.275.000	42.975.000	96,47%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	40.030,0	5.000,0	45.030,0	1.434,0	96,9%	1.120.840.000	140.000.000	1.260.840.000	40.152.000	96,91%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	116.814,0	18.000,0	134.814,0	5.186,0	96,3%	3.854.862.000	594.000.000	4.448.862.000	171.138.000	96,30%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0%	0	0	0	218.400.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	30.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.100,0	400,0	1.500,0	0,0	100,0%	16.500.000	6.000.000	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	700,0	300,0	1.000,0	0,0	100,0%	7.700.000	3.300.000	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	100,0%	0	13.500.000	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	4,0	1,0	5,0	3,0	62,5%	2.280.000.000	570.000.000	2.850.000.000	1.710.000.000	62,50%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				13.894.682.500						9.916.215.000	1.540.550.000	11.456.765.000	2.437.917.500	82,45%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 11 km - Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Enero | Año: 2023

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	10.000.000	30.000.000	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0%	0	0	0	30.000.000	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	0,0	0,0	0,0	15.500,0	0,0%	0	0	0	348.750.000	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	0,0	0,0	0,0	15.500,0	0,0%	0	0	0	348.750.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.500	495.000.000	0,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0%	0	0	0	495.000.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	28.000	862.400.000	0,0	0,0	0,0	30.800,0	0,0%	0	0	0	862.400.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	33.000	2.541.000.000	0,0	0,0	0,0	77.000,0	0,0%	0	0	0	2.541.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	1.050.000	159.600.000	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0%	0	0	0	159.600.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml													
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	1.300.000	78.000.000	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0%	0	0	0	78.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	22.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	11.000.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	570.000.000	570.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	570.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0%	0	552.000.000	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				6.095.613.000						0	552.000.000	552.000.000	5.543.613.000	9,06%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Viviana Ivarez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

57,5km - TOTAL GENERAL

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	5,30	0,00	5,30	43,09%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	1,00	0,00	1,00	25,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	21.070,00	1.500,00	22.570,00	39,81%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.020,00	2.000,00	24.020,00	37,30%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	46.190,00	6.000,00	52.190,00	42,82%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	40.030,00	5.000,00	45.030,00	40,14%
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	116.814,00	18.000,00	134.814,00	33,49%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	1.100,00	400,00	1.500,00	30,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	700,00	300,00	1.000,00	28,57%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	27,27%
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	4,00	1,00	5,00	41,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	1,00	2,00	3,00	50,00%

Viviana Ximenez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml					
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml				-	
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	1,00	1	100,00%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

11 km - Villa Oliva

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml					
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	1,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

20 km Tramo Potrero Pirú

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero								Año: 2023
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	21.070,00	1.500,00	22.570,00	94,60%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.020,00	2.000,00	24.020,00	95,47%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	46.190,00	6.000,00	52.190,00	96,47%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	40.030,00	5.000,00	45.030,00	96,91%
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	116.814,00	18.000,00	134.814,00	96,30%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.100,00	400,00	1.500,00	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	4,00	1,00	5,00	62,50%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC Nº 2.915

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

César D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. Nº 1.025.553

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

AVANCE	
Mes:	Enero

CONTRATISTA : CONSORCIO ITACORA

PAVIMENTOS ENRRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - LPN 09 -2022 - ID N° 412.692

CURVA CONTRACTUAL Y AVANCE

	AVANCE FINANCIERO				AVANCE %				DESVÍO + -	
	PREVISTO Gs.		EJECUTADO Gs.		PREVISTO		EJECUTADO			
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%		
nov-22	3.000.000.000	3.000.000.000	3.203.121.500	3.203.121.500	8,81%	8,81%	9,41%	9,41%	0,60%	Ok
dic-22	6.916.215.421	9.916.215.421	6.713.093.500	9.916.215.000	20,32%	29,13%	19,72%	29,13%	0,00%	Ok
ene-23	5.023.784.579	14.940.000.000	2.644.550.000	12.560.765.000	14,76%	43,89%	7,77%	36,90%	-6,99%	atraso
feb-23	3.500.000.000	18.440.000.000	0	0	10,28%	54,17%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
mar-23	2.000.000.000	20.440.000.000	0	0	5,88%	60,05%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
abr-23	2.000.000.000	22.440.000.000	0	0	5,88%	65,92%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
may-23	1.500.000.000	23.940.000.000	0	0	4,41%	70,33%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
jun-23	1.500.000.000	25.440.000.000	0	0	4,41%	74,74%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
jul-23	1.500.000.000	26.940.000.000	0	0	4,41%	79,14%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
ago-23	1.000.000.000	27.940.000.000	0	0	2,94%	82,08%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
sept-23	1.000.000.000	28.940.000.000	0	0	2,94%	85,02%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
oct-23	1.000.000.000	29.940.000.000	0	0	2,94%	87,96%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
nov-23	1.000.000.000	30.940.000.000	0	0	2,94%	90,89%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
dic-23	1.000.000.000	31.940.000.000	0	0	2,94%	93,83%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
ene-24	1.000.000.000	32.940.000.000	0	0	2,94%	96,77%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
feb-24	500.000.000	33.440.000.000	0	0	1,47%	98,24%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
mar-24	500.000.000	33.940.000.000	0	0	1,47%	99,71%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
abr-24	100.000.000	34.040.000.000	0	0	0,29%	100,00%	0,00%	36,90%	0,00%	Ok
TOTALES	34.040.000.000				100,00%					

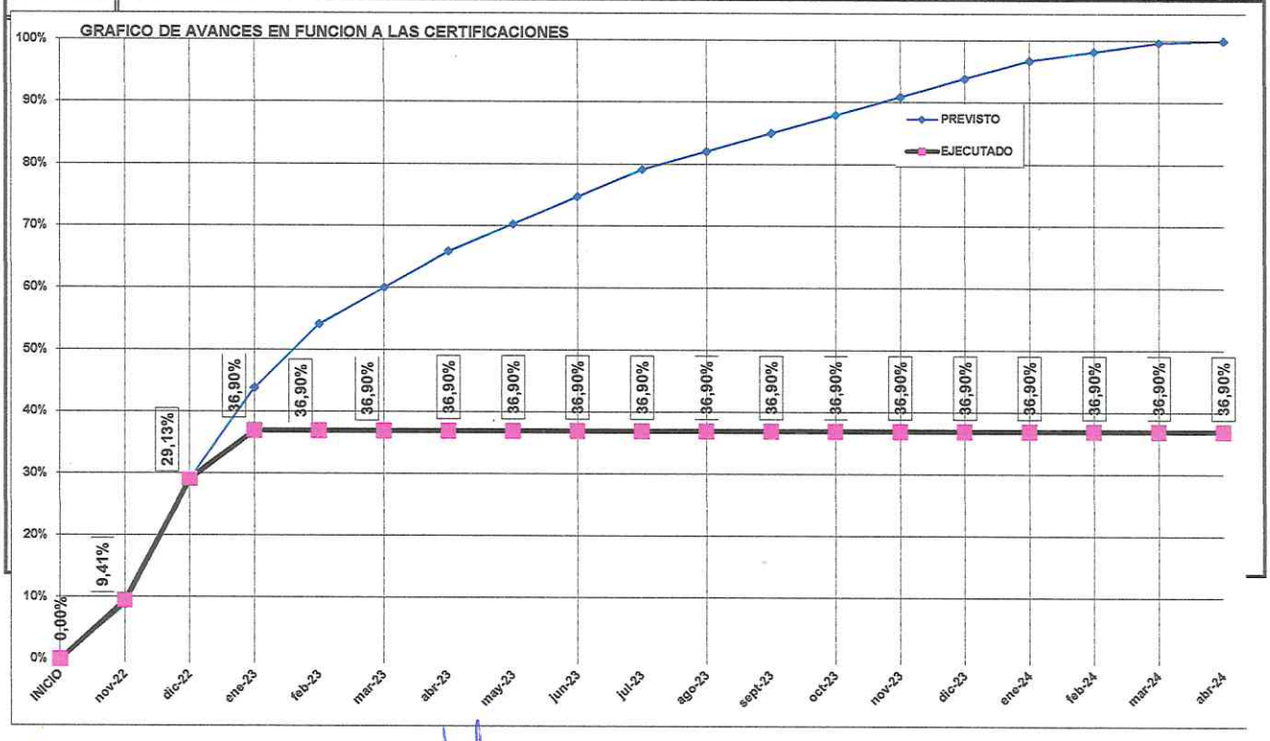

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80120922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.815

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
